


除染後放射線量マップ【富勢西小学校】

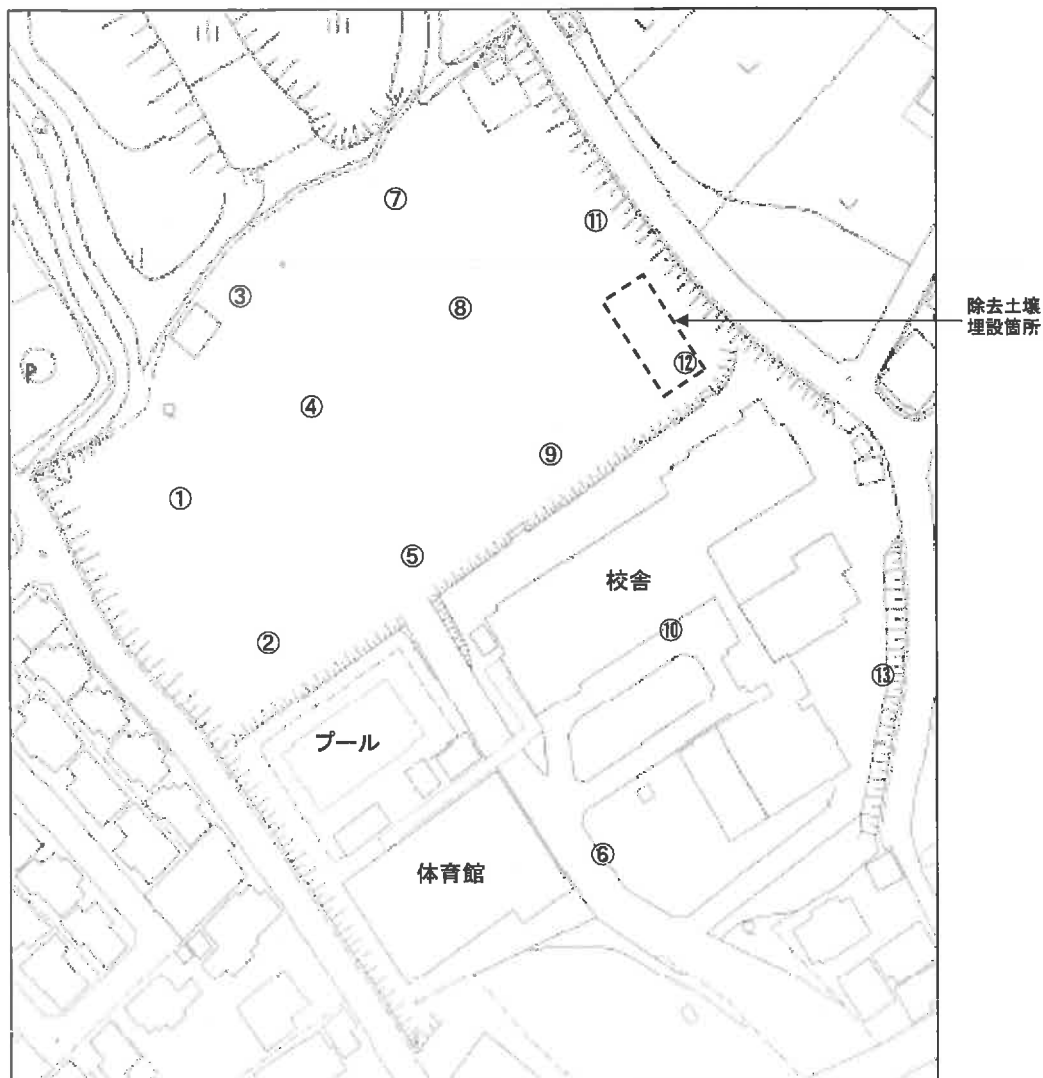

○除染前測定日:平成24年3月1日

○除染後測定日:平成24年4月12日, 4月20日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.153	0.086	0.167	0.096	0.137	0.107
②	グラウンド	土	0.223	0.100	0.239	0.101	0.254	0.090
③	グラウンド	土	0.281	0.142	0.313	0.128	0.326	0.140
④	グラウンド	土	0.216	0.082	0.271	0.094	0.244	0.102
⑤	グラウンド	土	0.269	0.153	0.247	0.181	0.338	0.154
⑥	通路端	土	0.304	0.189	0.321	0.182	0.367	0.150
⑦	グラウンド	土	0.222	0.115	0.264	0.139	0.259	0.162
⑧	グラウンド	土	0.171	0.078	0.197	0.073	0.226	0.073
⑨	グラウンド	土	0.249	0.130	0.304	0.116	0.350	0.095
⑩	校舎前	土	0.165	0.100	0.164	0.118	0.211	0.112
⑪	グラウンド	土	0.293	0.174	0.342	0.225	0.383	0.208
⑫	校舎前	アスファルト	0.182	0.118	0.204	0.114	0.195	0.083
⑬	校舎横	土	0.293	0.187	0.274	0.145	0.423	0.174
平均			0.232	0.127	0.254	0.132	0.286	0.127

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
