


除染後放射線量マップ【十余二小学校】

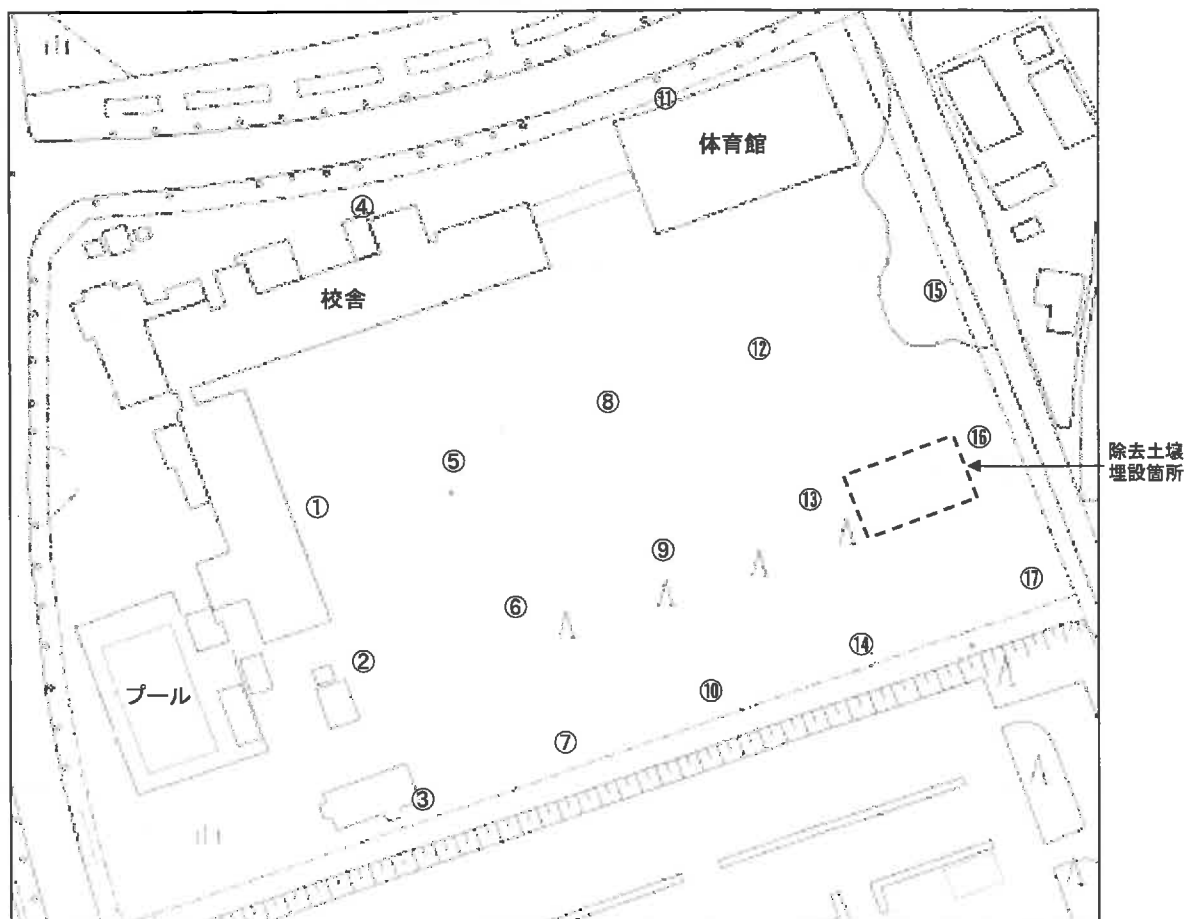

○除染前測定日:平成24年3月26日

○除染後測定日:平成24年4月26日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.149	0.073	0.149	0.071	0.170	0.067
②	グラウンド	土	0.164	0.109	0.184	0.167	0.175	0.096
③	グラウンド	土	0.209	0.123	0.239	0.129	0.285	0.155
④	校舎裏	アスファルト	0.151	0.132	0.173	0.138	0.162	0.136
⑤	グラウンド	土	0.258	0.101	0.249	0.100	0.245	0.100
⑥	グラウンド	土	0.276	0.106	0.332	0.090	0.328	0.097
⑦	グラウンド	土	0.213	0.110	0.232	0.110	0.275	0.096
⑧	グラウンド	土	0.278	0.113	0.284	0.108	0.332	0.128
⑨	グラウンド	土	0.265	0.099	0.275	0.108	0.248	0.100
⑩	グラウンド	土	0.244	0.119	0.302	0.119	0.319	0.110
⑪	体育館裏	土	0.188	0.125	0.188	0.116	0.234	0.094
⑫	グラウンド	土	0.294	0.103	0.285	0.104	0.310	0.101
⑬	グラウンド	土	0.309	0.081	0.390	0.076	0.487	0.089
⑭	グラウンド	土	0.262	0.114	0.280	0.115	0.246	0.117
⑮	グラウンド	土	0.213	0.141	0.209	0.144	0.192	0.125
⑯	グラウンド	土	0.244	0.145	0.239	0.124	0.255	0.128
⑰	グラウンド	土	0.244	0.157	0.291	0.149	0.258	0.143
平均			0.233	0.115	0.253	0.116	0.266	0.111

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
