


除染後放射線量マップ【高柳西小学校】

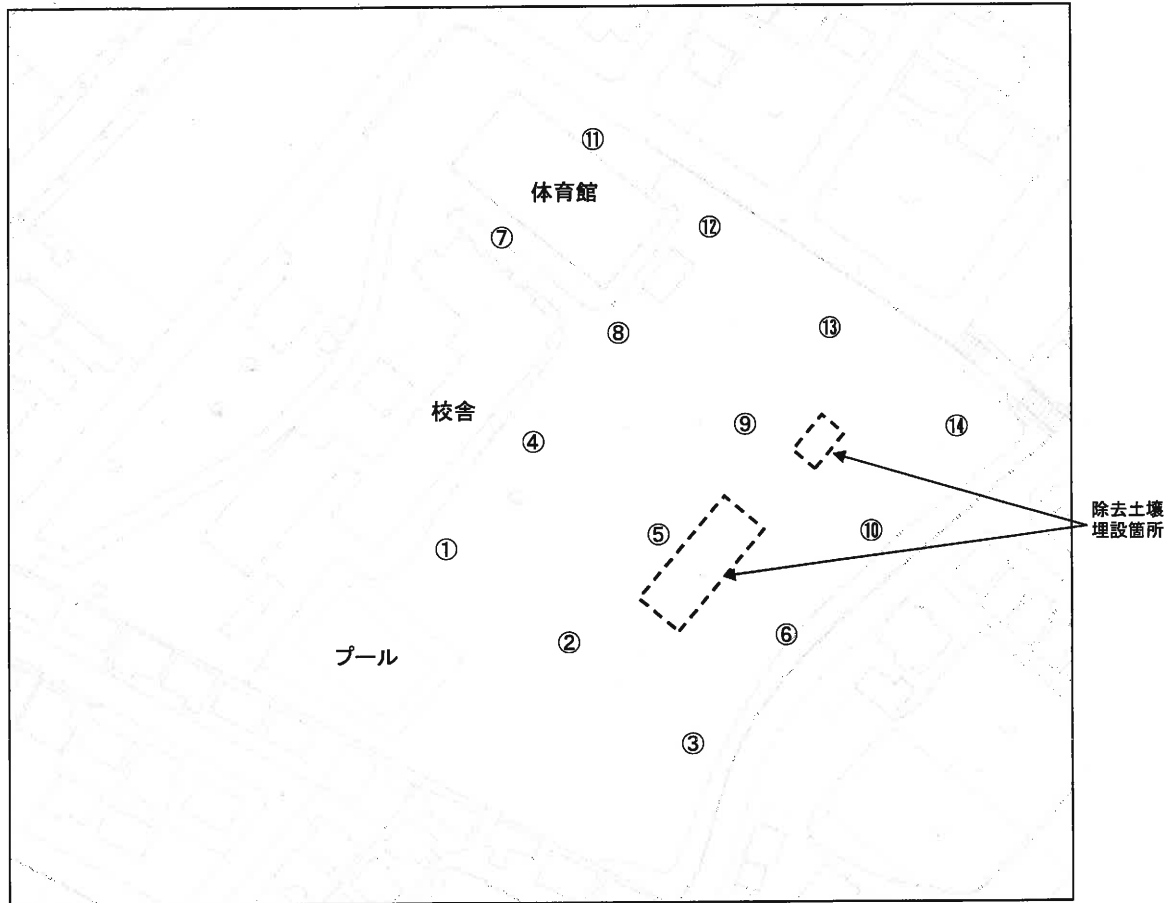

○除染前測定日：平成24年5月21日

○除染後測定日：平成24年7月4日

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.197	0.082	0.220	0.074	0.236	0.062
②	グラウンド	土	0.192	0.098	0.212	0.087	0.197	0.092
③	グラウンド	土	0.196	0.096	0.201	0.102	0.168	0.084
④	グラウンド	土	0.175	0.085	0.218	0.087	0.210	0.062
⑤	グラウンド	土	0.123	0.049	0.127	0.052	0.099	0.061
⑥	グラウンド	土	0.175	0.107	0.194	0.089	0.200	0.067
⑦	グラウンド	舗装	0.085	0.066	0.088	0.072	0.076	0.086
⑧	グラウンド	土	0.137	0.067	0.135	0.056	0.145	0.044
⑨	グラウンド	土	0.125	0.061	0.124	0.052	0.153	0.042
⑩	グラウンド	土	0.157	0.081	0.179	0.077	0.163	0.070
⑪	グラウンド	舗装	0.143	0.082	0.140	0.096	0.176	0.127
⑫	グラウンド	土	0.116	0.066	0.113	0.077	0.109	0.059
⑬	グラウンド	土	0.138	0.067	0.177	0.077	0.165	0.077
⑭	グラウンド	土	0.181	0.083	0.166	0.083	0.133	0.063
平均			0.153	0.078	0.164	0.077	0.159	0.071

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
