


除染後放射線量マップ【土小学校】

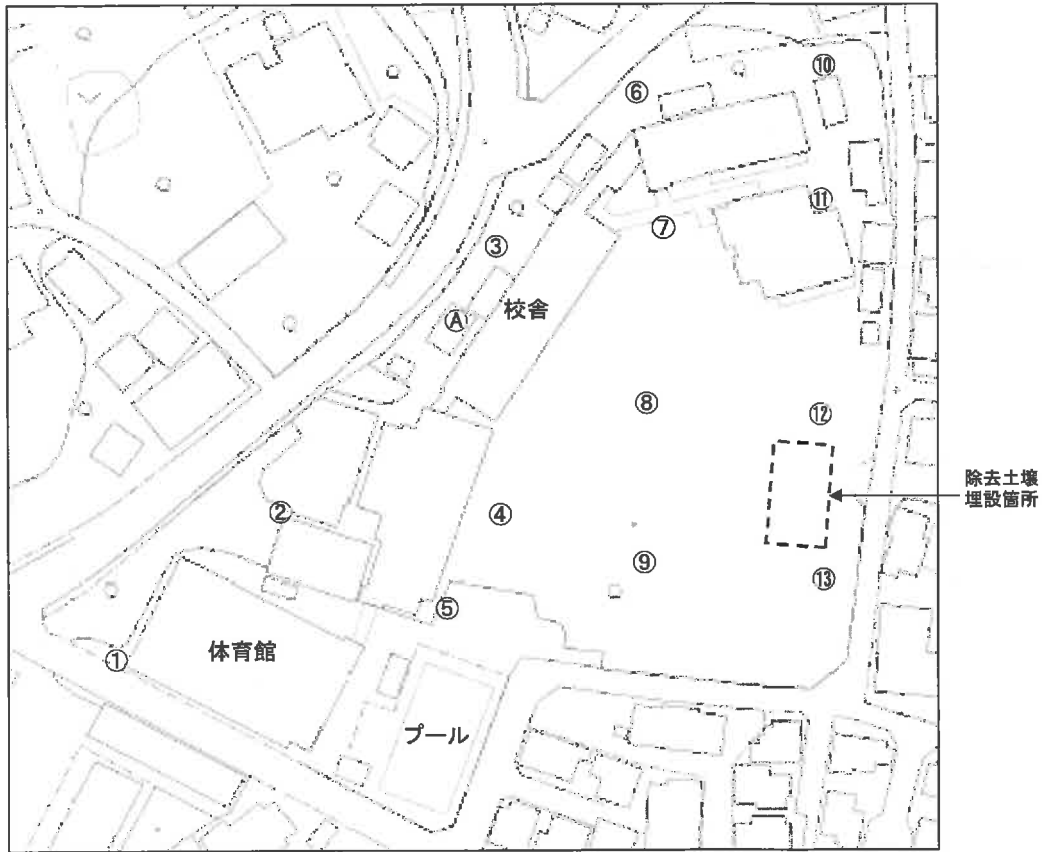

○除染前測定日:平成24年3月21日

○除染後測定日:平成24年8月1日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎前	土	0.219	<b>0.123</b>	0.235	<b>0.111</b>	0.269	0.110
②	グラウンド	アスファルト	0.208	<b>0.149</b>	0.235	<b>0.178</b>	0.300	0.260
③	校舎前	土	0.195	<b>0.133</b>	0.220	<b>0.129</b>	0.261	0.115
④	グラウンド	土	0.184	<b>0.061</b>	0.215	<b>0.058</b>	0.250	0.066
⑤	グラウンド	池横の芝	0.242	<b>0.132</b>	0.280	<b>0.138</b>	0.431	0.229
⑥	グラウンド	土	0.233	<b>0.122</b>	0.294	<b>0.135</b>	0.378	0.135
⑦	校舎前	土	0.204	<b>0.084</b>	0.212	<b>0.075</b>	0.219	0.091
⑧	グラウンド	土	0.190	<b>0.086</b>	0.188	<b>0.085</b>	0.220	0.084
⑨	グラウンド	土	0.144	<b>0.087</b>	0.113	<b>0.096</b>	0.087	0.107
⑩	グラウンド	土	0.302	<b>0.145</b>	0.314	<b>0.145</b>	0.353	0.226
⑪	校舎前	土	0.229	<b>0.208</b>	0.303	<b>0.219</b>	0.404	0.180
⑫	グラウンド	アスファルト	0.174	<b>0.099</b>	0.195	<b>0.097</b>	0.238	0.110
⑬	グラウンド	アスファルト	0.205	<b>0.080</b>	0.169	<b>0.072</b>	0.180	0.081
平均			0.210	<b>0.116</b>	0.229	<b>0.118</b>	0.276	0.138

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
Ⓐ	校舎裏	雨樋下	0.307	0.165	0.312	0.233	0.420	0.519

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
