


除染後放射線量マップ【柏第七小学校】

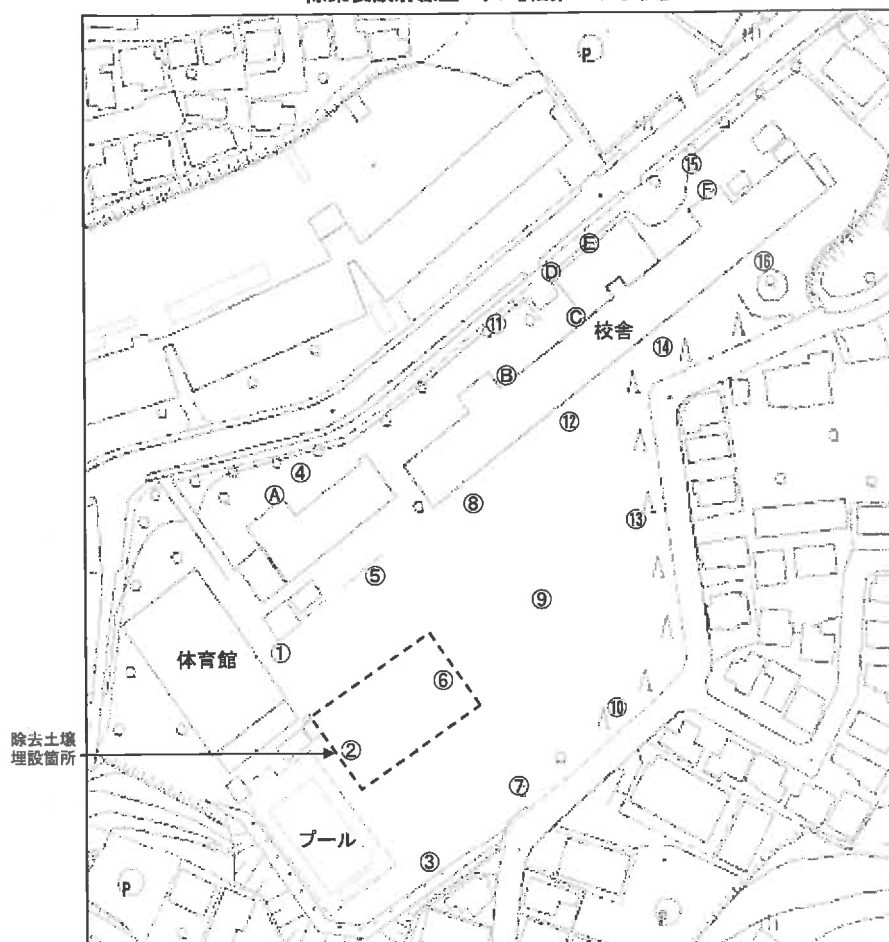

○除染前測定日：平成24年3月15日

○除染後測定日：平成24年7月31日

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	アスファルト	0.143	<b>0.099</b>	0.128	<b>0.115</b>	0.143	0.102
②	グラウンド	土	0.218	<b>0.070</b>	0.227	<b>0.078</b>	0.235	0.058
③	グラウンド	土	0.205	<b>0.086</b>	0.149	<b>0.094</b>	0.147	0.097
④	校舎裏	土	0.162	<b>0.176</b>	0.173	<b>0.174</b>	0.179	0.148
⑤	グラウンド	土	0.188	<b>0.111</b>	0.184	<b>0.109</b>	0.172	0.100
⑥	グラウンド	土	0.197	<b>0.072</b>	0.206	<b>0.059</b>	0.198	0.072
⑦	グラウンド	側溝	0.232	<b>0.098</b>	0.209	<b>0.113</b>	0.227	0.122
⑧	校舎前	アスファルト	0.205	<b>0.092</b>	0.226	<b>0.078</b>	0.256	0.089
⑨	グラウンド	アスファルト	0.171	<b>0.078</b>	0.202	<b>0.063</b>	0.160	0.070
⑩	グラウンド	土	0.250	<b>0.067</b>	0.251	<b>0.070</b>	0.301	0.072
⑪	校舎裏	土	0.275	<b>0.062</b>	0.365	<b>0.213</b>	0.461	0.220
⑫	校舎前	土	0.234	<b>0.118</b>	0.333	<b>0.122</b>	0.400	0.140
⑬	グラウンド	土	0.254	<b>0.093</b>	0.262	<b>0.098</b>	0.271	0.113
⑭	校舎前	アスファルト	0.173	<b>0.128</b>	0.169	<b>0.151</b>	0.217	0.135
⑮	校舎裏	土	0.196	<b>0.146</b>	0.250	<b>0.119</b>	0.390	0.127
⑯	校舎前	土	0.161	<b>0.135</b>	0.222	<b>0.142</b>	0.251	0.158
平均			0.204	<b>0.102</b>	0.222	<b>0.112</b>	0.251	0.114

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
A	校舎裏	側溝	0.311	<b>0.186</b>	0.498	<b>0.238</b>	0.989	0.455
B	校舎裏	側溝	0.259	<b>0.183</b>	0.403	<b>0.285</b>	0.722	0.535
C	校舎裏	側溝	0.213	<b>0.121</b>	0.325	<b>0.187</b>	0.555	0.315
D	校舎裏	アスファルト	0.218	<b>0.138</b>	0.195	<b>0.206</b>	0.260	0.305
E	校舎裏	アスファルト	0.181	<b>0.137</b>	0.206	<b>0.178</b>	0.249	0.252
F	校舎裏	アスファルト	0.171	<b>0.152</b>	0.210	<b>0.179</b>	0.248	0.275

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
