


除染後放射線量マップ【宮勢東小学校】

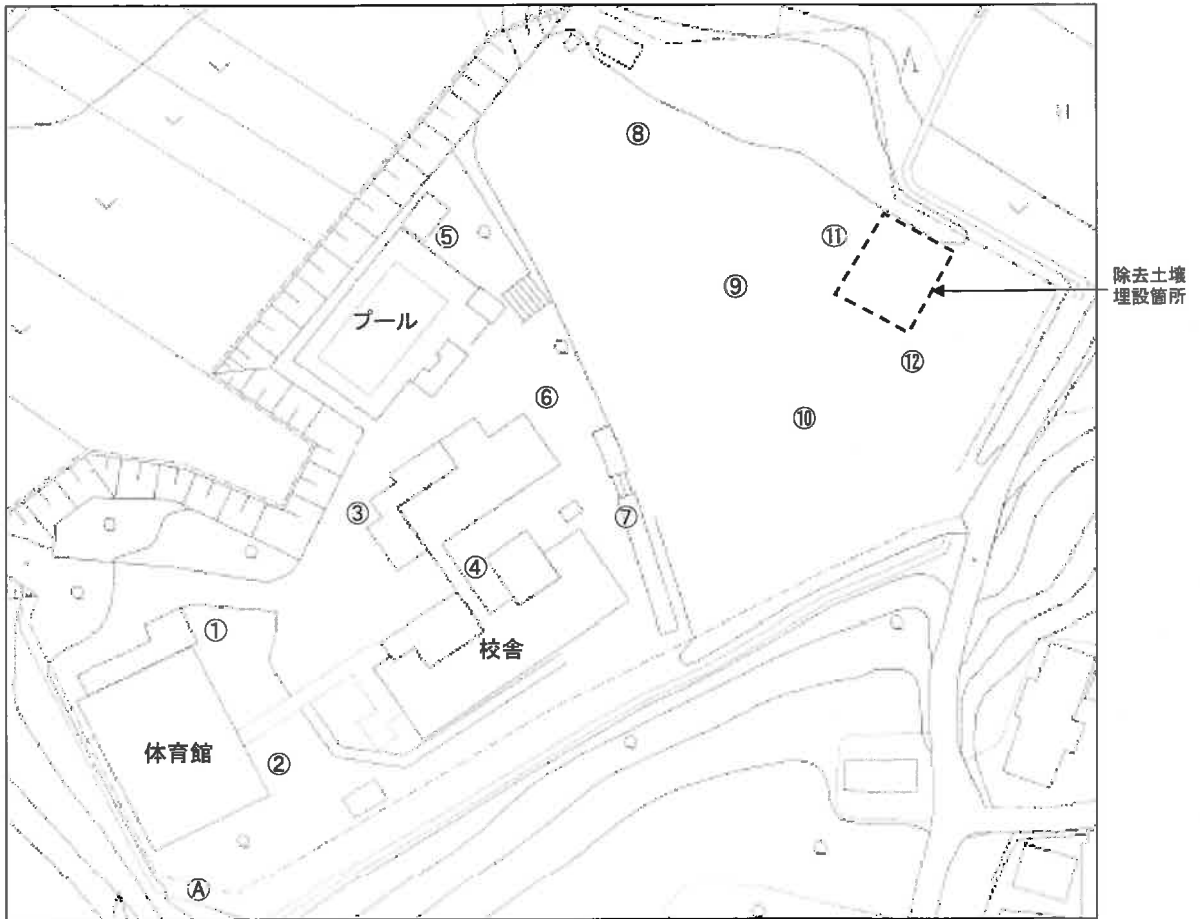

○除染前測定日:平成24年2月28日

○除染後測定日:平成24年8月1日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1:環境省基準				※2:柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	体育館前	アスファルト	0.250	0.134	0.284	0.117	0.315	0.129
②	体育館前	土	0.281	0.130	0.304	0.126	0.317	0.157
③	校舎裏	アスファルト	0.218	0.120	0.228	0.123	0.297	0.131
④	校舎前	アスファルト	0.140	0.102	0.155	0.123	0.146	0.148
⑤	プール前	土	0.230	0.123	0.269	0.124	0.379	0.136
⑥	校舎前	アスファルト	0.209	0.124	0.215	0.130	0.249	0.157
⑦	校舎前	アスファルト	0.289	0.145	0.273	0.160	0.275	0.143
⑧	グラウンド	土	0.290	0.062	0.310	0.086	0.361	0.087
⑨	グラウンド	土	0.232	0.061	0.274	0.061	0.259	0.066
⑩	グラウンド	土	0.334	0.082	0.371	0.093	0.410	0.078
⑪	グラウンド	土	0.272	0.068	0.298	0.071	0.278	0.087
⑫	グラウンド	土	0.164	0.063	0.139	0.075	0.146	0.075
平均			0.242	0.101	0.260	0.107	0.286	0.116

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1:環境省基準				※2:柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
Ⓐ	体育館横	土	0.400	0.239	0.429	0.240	0.343	0.200

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
