


除染後放射線量マップ【旭東小学校】

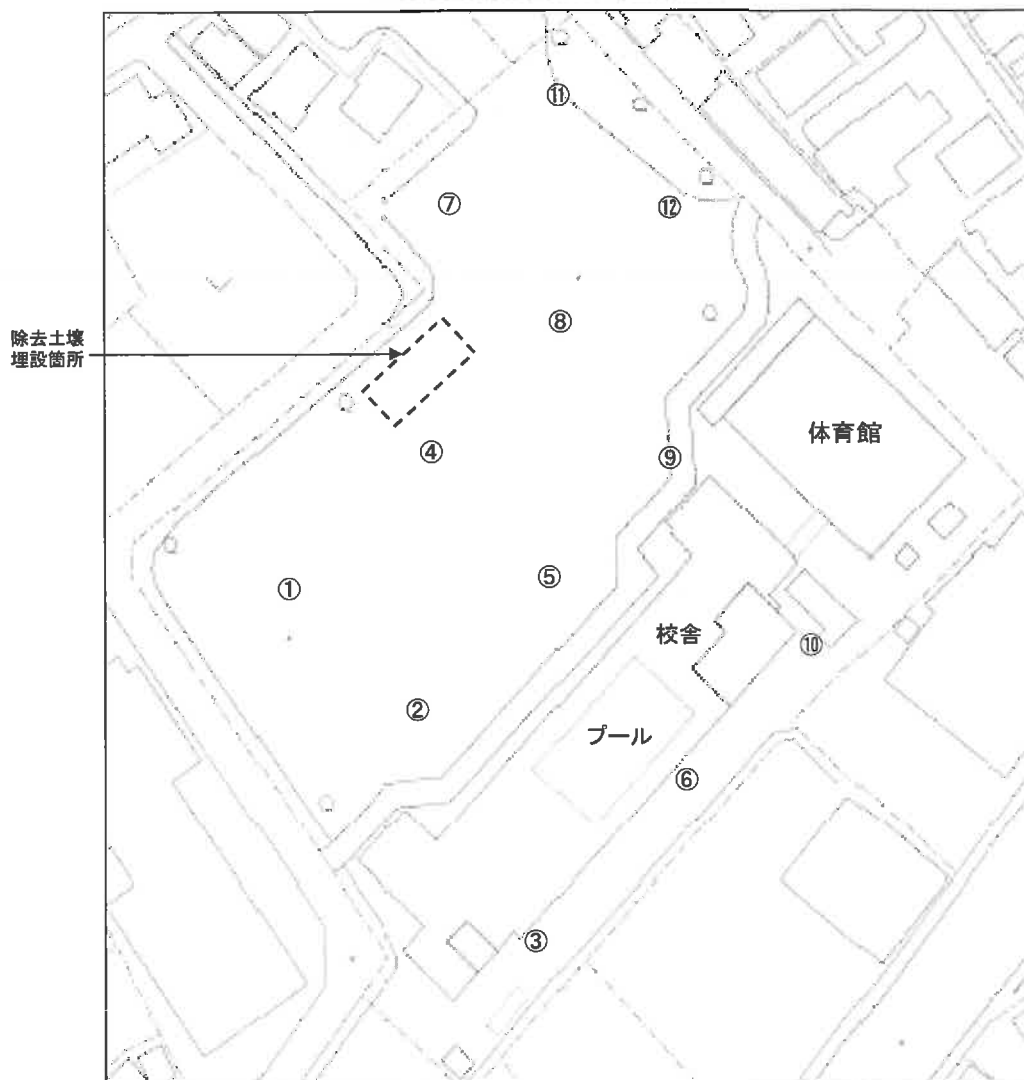

○除染前測定日:平成24年3月23日

○除染後測定日:平成24年7月31日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.203	0.077	0.256	0.096	0.235	0.067
②	グラウンド	土	0.191	0.061	0.187	0.053	0.166	0.051
③	校舎裏	土	0.200	0.137	0.229	0.166	0.252	0.147
④	グラウンド	土	0.227	0.048	0.241	0.061	0.234	0.057
⑤	グラウンド	土	0.200	0.057	0.215	0.077	0.178	0.084
⑥	校舎裏	土	0.211	0.130	0.210	0.129	0.238	0.176
⑦	グラウンド	土	0.247	0.072	0.284	0.087	0.275	0.069
⑧	グラウンド	土	0.250	0.053	0.263	0.050	0.254	0.053
⑨	グラウンド	土	0.183	0.071	0.210	0.065	0.183	0.060
⑩	校舎裏	土	0.251	0.109	0.269	0.144	0.403	0.145
⑪	グラウンド	土	0.210	0.153	0.224	0.172	0.212	0.158
⑫	グラウンド	土	0.233	0.128	0.256	0.119	0.233	0.129
平均			0.217	0.091	0.237	0.102	0.239	0.100

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
