


除染後放射線量マップ【富勢西小学校】

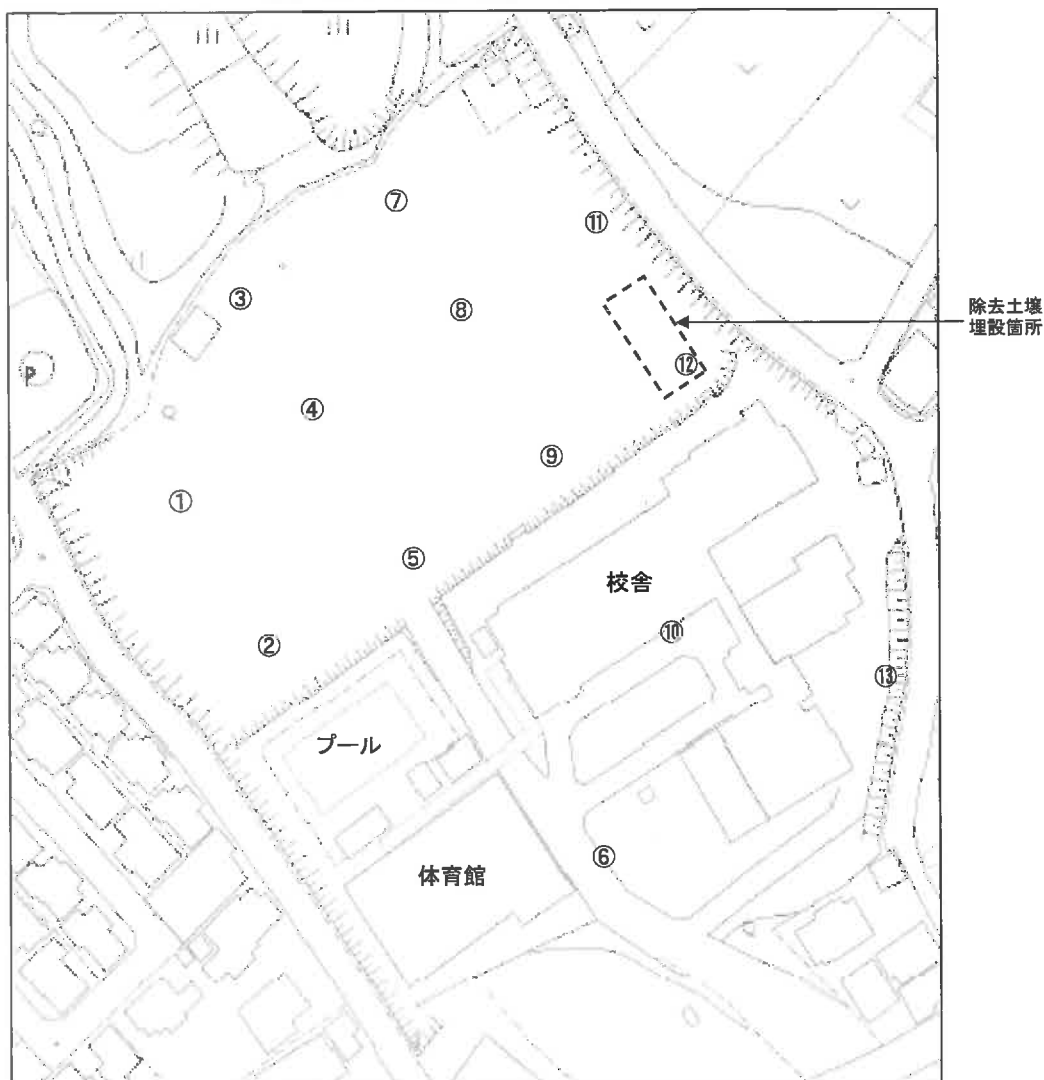

○除染前測定日:平成24年3月1日

○除染後測定日:平成24年8月1日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.153	0.096	0.167	0.094	0.137	0.092
②	グラウンド	土	0.223	0.093	0.239	0.093	0.254	0.072
③	グラウンド	土	0.281	0.080	0.313	0.094	0.326	0.092
④	グラウンド	土	0.216	0.080	0.271	0.081	0.244	0.092
⑤	グラウンド	土	0.269	0.083	0.247	0.089	0.338	0.084
⑥	通路端	土	0.304	0.112	0.321	0.131	0.367	0.109
⑦	グラウンド	土	0.222	0.087	0.264	0.102	0.259	0.092
⑧	グラウンド	土	0.171	0.086	0.197	0.097	0.226	0.085
⑨	グラウンド	土	0.249	0.076	0.304	0.088	0.350	0.091
⑩	校舎前	土	0.165	0.108	0.164	0.134	0.211	0.130
⑪	グラウンド	土	0.293	0.167	0.342	0.171	0.383	0.170
⑫	校舎前	アスファルト	0.182	0.117	0.204	0.133	0.195	0.141
⑬	校舎横	土	0.293	0.127	0.274	0.118	0.423	0.113
平均			0.232	0.101	0.254	0.110	0.286	0.105

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
