


除染後放射線量マップ【十余二小学校】

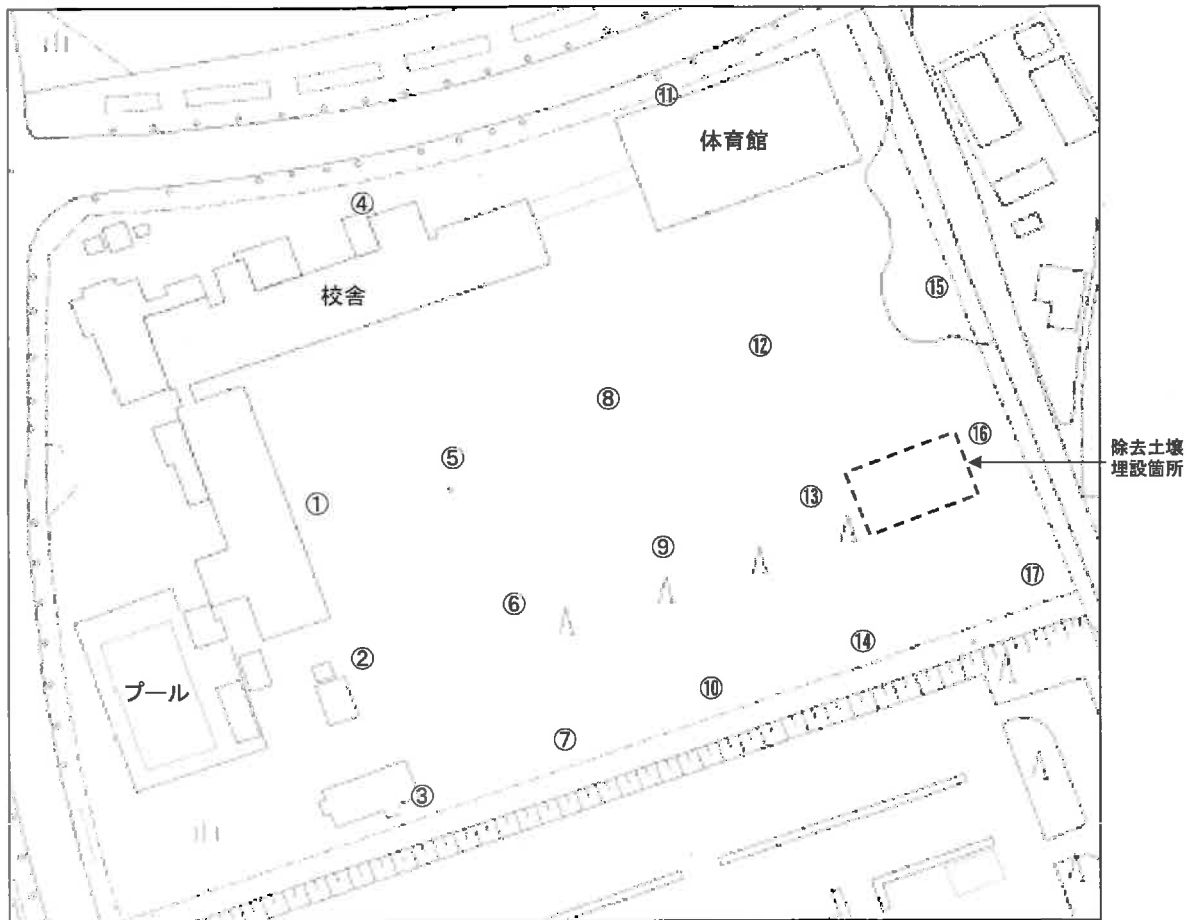

○除染前測定日:平成24年3月26日

○除染後測定日:平成24年7月31日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.149	0.104	0.149	0.114	0.170	0.094
②	グラウンド	土	0.164	0.120	0.184	0.108	0.175	0.103
③	グラウンド	土	0.209	0.089	0.239	0.114	0.285	0.109
④	校舎裏	アスファルト	0.151	0.081	0.173	0.090	0.162	0.096
⑤	グラウンド	土	0.258	0.057	0.249	0.060	0.245	0.056
⑥	グラウンド	土	0.276	0.098	0.332	0.103	0.328	0.101
⑦	グラウンド	土	0.213	0.116	0.232	0.127	0.275	0.125
⑧	グラウンド	土	0.278	0.076	0.284	0.077	0.332	0.065
⑨	グラウンド	土	0.265	0.071	0.275	0.084	0.248	0.079
⑩	グラウンド	土	0.244	0.114	0.302	0.125	0.319	0.106
⑪	体育館裏	土	0.188	0.084	0.188	0.110	0.234	0.117
⑫	グラウンド	土	0.294	0.089	0.285	0.102	0.310	0.078
⑬	グラウンド	土	0.309	0.088	0.390	0.089	0.487	0.098
⑭	グラウンド	土	0.262	0.102	0.280	0.108	0.246	0.096
⑮	グラウンド	土	0.213	0.107	0.209	0.131	0.192	0.130
⑯	グラウンド	土	0.244	0.113	0.239	0.120	0.255	0.112
⑰	グラウンド	土	0.244	0.102	0.291	0.111	0.258	0.099
平均			0.233	0.095	0.253	0.104	0.266	0.098

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
