


除染後放射線量マップ【柏第五小学校】

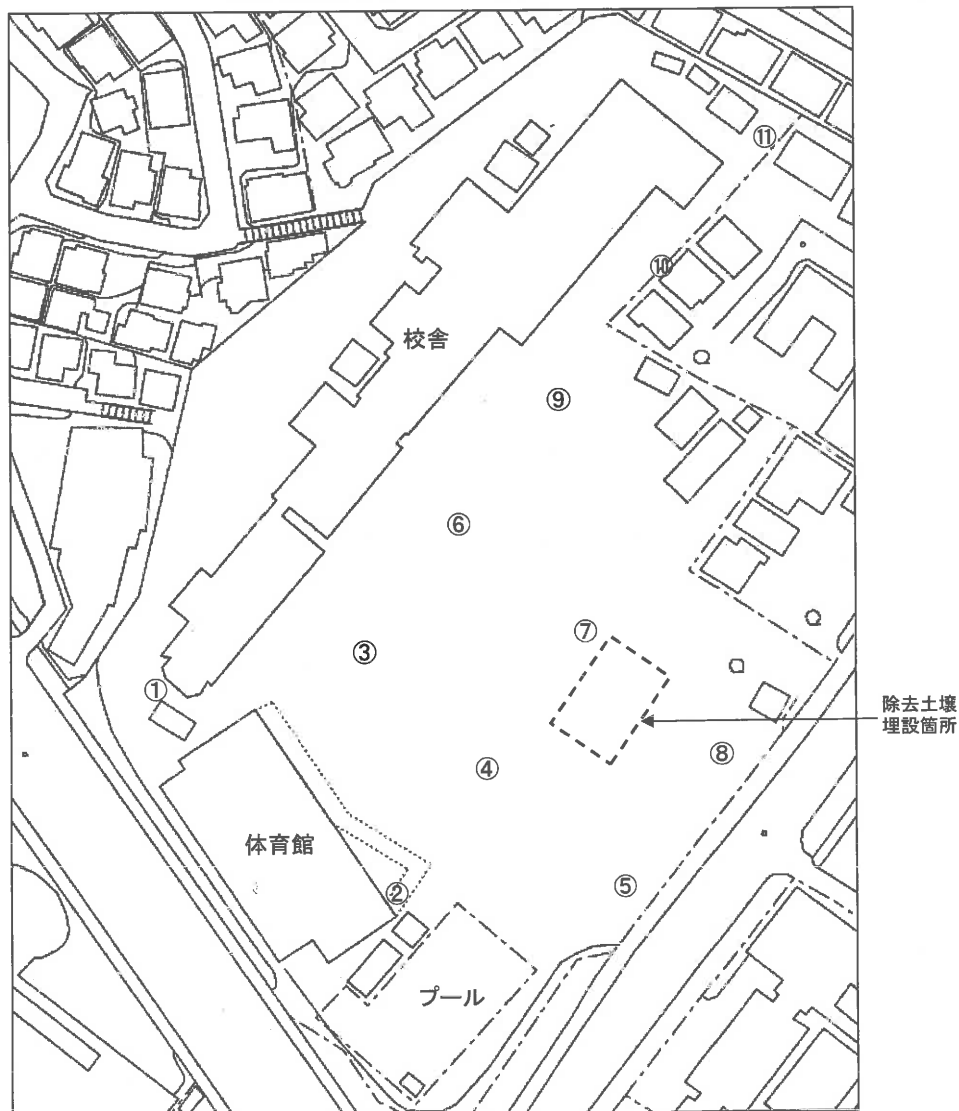

○除染前測定日:平成24年7月4日

○除染後測定日:平成24年11月27日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎横	土	0.151	0.075	0.119	0.077	0.192	0.107
②	体育館前	土	0.198	0.094	0.205	0.120	0.243	0.189
③	グラウンド	土	0.163	0.056	0.167	0.042	0.205	0.034
④	グラウンド	土	0.155	0.046	0.159	0.051	0.179	0.062
⑤	グラウンド	土	0.145	0.064	0.139	0.069	0.127	0.055
⑥	グラウンド	土	0.119	0.049	0.123	0.044	0.104	0.041
⑦	グラウンド	土	0.095	0.045	0.107	0.058	0.091	0.070
⑧	グラウンド	土	0.146	0.080	0.160	0.069	0.144	0.072
⑨	グラウンド	土	0.090	0.062	0.101	0.065	0.100	0.059
⑩	グラウンド	土	0.189	0.089	0.245	0.091	0.457	0.098
⑪	グラウンド	舗装	0.167	0.106	0.161	0.109	0.148	0.116
平均			0.147	0.070	0.153	0.072	0.181	0.082

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
