


除染後放射線量マップ【光ヶ丘小学校】

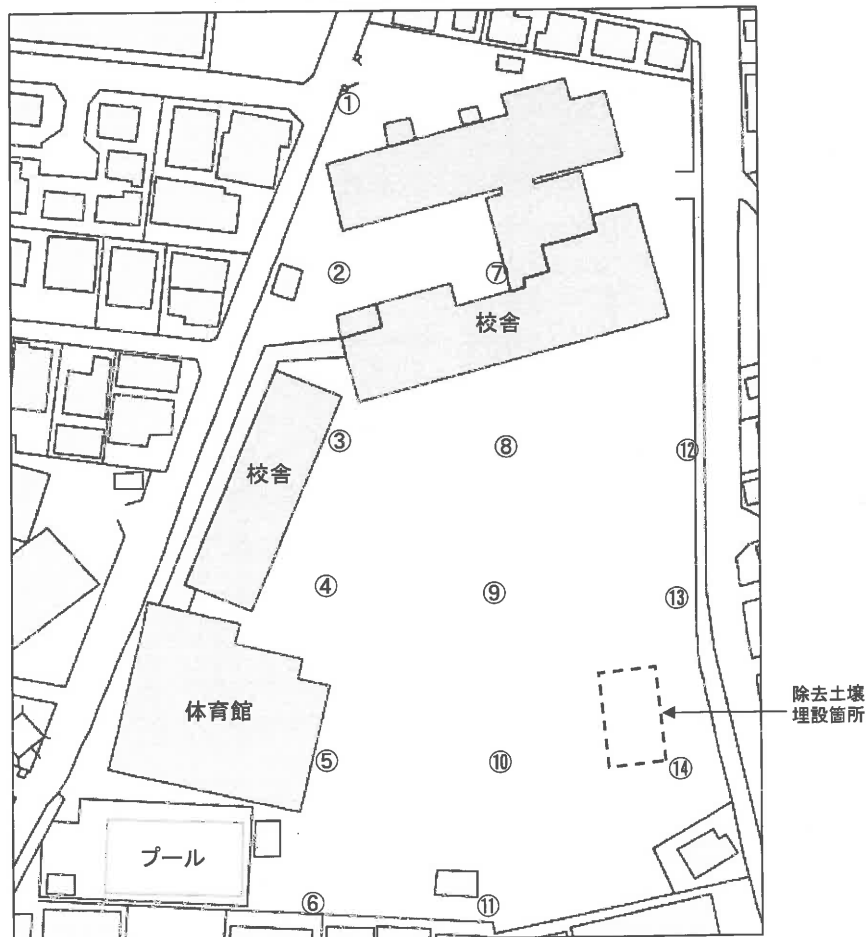

○除染前測定日:平成24年5月24日

○除染後測定日:平成24年11月29日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	舗装	0.089	0.074	0.108	0.081	0.161	0.103
②	グラウンド	土	0.160	0.128	0.187	0.183	0.152	0.191
③	グラウンド	土	0.204	0.100	0.221	0.098	0.223	0.089
④	グラウンド	土	0.213	0.105	0.226	0.101	0.193	0.105
⑤	グラウンド	舗装	0.206	0.078	0.223	0.081	0.178	0.084
⑥	グラウンド	土	0.358	0.123	0.503	0.101	0.662	0.090
⑦	校舎裏	土	0.197	0.107	0.228	0.108	0.315	0.122
⑧	グラウンド	土	0.158	0.064	0.162	0.071	0.164	0.065
⑨	グラウンド	土	0.190	0.061	0.197	0.044	0.199	0.049
⑩	グラウンド	土	0.212	0.053	0.169	0.061	0.178	0.046
⑪	校舎裏	土	0.169	0.097	0.187	0.106	0.189	0.100
⑫	校舎裏	土	0.142	0.074	0.162	0.074	0.199	0.071
⑬	グラウンド	土	0.133	0.062	0.153	0.080	0.114	0.071
⑭	グラウンド	土	0.157	0.065	0.163	0.053	0.181	0.065
平均			0.185	0.085	0.206	0.089	0.222	0.089

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
