


除染後放射線量マップ【土小学校】

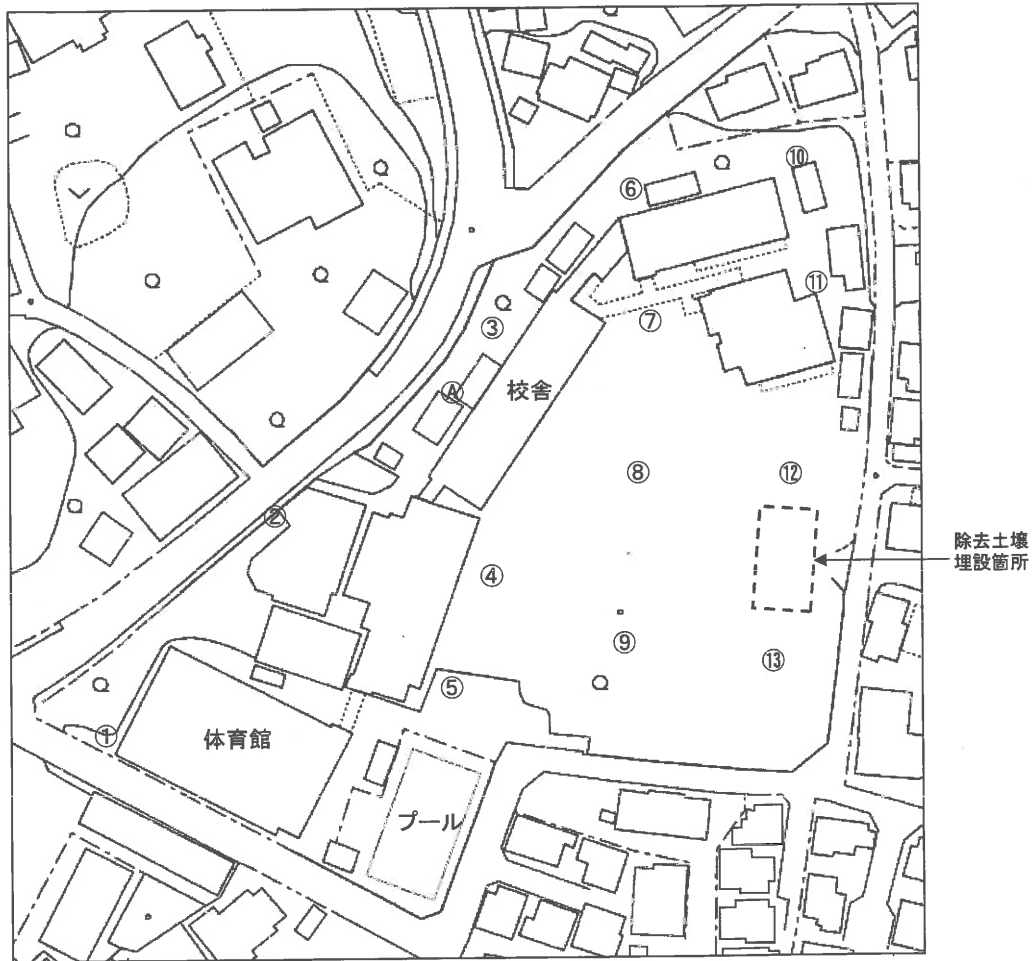

○除染前測定日:平成24年3月21日

○除染後測定日:平成24年12月5日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎前	土	0.219	0.130	0.235	0.120	0.269	0.127
②	グラウンド	アスファルト	0.208	0.138	0.235	0.147	0.300	0.142
③	校舎前	土	0.195	0.122	0.220	0.139	0.261	0.143
④	グラウンド	土	0.184	0.077	0.215	0.084	0.250	0.089
⑤	グラウンド	池横の芝	0.242	0.128	0.280	0.129	0.431	0.134
⑥	グラウンド	土	0.233	0.075	0.294	0.085	0.378	0.094
⑦	校舎前	土	0.204	0.086	0.212	0.084	0.219	0.099
⑧	グラウンド	土	0.190	0.087	0.188	0.089	0.220	0.094
⑨	グラウンド	土	0.144	0.064	0.113	0.070	0.087	0.085
⑩	グラウンド	土	0.302	0.139	0.314	0.149	0.353	0.149
⑪	校舎前	土	0.229	0.127	0.303	0.128	0.404	0.137
⑫	グラウンド	アスファルト	0.174	0.094	0.195	0.097	0.238	0.098
⑬	グラウンド	アスファルト	0.205	0.074	0.169	0.084	0.180	0.098
平均			0.210	0.103	0.229	0.108	0.276	0.115

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
⑧	校舎裏	雨樋下	0.307	0.179	0.312	0.248	0.420	0.378

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
