


除染後放射線量マップ【土南部小学校】

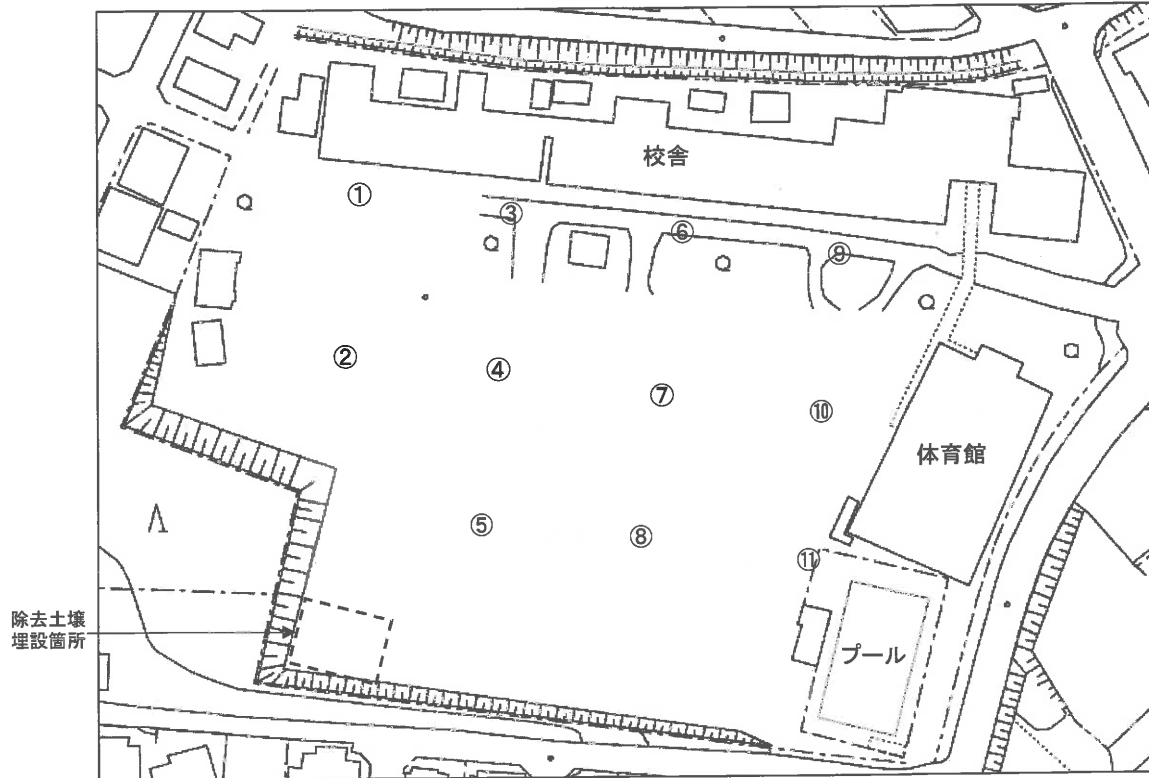

○除染前測定日:平成24年7月3日

○除染後測定日:平成24年12月5日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	舗装	0.083	0.065	0.073	0.063	0.077	0.054
②	グラウンド	土	0.150	0.055	0.130	0.053	0.158	0.061
③	グラウンド	舗装	0.101	0.056	0.103	0.053	0.081	0.060
④	グラウンド	土	0.149	0.057	0.141	0.058	0.142	0.058
⑤	グラウンド	土	0.138	0.048	0.151	0.047	0.143	0.054
⑥	グラウンド	舗装	0.103	0.052	0.120	0.059	0.146	0.067
⑦	グラウンド	土	0.126	0.064	0.161	0.061	0.157	0.075
⑧	グラウンド	土	0.116	0.058	0.123	0.053	0.133	0.065
⑨	グラウンド	舗装	0.097	0.056	0.125	0.054	0.128	0.064
⑩	グラウンド	土	0.115	0.048	0.120	0.049	0.139	0.058
⑪	グラウンド	土	0.130	0.045	0.131	0.058	0.111	0.092
平均			0.119	0.055	0.125	0.055	0.129	0.064

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
