


除染後放射線量マップ【西原小学校】

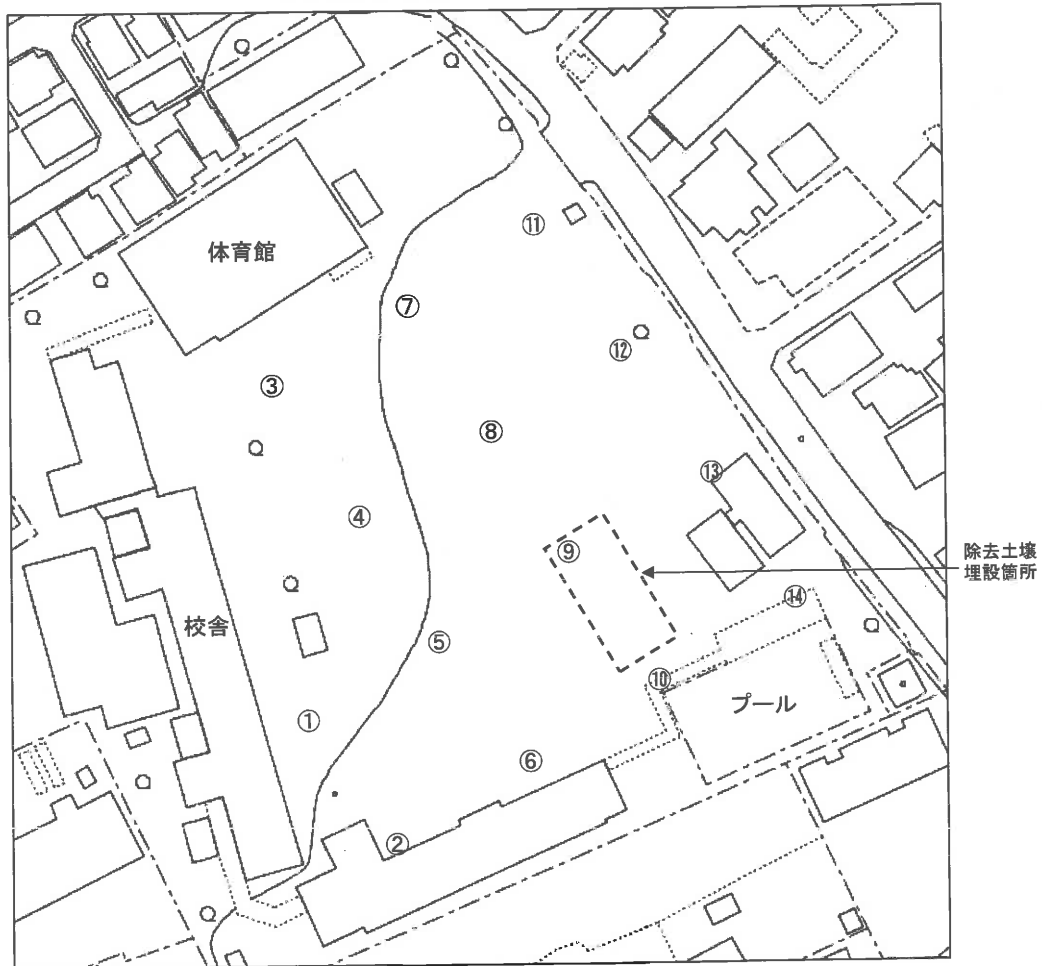

○除染前測定日:平成24年5月24日

○除染後測定日:平成24年11月26日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.214	0.049	0.233	0.051	0.342	0.051
②	グラウンド	土	0.202	0.058	0.173	0.041	0.229	0.057
③	グラウンド	舗装	0.105	0.069	0.102	0.056	0.093	0.081
④	グラウンド	土	0.146	0.047	0.178	0.042	0.187	0.035
⑤	グラウンド	土	0.189	0.036	0.195	0.040	0.221	0.046
⑥	グラウンド	土	0.277	0.058	0.294	0.074	0.294	0.059
⑦	グラウンド	舗装	0.157	0.077	0.178	0.063	0.145	0.068
⑧	グラウンド	土	0.144	0.030	0.183	0.028	0.152	0.040
⑨	グラウンド	土	0.204	0.050	0.211	0.048	0.230	0.067
⑩	グラウンド	土	0.270	0.053	0.276	0.055	0.276	0.052
⑪	グラウンド	舗装	0.134	0.094	0.159	0.088	0.157	0.087
⑫	グラウンド	土	0.174	0.077	0.193	0.070	0.206	0.094
⑬	グラウンド	土	0.191	0.080	0.195	0.069	0.269	0.076
⑭	グラウンド	土	0.202	0.086	0.215	0.096	0.312	0.096
平均			0.186	0.082	0.199	0.059	0.222	0.065

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
