


除染後放射線量マップ【藤心小学校】

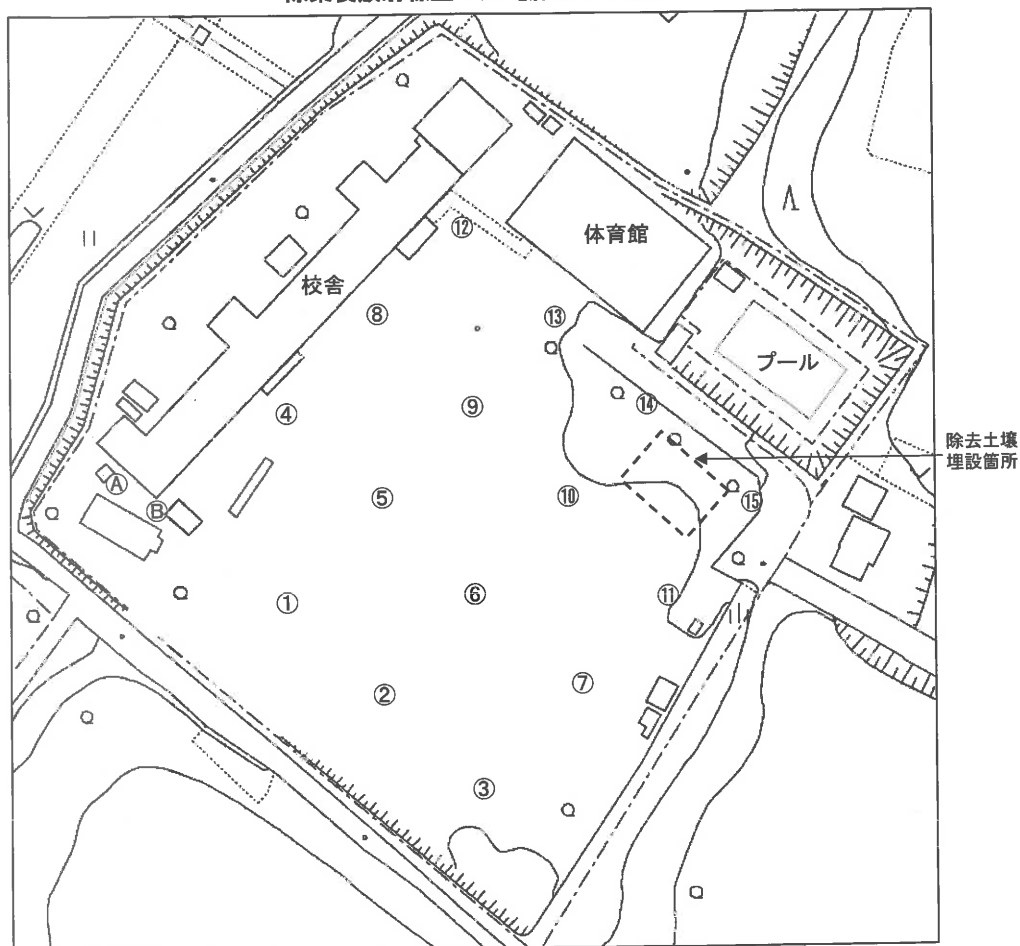

○除染前測定日:平成24年5月21日

○除染後測定日:平成24年12月5日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.230	0.055	0.215	0.056	0.184	0.060
②	グラウンド	土	0.281	0.045	0.268	0.054	0.211	0.050
③	グラウンド	土	0.275	0.091	0.278	0.090	0.354	0.087
④	グラウンド	土	0.183	0.089	0.172	0.089	0.232	0.093
⑤	グラウンド	土	0.197	0.054	0.200	0.060	0.206	0.063
⑥	グラウンド	土	0.233	0.049	0.249	0.053	0.235	0.056
⑦	グラウンド	土	0.237	0.101	0.259	0.098	0.243	0.097
⑧	グラウンド	舗装	0.144	0.056	0.149	0.059	0.142	0.051
⑨	グラウンド	土	0.217	0.044	0.230	0.045	0.222	0.040
⑩	グラウンド	土	0.211	0.050	0.238	0.054	0.236	0.056
⑪	グラウンド	土	0.297	0.098	0.306	0.102	0.374	0.103
⑫	グラウンド	舗装	0.117	0.056	0.113	0.065	0.106	0.063
⑬	グラウンド	土	0.225	0.046	0.223	0.047	0.307	0.049
⑭	グラウンド	土	0.152	0.060	0.178	0.057	0.237	0.059
⑮	グラウンド	土	0.197	0.058	0.222	0.055	0.316	0.051
平均			0.213	0.063	0.220	0.066	0.240	0.065

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
(A)	校舎横	樹	0.205	0.109	0.213	0.157	0.389	0.279
(B)	校舎横	樹	0.220	0.130	0.267	0.203	0.750	0.330

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
