


除染後放射線量マップ【酒井根東小学校】

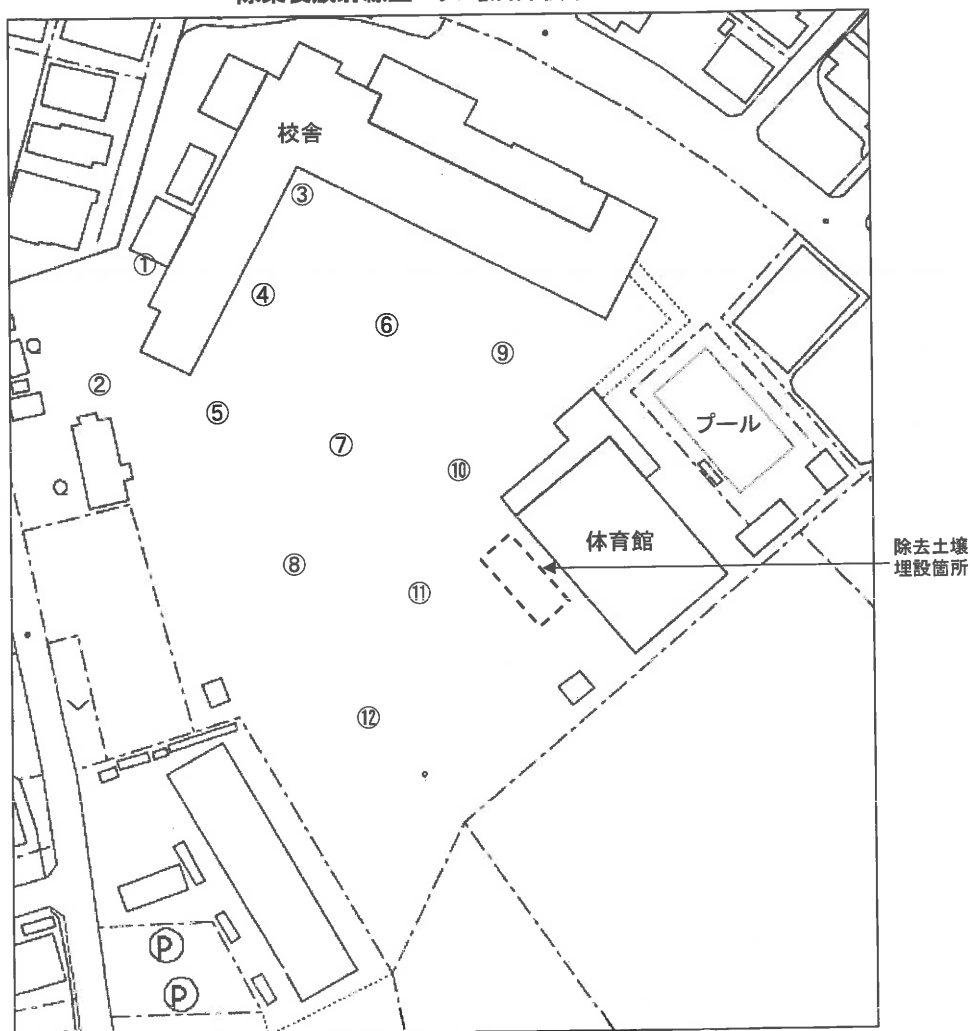

○除染前測定日:平成24年5月24日

○除染後測定日:平成24年12月5日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	土	0.248	0.150	0.281	0.168	0.395	0.178
②	校舎裏	舗装	0.198	0.186	0.242	0.174	0.271	0.179
③	グラウンド	土	0.090	0.077	0.087	0.073	0.090	0.075
④	グラウンド	土	0.189	0.120	0.250	0.132	0.382	0.131
⑤	グラウンド	土	0.089	0.053	0.087	0.054	0.058	0.049
⑥	グラウンド	土	0.155	0.054	0.159	0.056	0.161	0.048
⑦	グラウンド	土	0.103	0.064	0.091	0.059	0.084	0.054
⑧	グラウンド	土	0.136	0.054	0.139	0.047	0.146	0.048
⑨	グラウンド	土	0.171	0.059	0.197	0.048	0.177	0.051
⑩	グラウンド	土	0.164	0.063	0.150	0.054	0.190	0.053
⑪	グラウンド	土	0.097	0.070	0.094	0.064	0.067	0.064
⑫	グラウンド	土	0.174	0.140	0.181	0.132	0.156	0.089
平均			0.151	0.091	0.163	0.088	0.181	0.085

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
