


除染後放射線量マップ【風早南部小学校】

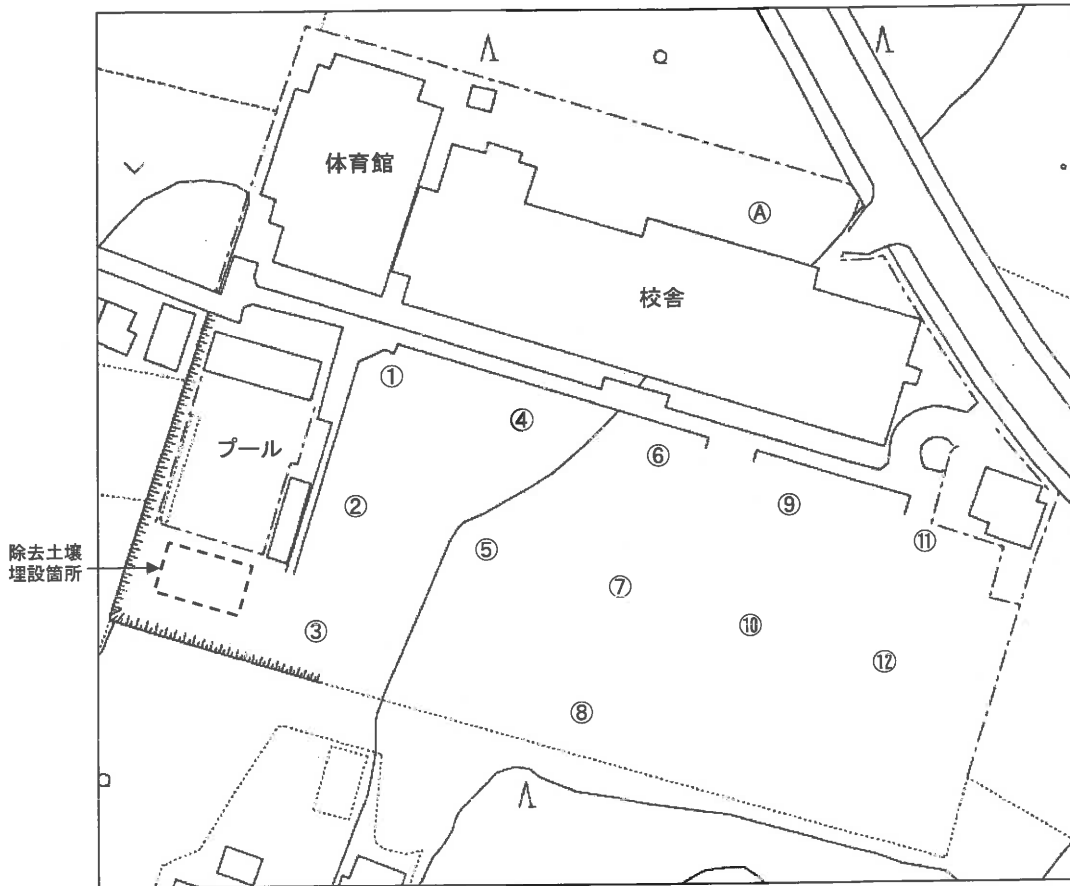

○除染前測定日:平成24年5月23日

○除染後測定日:平成24年12月4日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	舗装	0.180	0.145	0.211	0.176	0.262	0.204
②	グラウンド	舗装	0.145	0.114	0.147	0.140	0.134	0.132
③	グラウンド	側溝	0.248	0.092	0.293	0.079	0.326	0.097
④	グラウンド	土	0.166	0.088	0.186	0.081	0.230	0.055
⑤	グラウンド	土	0.170	0.101	0.191	0.080	0.237	0.093
⑥	グラウンド	土	0.135	0.072	0.150	0.052	0.151	0.054
⑦	グラウンド	土	0.162	0.090	0.168	0.087	0.189	0.071
⑧	グラウンド	側溝	0.250	0.106	0.237	0.090	0.344	0.076
⑨	グラウンド	土	0.140	0.085	0.147	0.064	0.173	0.058
⑩	グラウンド	土	0.152	0.089	0.199	0.074	0.193	0.076
⑪	グラウンド	土	0.167	0.091	0.200	0.070	0.215	0.072
⑫	グラウンド	土	0.204	0.070	0.221	0.076	0.213	0.069
平均			0.177	0.095	0.196	0.089	0.222	0.088

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
Ⓐ	校舎裏	マンホール	0.222	0.169	0.244	0.230	0.261	0.285

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
