


除染後放射線量マップ【大津ヶ丘第二小学校】

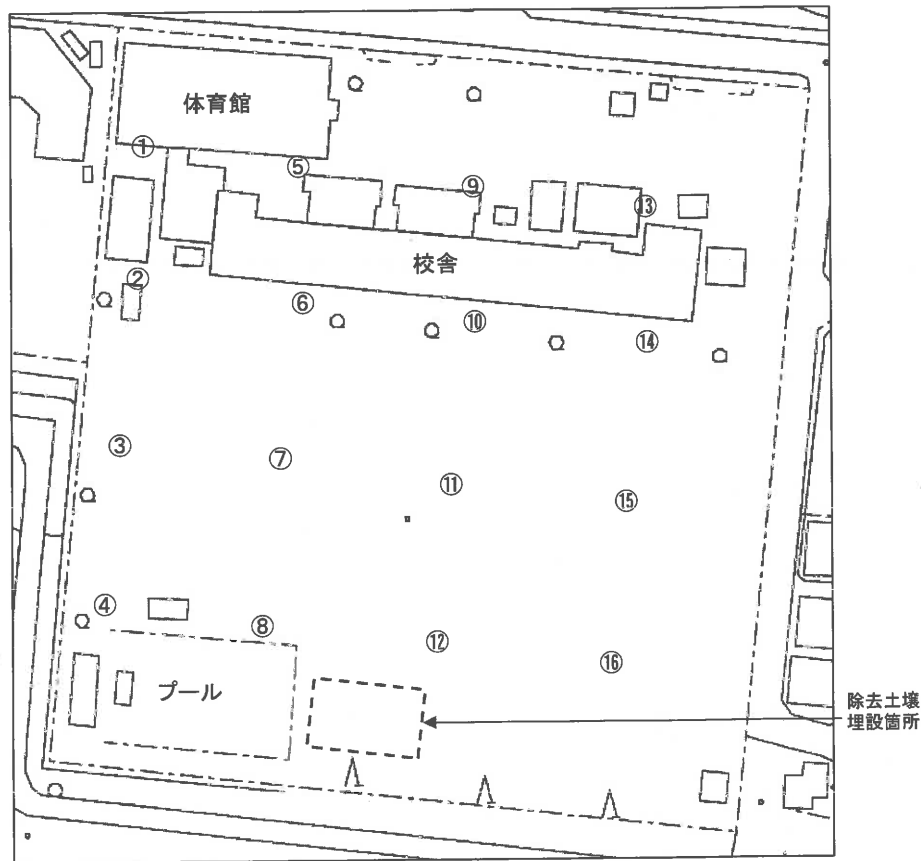

○除染前測定日:平成24年5月25日

○除染後測定日:平成24年12月4日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	土	0.234	0.098	0.256	0.099	0.266	0.100
②	グラウンド	土	0.180	0.079	0.159	0.066	0.143	0.073
③	グラウンド	土	0.217	0.090	0.247	0.086	0.223	0.084
④	グラウンド	土	0.218	0.085	0.250	0.079	0.274	0.076
⑤	校舎裏	舗装	0.182	0.110	0.220	0.117	0.203	0.120
⑥	グラウンド	土	0.161	0.050	0.181	0.056	0.190	0.051
⑦	グラウンド	土	0.183	0.047	0.233	0.048	0.214	0.045
⑧	グラウンド	土	0.196	0.057	0.208	0.065	0.287	0.069
⑨	校舎裏	舗装	0.137	0.140	0.143	0.135	0.165	0.172
⑩	グラウンド	土	0.116	0.064	0.115	0.058	0.117	0.065
⑪	グラウンド	土	0.186	0.061	0.190	0.051	0.204	0.058
⑫	グラウンド	土	0.203	0.056	0.229	0.056	0.277	0.065
⑬	校舎裏	土	0.147	0.097	0.189	0.109	0.253	0.146
⑭	グラウンド	土	0.117	0.058	0.105	0.067	0.074	0.052
⑮	グラウンド	土	0.178	0.065	0.152	0.064	0.165	0.057
⑯	グラウンド	土	0.234	0.064	0.255	0.059	0.248	0.051
平均			0.181	0.076	0.196	0.076	0.206	0.080

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
