


放射線量マップ【柏第六小学校】

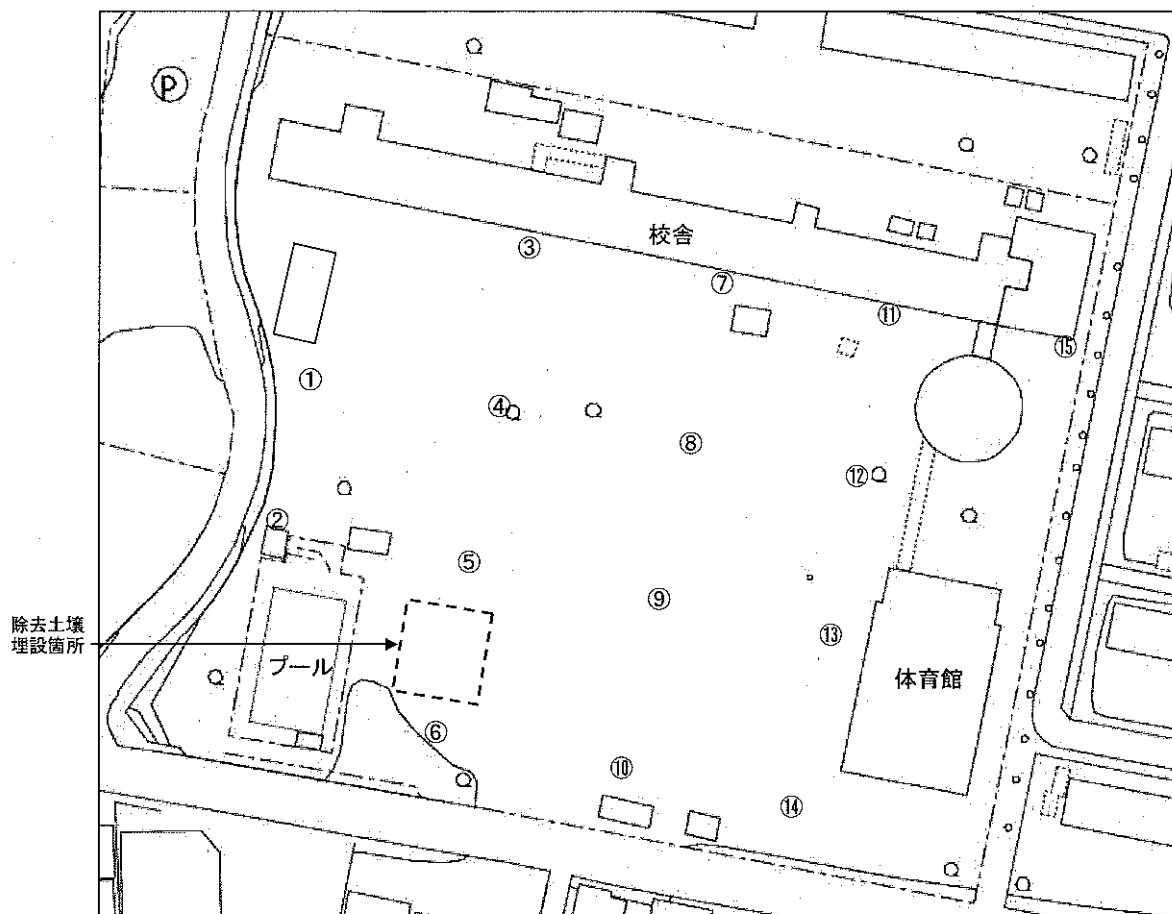

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成26年5月14日(前回:平成26年2月5日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	こどもルーム前	土	0.066	0.103	0.078	0.089	0.074	0.109
②	プール横	土	0.100	0.116	0.101	0.124	0.081	0.105
③	校舎前	土	0.074	0.073	0.082	0.081	0.076	0.093
④	グラウンド	土	0.088	0.082	0.099	0.090	0.073	0.069
⑤	グラウンド	土	0.041	0.034	0.046	0.036	0.037	0.043
⑥	グラウンド	土	0.059	0.063	0.058	0.070	0.053	0.118
⑦	校舎前	土	0.065	0.083	0.073	0.075	0.057	0.080
⑧	グラウンド	土	0.071	0.056	0.063	0.037	0.046	0.053
⑨	グラウンド	土	0.052	0.041	0.035	0.036	0.047	0.043
⑩	グラウンド	土	0.051	0.093	0.040	0.095	0.043	0.067
⑪	校舎前	アスファルト	0.085	0.076	0.076	0.057	0.060	0.063
⑫	グラウンド	土	0.077	0.074	0.072	0.086	0.111	0.093
⑬	グラウンド	土	0.061	0.056	0.070	0.052	0.057	0.038
⑭	グラウンド	土	0.068	0.089	0.080	0.064	0.100	0.066
⑮	校舎前	アスファルト	0.117	0.124	0.107	0.113	0.137	0.106
平均			0.072	0.078	0.072	0.074	0.070	0.076

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
