


放射線量マップ【土小学校】

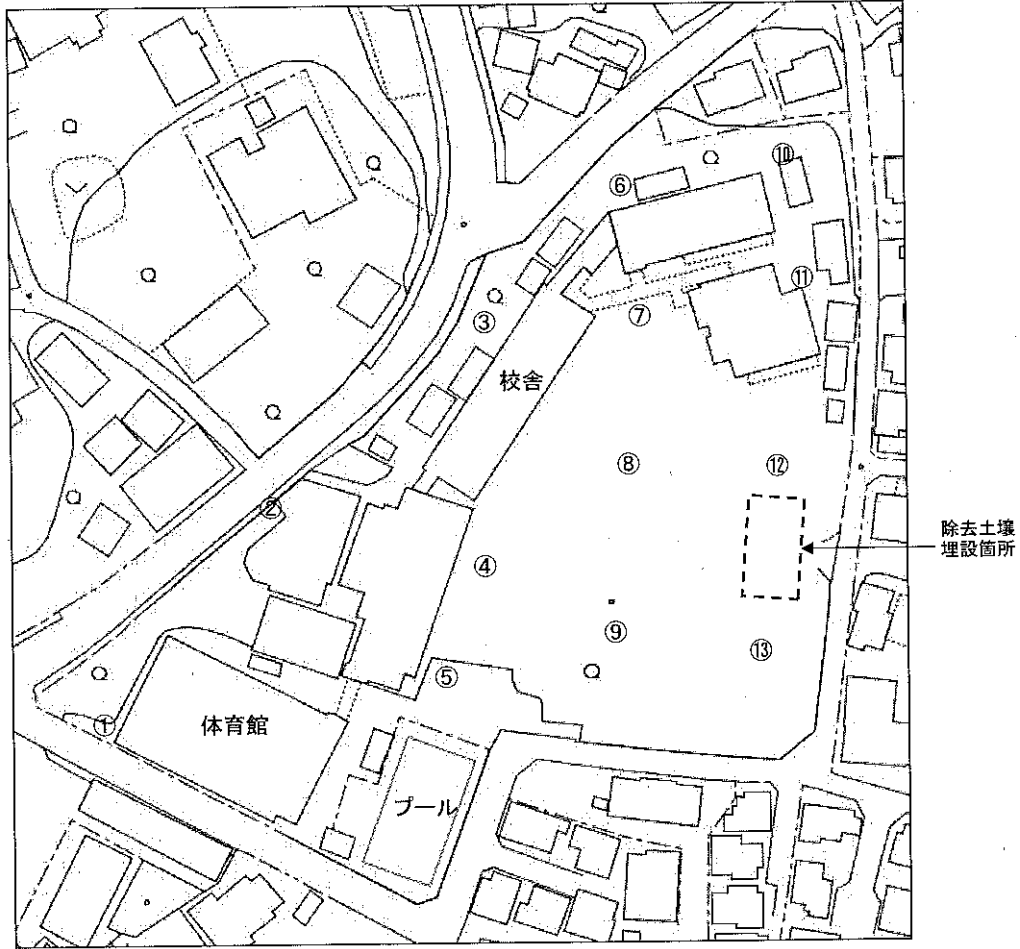

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成26年5月8日(前回:平成26年2月19日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館横	土	0.090	0.078	0.091	0.104	0.069	0.080
②	校舎前	アスファルト	0.068	0.078	0.068	0.086	0.092	0.095
③	校舎前	土	0.136	0.076	0.113	0.083	0.106	0.063
④	グラウンド	土	0.069	0.058	0.062	0.068	0.066	0.046
⑤	グラウンド	池横の芝	0.085	0.113	0.069	0.113	0.077	0.092
⑥	校舎裏	土	0.084	0.075	0.074	0.068	0.075	0.084
⑦	校舎前	土	0.118	0.047	0.125	0.066	0.182	0.047
⑧	グラウンド	土	0.045	0.063	0.044	0.066	0.035	0.076
⑨	グラウンド	土	0.087	0.066	0.071	0.075	0.062	0.072
⑩	グラウンド	土	0.105	0.101	0.081	0.104	0.090	0.126
⑪	校舎前	土	0.116	0.141	0.180	0.131	0.193	0.225
⑫	グラウンド	アスファルト	0.078	0.068	0.060	0.070	0.043	0.056
⑬	グラウンド	土	0.069	0.063	0.056	0.056	0.045	0.053
平均			0.088	0.079	0.084	0.084	0.087	0.086

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
