


放射線量マップ【柏第七小学校】

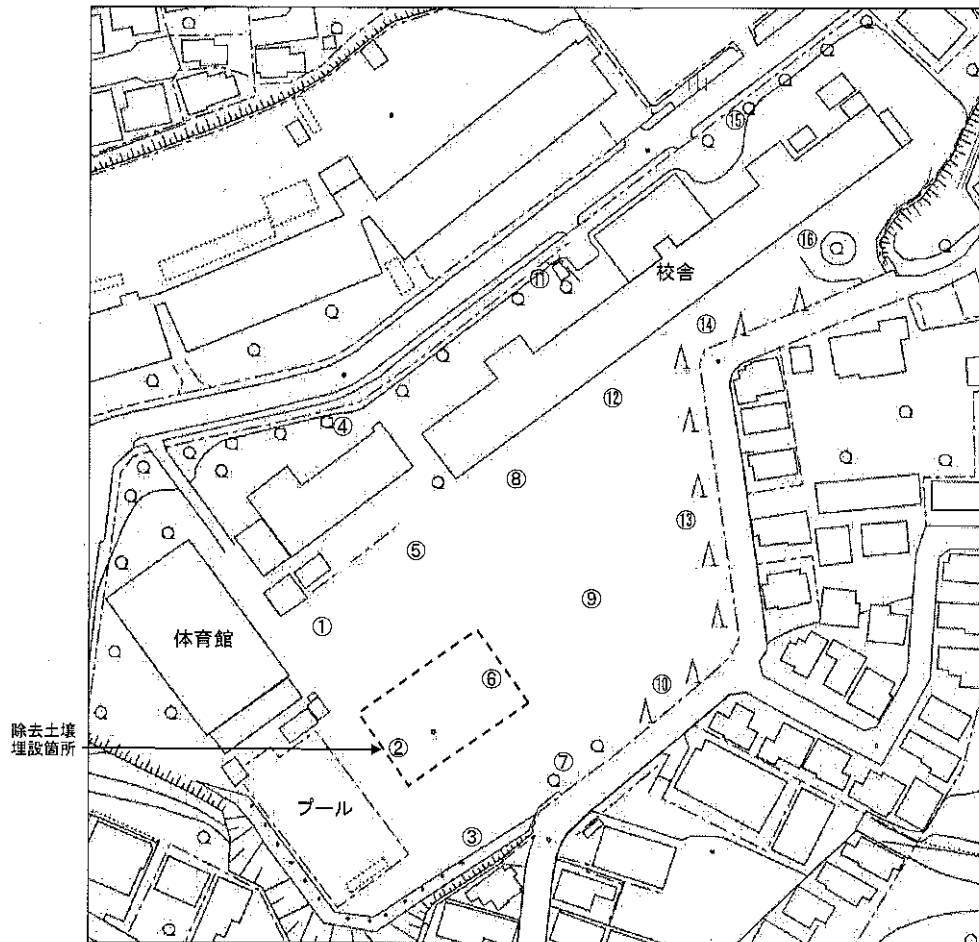

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成26年5月14日(前回:平成26年2月5日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.045	0.063	0.067	0.062	0.079	0.063
②	グラウンド	土	0.045	0.046	0.048	0.053	0.059	0.060
③	グラウンド	土	0.043	0.065	0.042	0.063	0.045	0.045
④	校舎裏	土	0.095	0.100	0.089	0.084	0.106	0.069
⑤	グラウンド	土	0.038	0.072	0.060	0.075	0.064	0.076
⑥	グラウンド	土	0.053	0.049	0.053	0.063	0.050	0.044
⑦	グラウンド	側溝	0.072	0.049	0.071	0.058	0.105	0.042
⑧	校舎前	アスファルト	0.053	0.040	0.069	0.051	0.076	0.048
⑨	グラウンド	土	0.048	0.056	0.063	0.063	0.084	0.048
⑩	グラウンド	土	0.047	0.058	0.042	0.074	0.054	0.078
⑪	校舎裏	土	0.082	0.096	0.106	0.118	0.082	0.088
⑫	校舎前	土	0.060	0.058	0.046	0.059	0.071	0.053
⑬	グラウンド	土	0.063	0.059	0.052	0.071	0.061	0.070
⑭	校舎前	アスファルト	0.086	0.072	0.099	0.104	0.113	0.086
⑮	校舎裏	土	0.080	0.090	0.099	0.092	0.083	0.081
⑯	校舎前	アスファルト	0.063	0.076	0.070	0.068	0.069	0.058
平均			0.061	0.066	0.067	0.072	0.075	0.063

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
