


放射線量マップ【高田小学校】

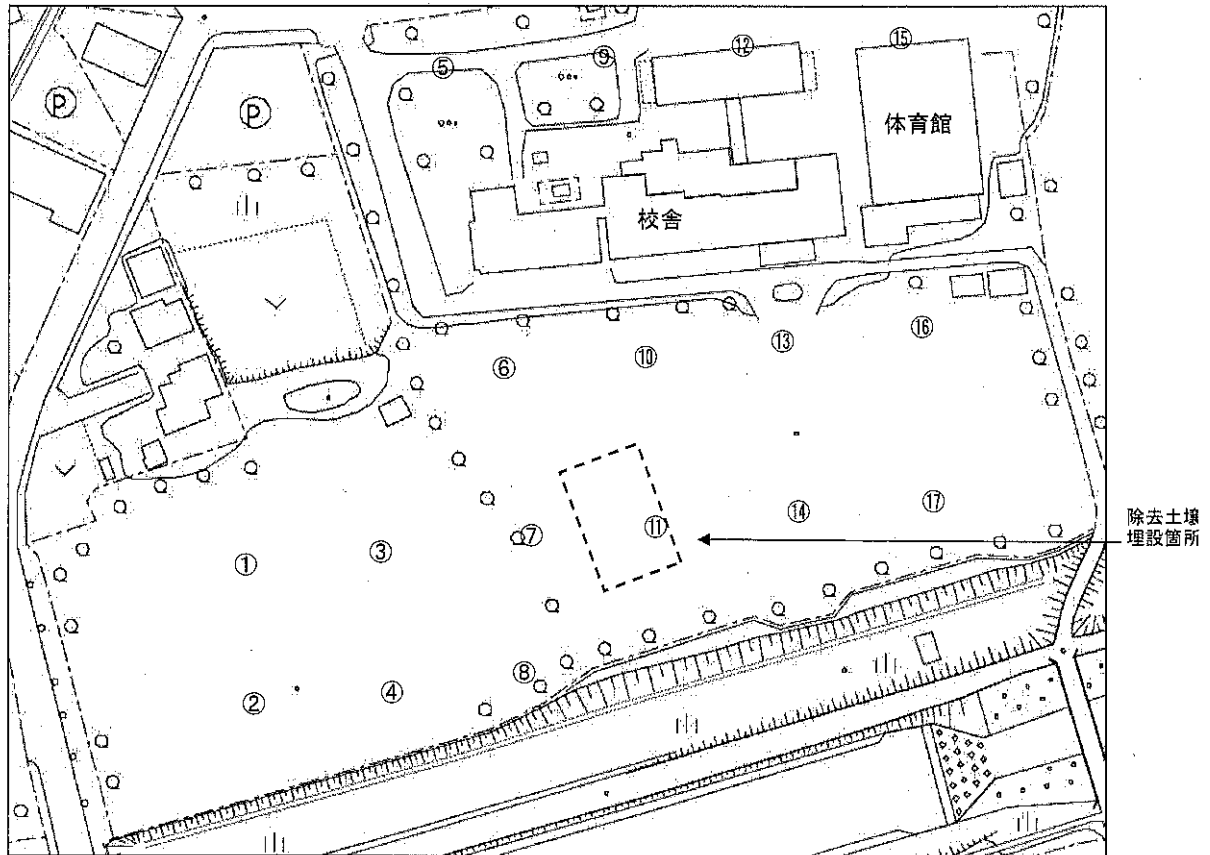

○除染完了日：平成24年5月9日

○測定日：平成26年5月14日（前回：平成26年2月5日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.063	0.075	0.075	0.095	0.054	0.096
②	グラウンド	土	0.073	0.068	0.096	0.066	0.098	0.070
③	グラウンド	土	0.058	0.059	0.063	0.061	0.062	0.051
④	グラウンド	土	0.056	0.086	0.085	0.068	0.054	0.069
⑤	花壇付近	土	0.062	0.056	0.062	0.064	0.063	0.060
⑥	グラウンド	土	0.045	0.042	0.029	0.038	0.042	0.039
⑦	グラウンド	土	0.042	0.037	0.048	0.051	0.054	0.034
⑧	グラウンド	土	0.063	0.071	0.078	0.061	0.076	0.051
⑨	花壇脇	土	0.057	0.079	0.072	0.056	0.065	0.048
⑩	グラウンド	土	0.039	0.049	0.057	0.042	0.048	0.036
⑪	グラウンド	土	0.033	0.033	0.026	0.034	0.043	0.028
⑫	校舎裏	土	0.043	0.071	0.064	0.083	0.052	0.074
⑬	グラウンド	土	0.033	0.041	0.042	0.043	0.041	0.041
⑭	グラウンド	土	0.022	0.056	0.037	0.046	0.032	0.053
⑮	体育館裏	土	0.069	0.059	0.080	0.069	0.071	0.046
⑯	グラウンド	土	0.046	0.051	0.045	0.035	0.036	0.057
⑰	グラウンド	土	0.034	0.053	0.038	0.026	0.042	0.035
平均			0.049	0.058	0.059	0.055	0.055	0.052

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
