


放射線量マップ【逆井小学校】

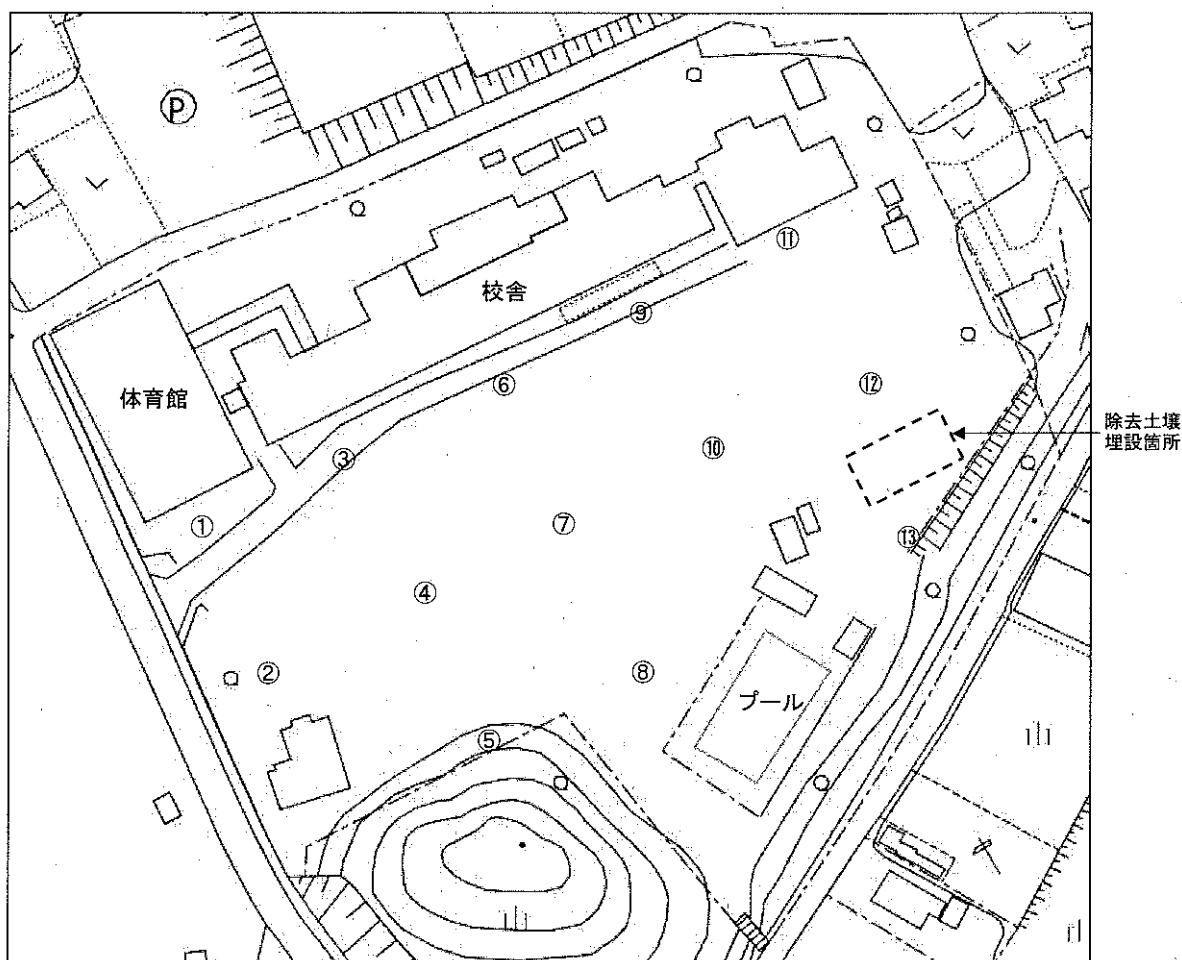

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成26年5月7日(前回:平成26年2月19日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.112	0.051	0.097	0.061	0.152	0.034
②	グラウンド	土	0.092	0.063	0.070	0.063	0.091	0.050
③	グラウンド	舗装	0.073	0.051	0.066	0.061	0.048	0.060
④	グラウンド	土	0.038	0.053	0.039	0.046	0.044	0.043
⑤	グラウンド	土	0.125	0.063	0.111	0.061	0.099	0.049
⑥	グラウンド	舗装	0.068	0.046	0.040	0.055	0.037	0.045
⑦	グラウンド	土	0.057	0.039	0.052	0.033	0.027	0.034
⑧	グラウンド	土	0.092	0.062	0.065	0.083	0.072	0.067
⑨	グラウンド	舗装	0.048	0.056	0.043	0.060	0.048	0.040
⑩	グラウンド	土	0.045	0.047	0.040	0.058	0.052	0.068
⑪	グラウンド	舗装	0.067	0.058	0.056	0.055	0.036	0.046
⑫	グラウンド	土	0.054	0.048	0.050	0.040	0.041	0.057
⑬	グラウンド	土	0.101	0.049	0.076	0.056	0.086	0.048
平均			0.075	0.053	0.062	0.056	0.064	0.049

※1 環境省基準: 地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標: 地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
