


放射線量マップ【土中学校】

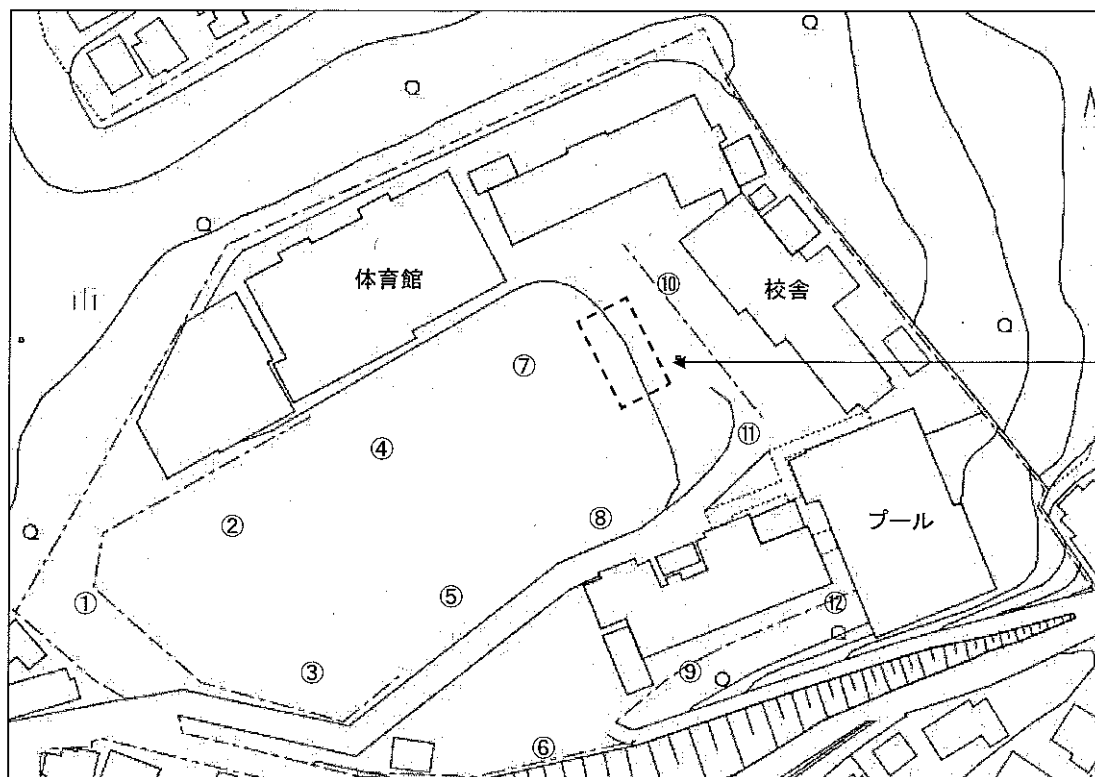

除去土壌埋設箇所

○除染完了日:平成24年11月29日

○測定日:平成26年5月8日(前回:平成26年2月19日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	舗装	0.099	0.094	0.088	0.088	0.088	0.097
②	グラウンド	土	0.076	0.070	0.063	0.088	0.054	0.065
③	グラウンド	土	0.087	0.082	0.127	0.063	0.064	0.061
④	グラウンド	土	0.082	0.075	0.084	0.083	0.064	0.094
⑤	グラウンド	土	0.100	0.077	0.069	0.070	0.069	0.091
⑥	グラウンド	土	0.079	0.076	0.088	0.081	0.073	0.090
⑦	グラウンド	土	0.086	0.063	0.073	0.086	0.077	0.083
⑧	グラウンド	土	0.107	0.084	0.086	0.081	0.088	0.089
⑨	校舎裏	土	0.091	0.092	0.070	0.069	0.055	0.068
⑩	グラウンド	土	0.116	0.079	0.087	0.106	0.085	0.115
⑪	グラウンド	土	0.080	0.082	0.076	0.073	0.079	0.088
⑫	校舎裏	土	0.081	0.064	0.137	0.053	0.067	0.059
平均			0.090	0.078	0.087	0.078	0.072	0.083

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
