


放射線量マップ【富勢中学校】

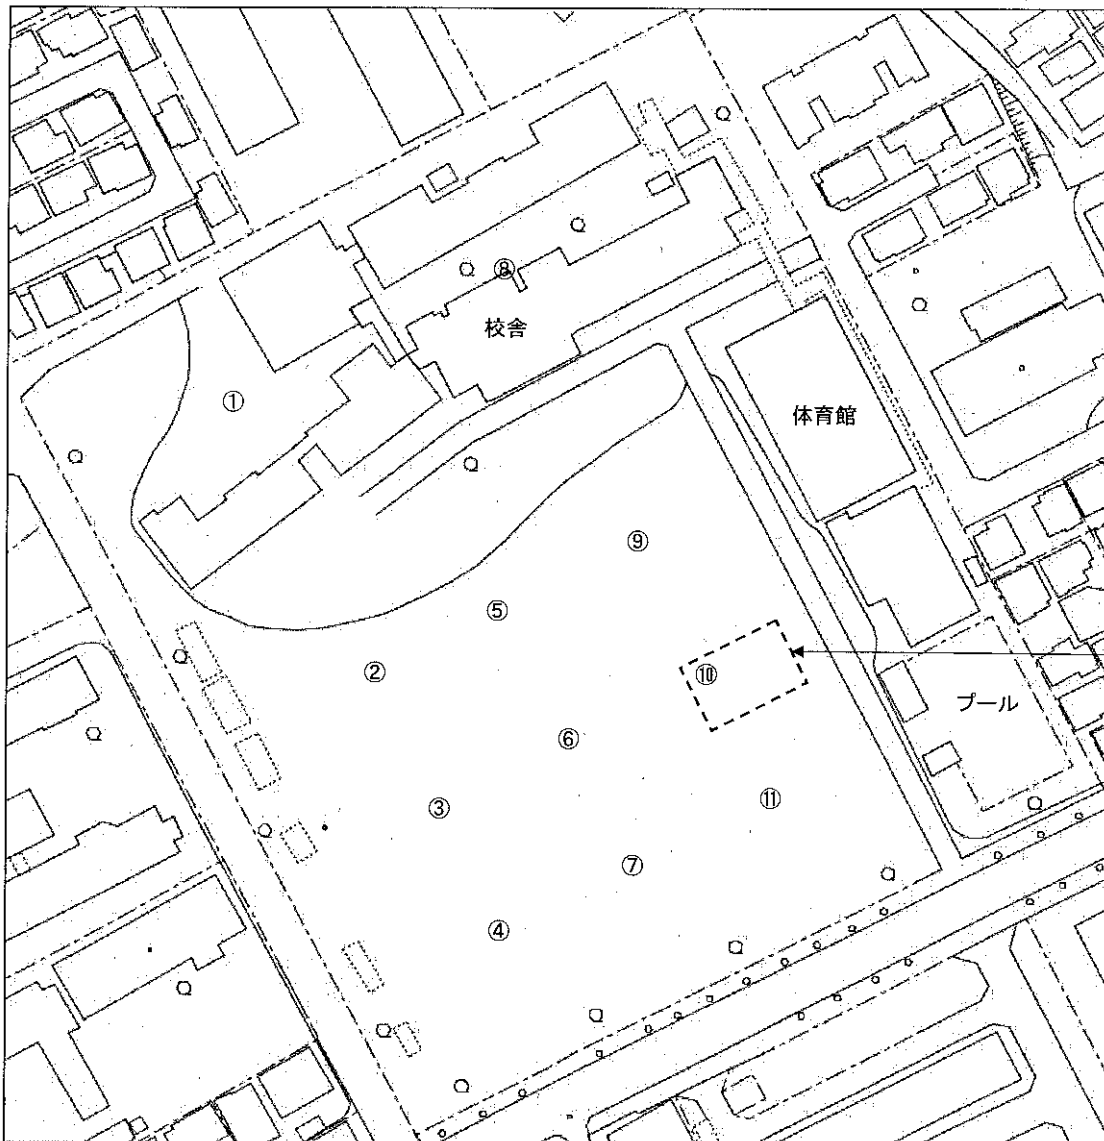

除去土壌埋設箇所

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成26年5月7日(前回:平成26年2月3日)

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	テニスコート	土	0.057	0.045	0.067	0.053	0.082	0.048
②	グラウンド	土	0.078	0.084	0.080	0.082	0.080	0.082
③	グラウンド	土	0.074	0.075	0.078	0.073	0.074	0.080
④	グラウンド	土	0.090	0.076	0.088	0.066	0.090	0.072
⑤	グラウンド	土	0.087	0.097	0.072	0.088	0.091	0.103
⑥	グラウンド	土	0.080	0.086	0.079	0.081	0.096	0.103
⑦	グラウンド	土	0.073	0.078	0.093	0.060	0.074	0.061
⑧	校舎裏	舗装	0.058	0.063	0.075	0.070	0.081	0.062
⑨	グラウンド	土	0.090	0.098	0.102	0.101	0.068	0.108
⑩	グラウンド	土	0.080	0.078	0.088	0.062	0.105	0.079
⑪	グラウンド	土	0.086	0.051	0.070	0.080	0.077	0.066
平均			0.078	0.076	0.081	0.074	0.083	0.079

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
