


放射線量マップ【酒井根中学校】

除去土壌
埋設箇所

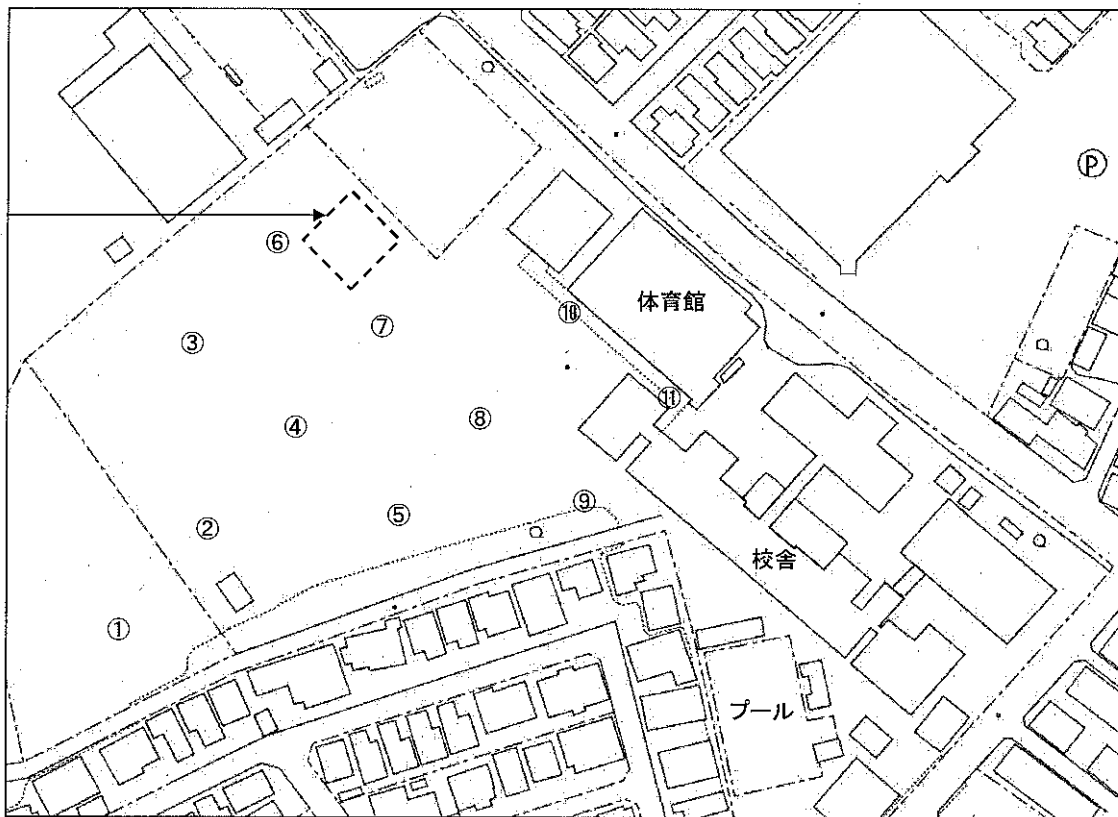

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成26年5月14日(前回:平成26年2月3日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.085	0.085	0.088	0.079	0.108	0.072
②	グラウンド	土	0.087	0.095	0.089	0.077	0.092	0.093
③	グラウンド	土	0.080	0.075	0.102	0.065	0.112	0.061
④	グラウンド	土	0.074	0.079	0.077	0.092	0.072	0.099
⑤	グラウンド	土	0.079	0.092	0.091	0.085	0.084	0.080
⑥	グラウンド	土	0.057	0.072	0.054	0.072	0.056	0.061
⑦	グラウンド	土	0.068	0.099	0.103	0.081	0.088	0.077
⑧	グラウンド	土	0.083	0.082	0.096	0.096	0.073	0.103
⑨	グラウンド	土	0.065	0.060	0.060	0.061	0.053	0.078
⑩	体育館前	土	0.061	0.075	0.071	0.065	0.066	0.062
⑪	体育館前	舗装	0.058	0.050	0.079	0.061	0.071	0.060
平均			0.072	0.079	0.083	0.076	0.080	0.077

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
