


放射線量マップ【西原中学校】

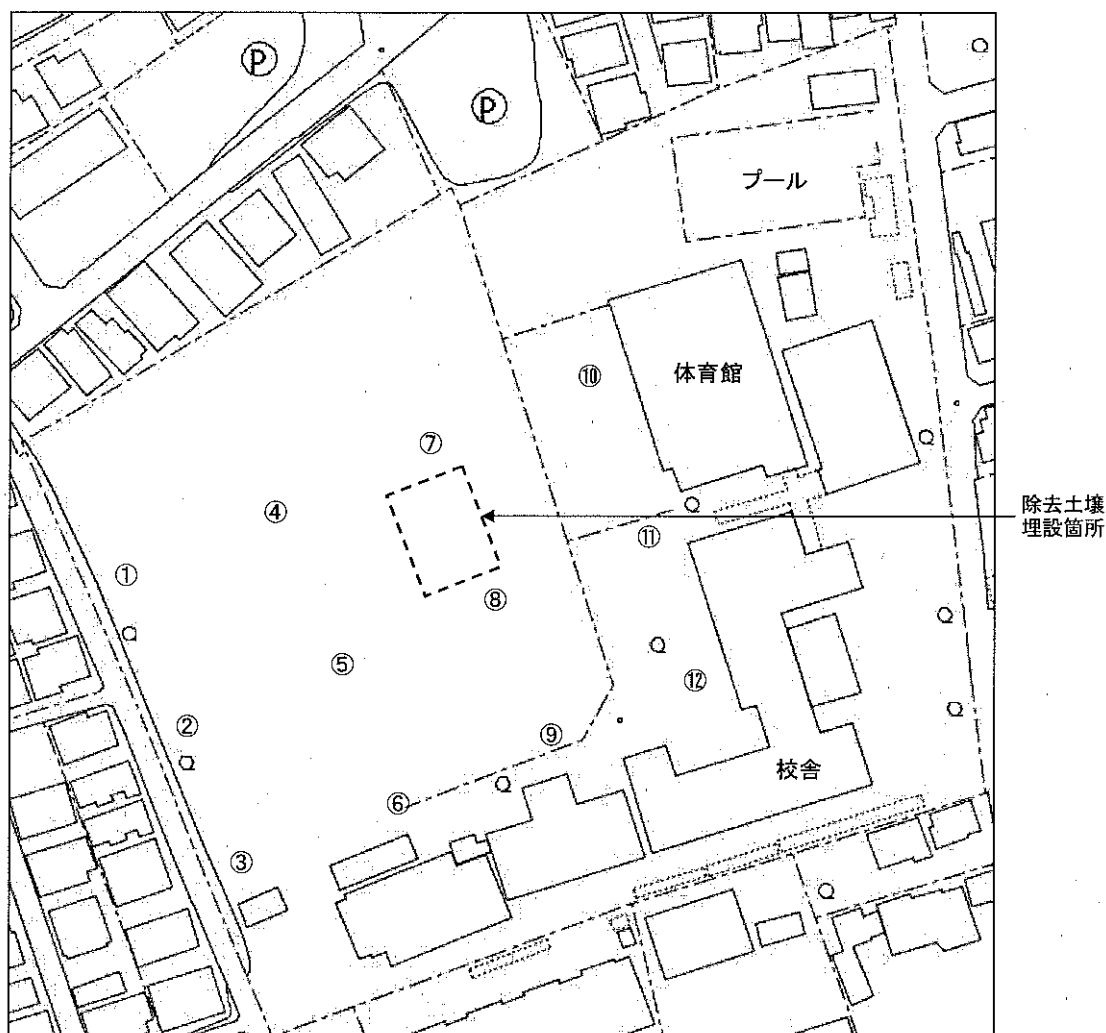

○除染完了日:平成24年11月29日

○測定日:平成26年5月14日(前回:平成26年2月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.115	0.098	0.120	0.111	0.093	0.114
②	グラウンド	土	0.119	0.088	0.127	0.138	0.109	0.102
③	グラウンド	土	0.084	0.105	0.104	0.118	0.081	0.095
④	グラウンド	土	0.092	0.095	0.100	0.087	0.076	0.082
⑤	グラウンド	土	0.111	0.092	0.120	0.113	0.121	0.110
⑥	グラウンド	土	0.079	0.086	0.091	0.104	0.072	0.108
⑦	グラウンド	土	0.072	0.084	0.109	0.078	0.086	0.088
⑧	グラウンド	土	0.104	0.101	0.105	0.102	0.098	0.119
⑨	グラウンド	土	0.093	0.075	0.118	0.099	0.094	0.094
⑩	テニスコート	土	0.048	0.037	0.048	0.047	0.042	0.050
⑪	グラウンド	土	0.042	0.071	0.063	0.083	0.057	0.050
⑫	校舎前	舗装	0.087	0.069	0.070	0.085	0.087	0.088
平均			0.087	0.083	0.098	0.097	0.085	0.092

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
