


放射線量マップ【市立柏高等学校】

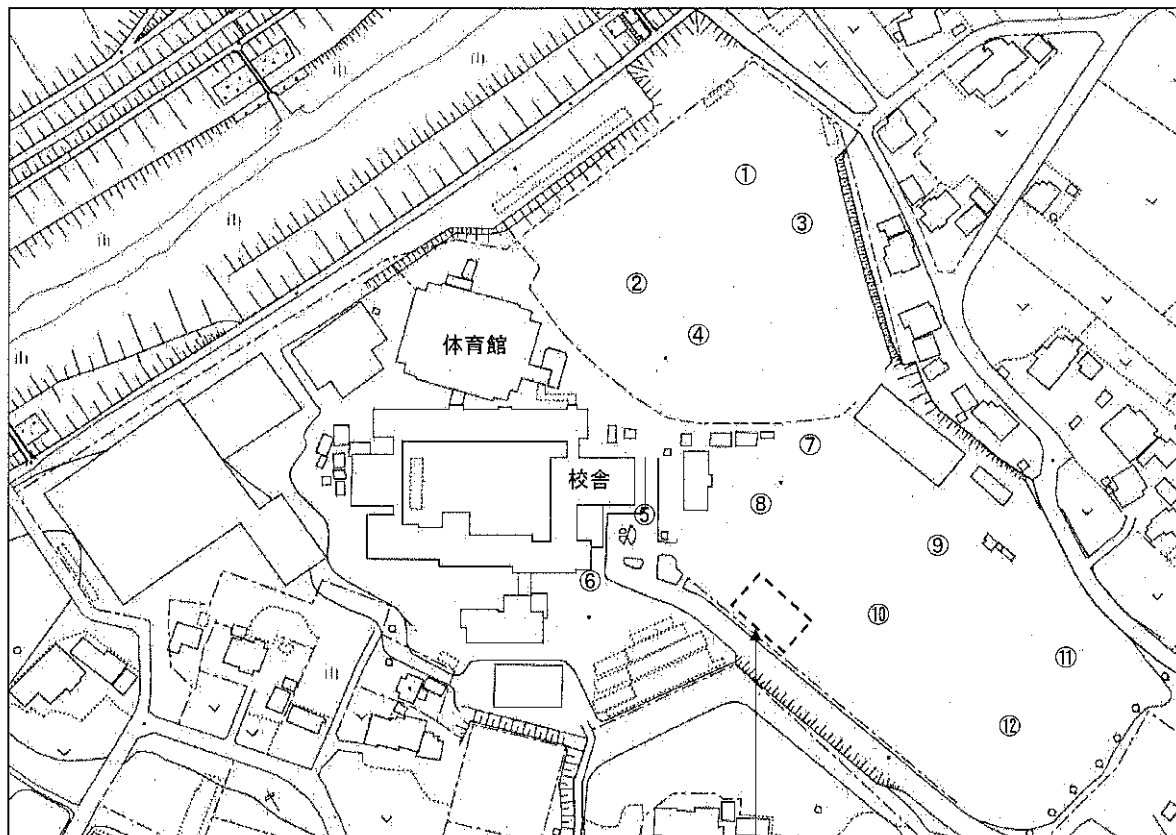

除去土壌
埋設箇所

○除染完了日:平成25年2月23日

○測定日:平成26年5月2日(前回:平成26年2月6日)

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	野球場	土	0.086	0.102	0.086	0.115	0.061	0.120
②	野球場	土	0.111	0.112	0.115	0.106	0.112	0.103
③	野球場	土	0.112	0.099	0.106	0.101	0.085	0.128
④	野球場	土	0.086	0.092	0.120	0.108	0.088	0.112
⑤	通路	舗装	0.119	0.070	0.105	0.091	0.092	0.066
⑥	通路	舗装	0.097	0.097	0.096	0.090	0.104	0.095
⑦	グラウンド	土	0.106	0.093	0.108	0.097	0.088	0.105
⑧	グラウンド	土	0.092	0.095	0.123	0.093	0.106	0.085
⑨	グラウンド	土	0.116	0.085	0.117	0.099	0.121	0.087
⑩	グラウンド	土	0.090	0.079	0.090	0.075	0.093	0.095
⑪	グラウンド	土	0.106	0.102	0.138	0.103	0.111	0.079
⑫	グラウンド	土	0.101	0.095	0.109	0.116	0.086	0.083
平均			0.102	0.093	0.109	0.100	0.096	0.097

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
