


放射線量マップ【土小学校】

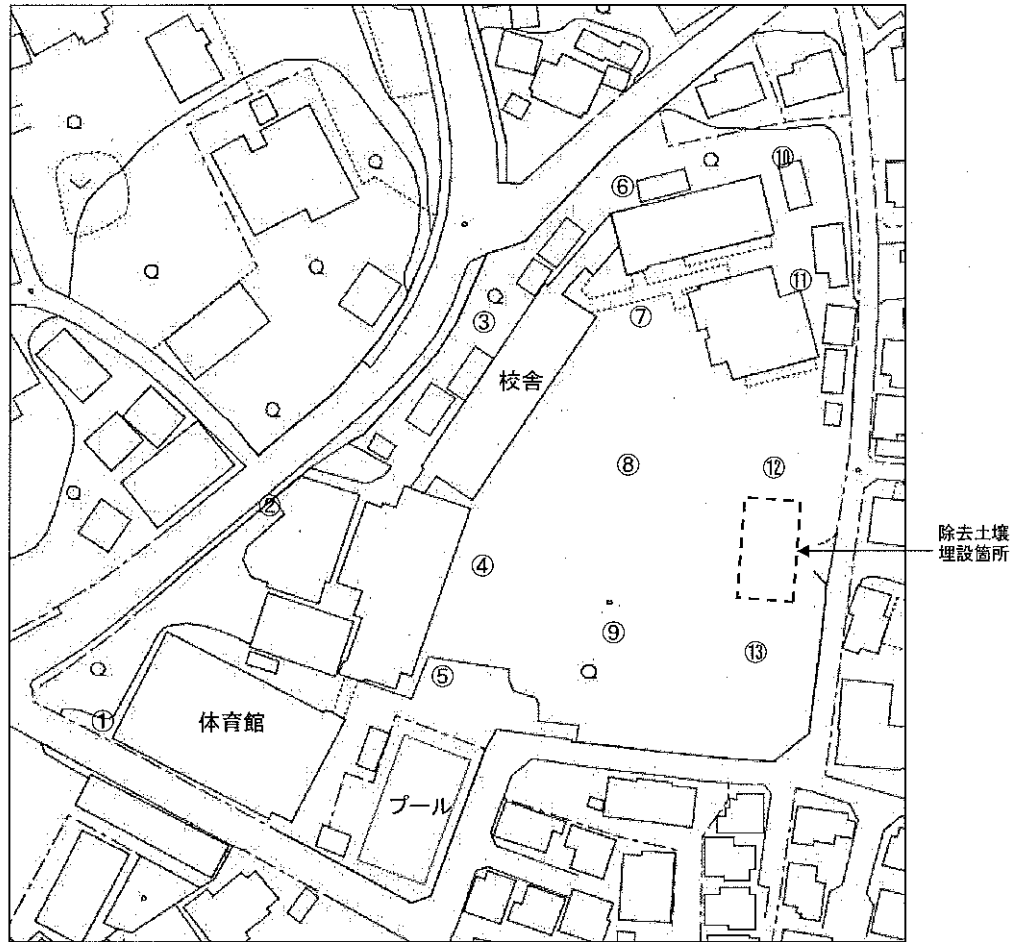

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成26年11月13日(前回:平成26年5月8日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館横	土	0.071	0.090	0.106	0.091	0.077	0.069
②	校舎前	アスファルト	0.073	0.068	0.070	0.068	0.067	0.092
③	校舎前	土	0.124	0.136	0.138	0.113	0.159	0.106
④	グラウンド	土	0.061	0.069	0.090	0.062	0.076	0.066
⑤	グラウンド	池横の芝	0.090	0.085	0.087	0.069	0.091	0.077
⑥	校舎裏	土	0.087	0.084	0.077	0.074	0.102	0.075
⑦	校舎前	土	0.063	0.118	0.078	0.125	0.086	0.182
⑧	グラウンド	土	0.045	0.045	0.042	0.044	0.048	0.035
⑨	グラウンド	土	0.071	0.087	0.077	0.071	0.080	0.062
⑩	グラウンド	土	0.090	0.105	0.095	0.081	0.082	0.090
⑪	校舎前	土	0.123	0.116	0.113	0.180	0.130	0.193
⑫	グラウンド	アスファルト	0.075	0.078	0.068	0.060	0.098	0.043
⑬	グラウンド	土	0.061	0.069	0.056	0.056	0.061	0.045
平均			0.080	0.088	0.084	0.084	0.089	0.087

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
