


放射線量マップ【柏第七小学校】

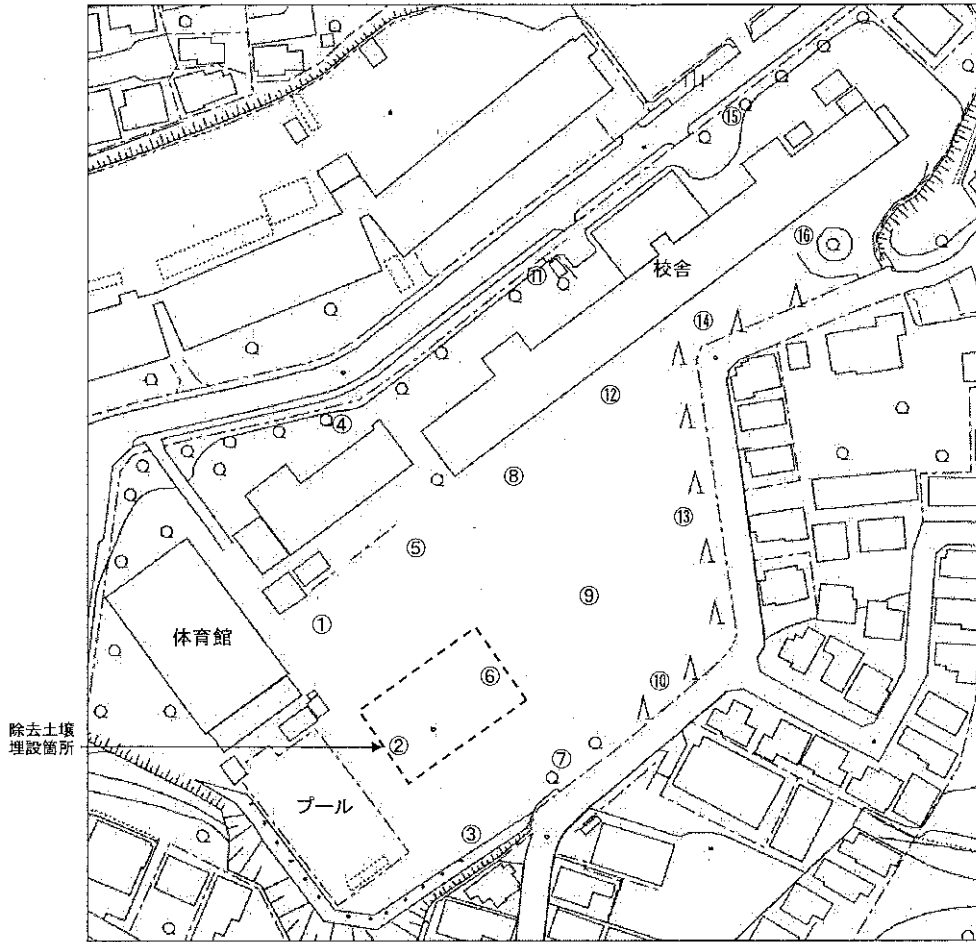

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成26年11月10日(前回:平成26年5月14日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.045	0.045	0.048	0.067	0.049	0.079
②	グラウンド	土	0.047	0.045	0.044	0.048	0.049	0.059
③	グラウンド	土	0.062	0.043	0.054	0.042	0.069	0.045
④	校舎裏	土	0.084	0.095	0.082	0.089	0.065	0.106
⑤	グラウンド	土	0.057	0.038	0.032	0.060	0.048	0.064
⑥	グラウンド	土	0.051	0.053	0.037	0.053	0.050	0.050
⑦	グラウンド	側溝	0.040	0.072	0.033	0.071	0.059	0.105
⑧	校舎前	アスファルト	0.046	0.053	0.037	0.069	0.058	0.076
⑨	グラウンド	土	0.043	0.048	0.031	0.063	0.067	0.084
⑩	グラウンド	土	0.047	0.047	0.038	0.042	0.048	0.054
⑪	校舎裏	土	0.099	0.082	0.093	0.106	0.072	0.082
⑫	校舎前	土	0.065	0.060	0.075	0.046	0.094	0.071
⑬	グラウンド	土	0.061	0.063	0.040	0.052	0.061	0.061
⑭	校舎前	アスファルト	0.072	0.086	0.079	0.099	0.087	0.113
⑮	校舎裏	土	0.080	0.080	0.079	0.099	0.064	0.083
⑯	校舎前	アスファルト	0.068	0.063	0.054	0.070	0.054	0.069
平均			0.060	0.061	0.054	0.067	0.062	0.075

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
