


放射線量マップ【西原小学校】

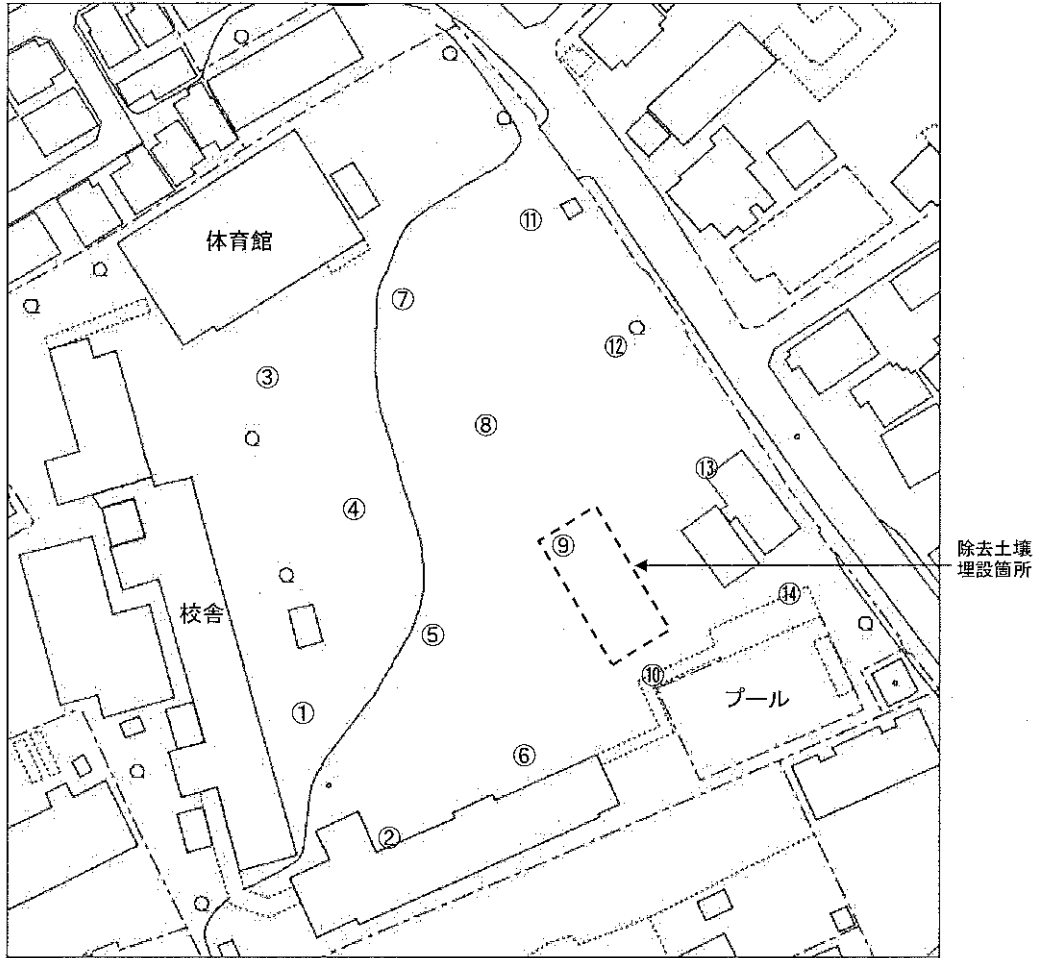

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成26年11月5日(前回:平成26年5月2日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.038	0.052	0.041	0.047	0.041	0.058
②	グラウンド	土	0.047	0.066	0.065	0.075	0.070	0.078
③	グラウンド	舗装	0.047	0.055	0.050	0.040	0.052	0.043
④	グラウンド	土	0.033	0.031	0.024	0.048	0.028	0.039
⑤	グラウンド	土	0.029	0.034	0.034	0.041	0.031	0.032
⑥	グラウンド	土	0.045	0.044	0.046	0.069	0.043	0.046
⑦	グラウンド	舗装	0.036	0.054	0.028	0.046	0.045	0.058
⑧	グラウンド	土	0.023	0.045	0.036	0.059	0.035	0.046
⑨	グラウンド	土	0.033	0.037	0.026	0.044	0.029	0.041
⑩	グラウンド	土	0.033	0.036	0.044	0.043	0.047	0.036
⑪	グラウンド	舗装	0.046	0.069	0.048	0.075	0.050	0.055
⑫	グラウンド	土	0.041	0.046	0.040	0.046	0.049	0.038
⑬	グラウンド	土	0.047	0.062	0.038	0.061	0.057	0.064
⑭	グラウンド	土	0.049	0.062	0.055	0.069	0.057	0.064
平均			0.039	0.050	0.041	0.055	0.045	0.050

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
