


放射線量マップ【中原小学校】

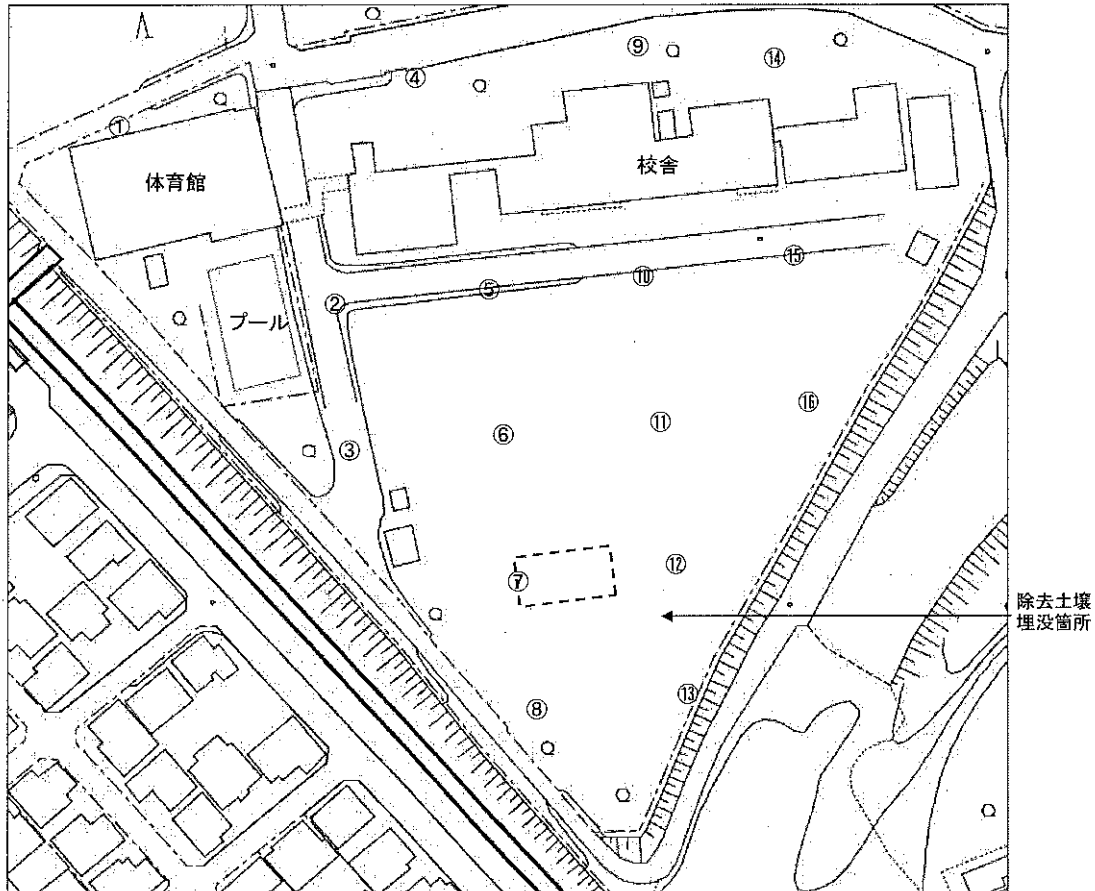

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成26年11月11日(前回:平成26年5月14日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館裏	土	0.075	0.082	0.074	0.103	0.139	0.140
②	グラウンド	土	0.060	0.060	0.042	0.075	0.050	0.075
③	グラウンド	土	0.040	0.058	0.042	0.052	0.044	0.051
④	校舎裏	土	0.068	0.060	0.051	0.068	0.065	0.065
⑤	校舎前	土	0.071	0.040	0.061	0.067	0.058	0.065
⑥	グラウンド	土	0.018	0.034	0.028	0.038	0.033	0.040
⑦	グラウンド	土	0.032	0.038	0.024	0.050	0.038	0.041
⑧	グラウンド	土	0.037	0.040	0.040	0.049	0.041	0.041
⑨	校舎裏	土	0.074	0.052	0.075	0.080	0.081	0.074
⑩	校舎前	土	0.040	0.047	0.038	0.050	0.032	0.044
⑪	グラウンド	土	0.030	0.042	0.037	0.036	0.037	0.033
⑫	グラウンド	土	0.033	0.038	0.044	0.018	0.032	0.045
⑬	グラウンド	土	0.037	0.050	0.047	0.053	0.037	0.068
⑭	校舎裏	土	0.061	0.051	0.052	0.066	0.058	0.056
⑮	校舎前	土	0.040	0.039	0.048	0.065	0.041	0.062
⑯	グラウンド	土	0.036	0.044	0.039	0.044	0.031	0.051
平均			0.047	0.048	0.046	0.057	0.051	0.059

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
