


放射線量マップ【柏第四中学校】

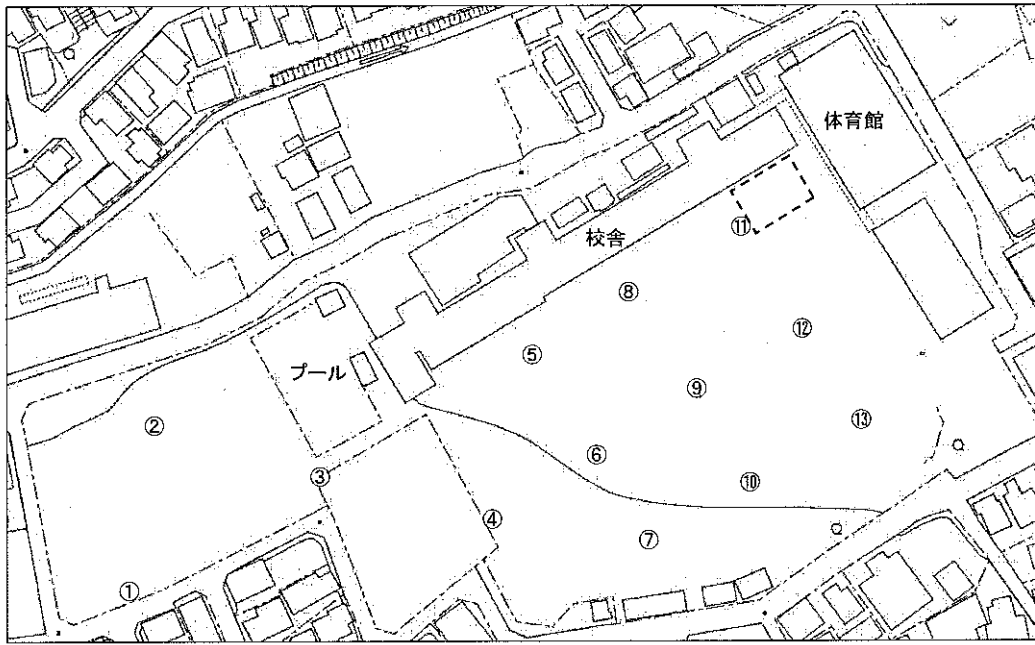

除去土壤埋設箇所

○除染完了日:平成24年11月29日

○測定日:平成26年11月5日(前回:平成26年5月16日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標		5cm	
			100cm		50cm		今回	前回
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.076	0.087	0.079	0.097	0.096	0.114
②	グラウンド	土	0.083	0.089	0.078	0.085	0.093	0.099
③	グラウンド	舗装	0.055	0.056	0.078	0.056	0.054	0.064
④	グラウンド	土	0.067	0.069	0.066	0.078	0.077	0.067
⑤	グラウンド	土	0.079	0.096	0.091	0.109	0.105	0.083
⑥	グラウンド	土	0.065	0.101	0.078	0.065	0.101	0.082
⑦	グラウンド	土	0.074	0.083	0.075	0.098	0.087	0.084
⑧	グラウンド	土	0.083	0.086	0.089	0.102	0.093	0.103
⑨	グラウンド	土	0.094	0.081	0.079	0.105	0.092	0.109
⑩	グラウンド	土	0.080	0.080	0.093	0.089	0.075	0.115
⑪	グラウンド	土	0.093	0.085	0.094	0.090	0.095	0.084
⑫	グラウンド	土	0.100	0.102	0.093	0.088	0.091	0.089
⑬	グラウンド	土	0.108	0.111	0.091	0.100	0.094	0.089
平均			0.081	0.087	0.083	0.089	0.089	0.091

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
