


放射線量マップ【酒井根中学校】

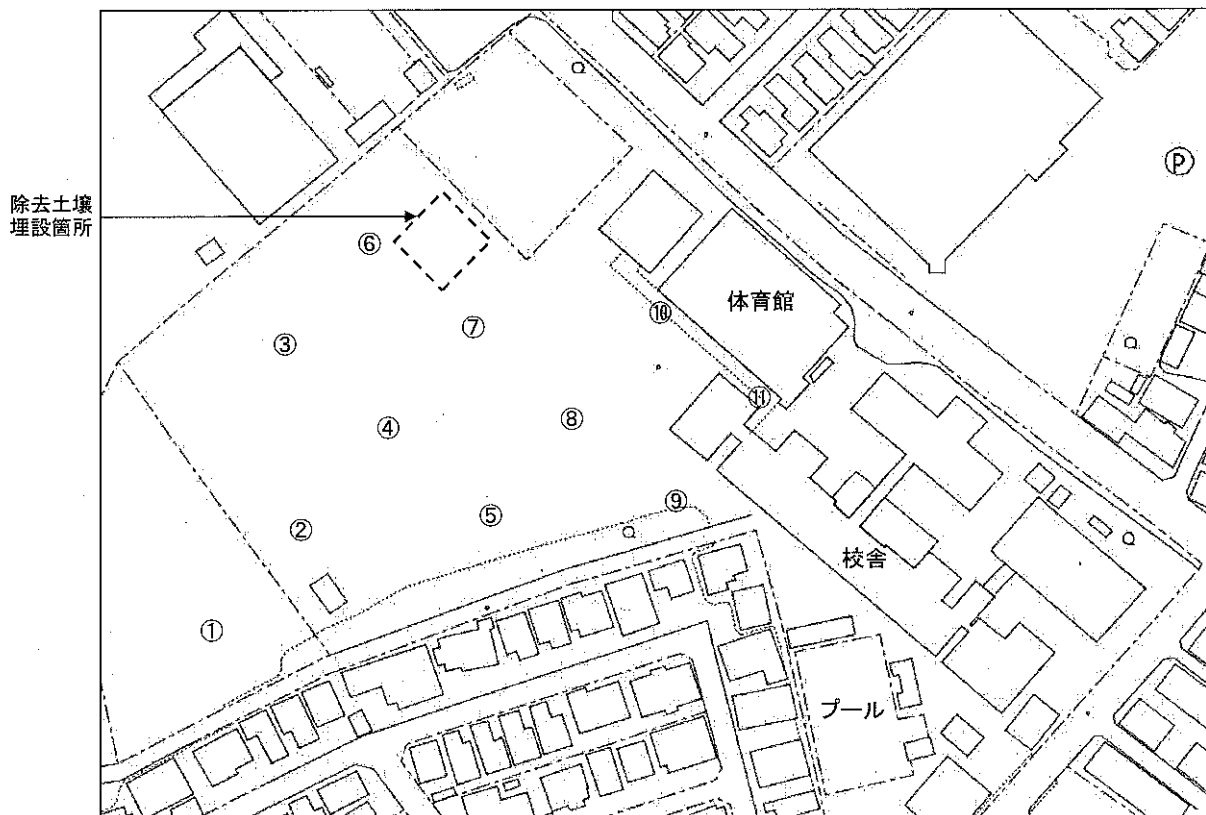

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成26年11月11日(前回:平成26年5月14日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.064	0.085	0.078	0.088	0.067	0.108
②	グラウンド	土	0.054	0.087	0.084	0.089	0.096	0.092
③	グラウンド	土	0.067	0.080	0.099	0.102	0.079	0.112
④	グラウンド	土	0.072	0.074	0.086	0.077	0.101	0.072
⑤	グラウンド	土	0.067	0.079	0.099	0.091	0.074	0.084
⑥	グラウンド	土	0.041	0.057	0.035	0.054	0.043	0.056
⑦	グラウンド	土	0.084	0.068	0.078	0.103	0.090	0.088
⑧	グラウンド	土	0.078	0.083	0.072	0.096	0.076	0.073
⑨	グラウンド	土	0.047	0.065	0.045	0.060	0.065	0.053
⑩	体育館前	土	0.064	0.061	0.067	0.071	0.082	0.066
⑪	体育館前	舗装	0.069	0.058	0.048	0.079	0.065	0.071
平均			0.064	0.072	0.072	0.083	0.076	0.080

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
