


放射線量マップ【風早中学校】

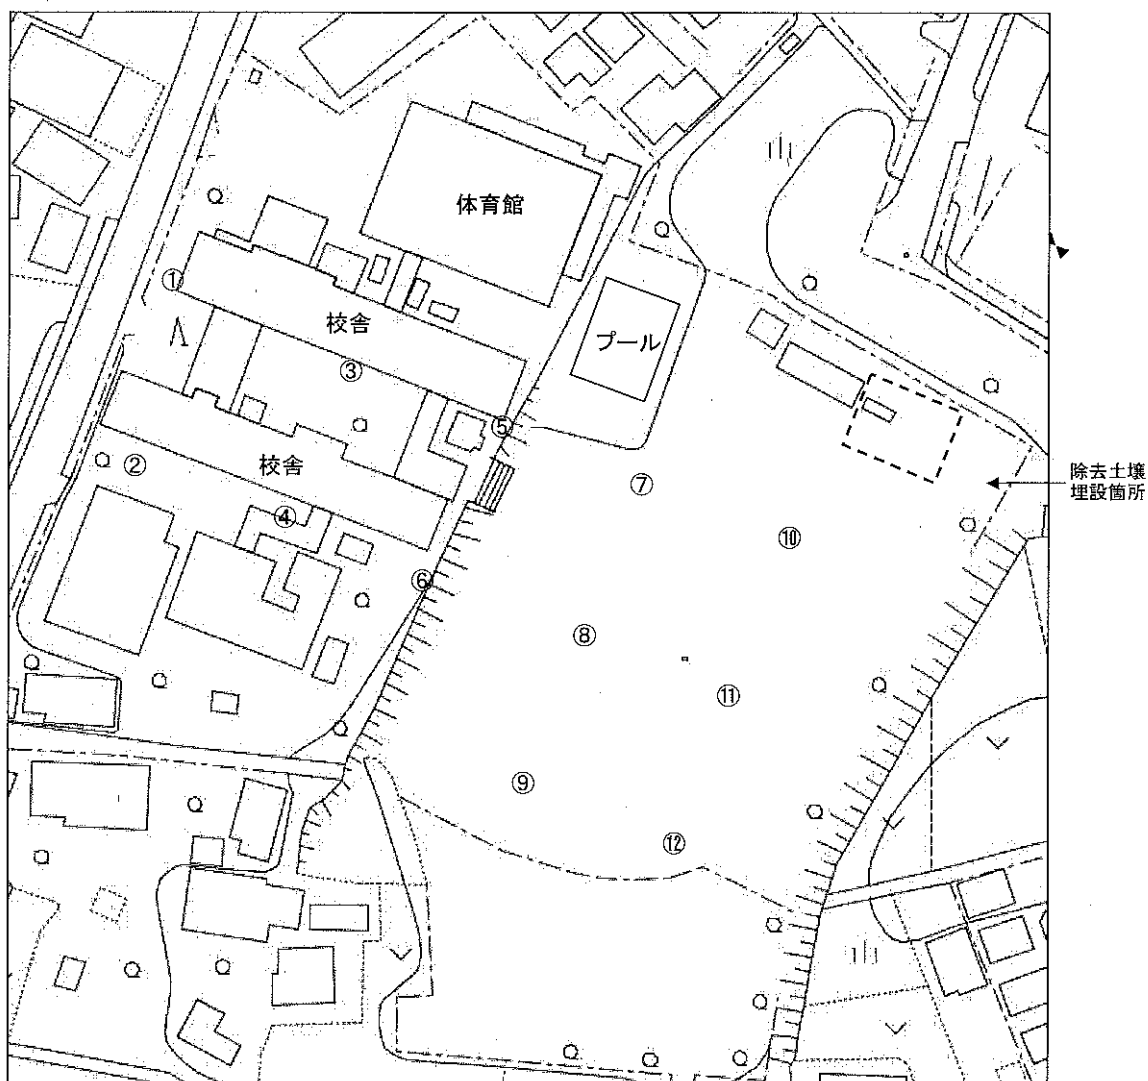

○除染完了日:平成24年11月29日

○測定日:平成26年11月7日(前回:平成26年5月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |    | ※1環境省基準 |       | ※2柏市目標 |       |       |       |
|------|-------|----|---------|-------|--------|-------|-------|-------|
|      |       |    | 100cm   |       | 50cm   |       | 5cm   |       |
|      |       |    | 今回      | 前回    | 今回     | 前回    | 今回    | 前回    |
| ①    | 校舎横   | 土  | 0.096   | 0.098 | 0.120  | 0.142 | 0.114 | 0.084 |
| ②    | 校舎前   | 土  | 0.073   | 0.074 | 0.088  | 0.115 | 0.095 | 0.090 |
| ③    | 校舎前   | 土  | 0.067   | 0.055 | 0.058  | 0.055 | 0.056 | 0.047 |
| ④    | 校舎前   | 土  | 0.072   | 0.085 | 0.081  | 0.098 | 0.081 | 0.075 |
| ⑤    | 校舎横   | 土  | 0.108   | 0.114 | 0.135  | 0.171 | 0.166 | 0.187 |
| ⑥    | 校舎横   | 舗装 | 0.122   | 0.097 | 0.148  | 0.115 | 0.134 | 0.081 |
| ⑦    | グラウンド | 土  | 0.091   | 0.088 | 0.092  | 0.115 | 0.106 | 0.097 |
| ⑧    | グラウンド | 土  | 0.084   | 0.107 | 0.090  | 0.095 | 0.088 | 0.080 |
| ⑨    | グラウンド | 土  | 0.095   | 0.066 | 0.085  | 0.104 | 0.082 | 0.078 |
| ⑩    | グラウンド | 土  | 0.089   | 0.075 | 0.100  | 0.087 | 0.091 | 0.067 |
| ⑪    | グラウンド | 土  | 0.107   | 0.092 | 0.135  | 0.146 | 0.164 | 0.111 |
| ⑫    | グラウンド | 土  | 0.067   | 0.059 | 0.076  | 0.116 | 0.096 | 0.092 |
| 平均   |       |    | 0.089   | 0.084 | 0.101  | 0.113 | 0.106 | 0.091 |

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
