


放射線量マップ【柏第六小学校】

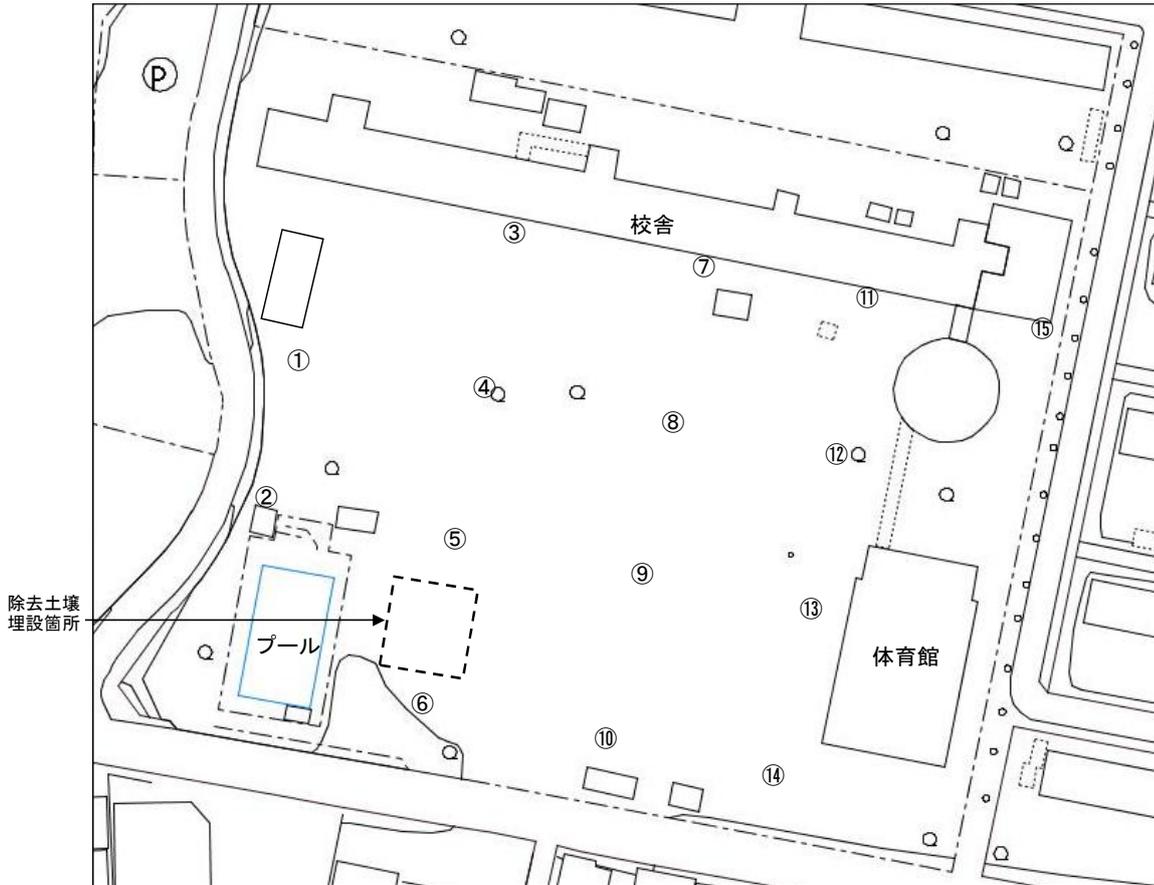

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成27年5月11日(前回:平成26年11月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	こどもルーム前	土	0.059	0.062	0.057	0.082	0.076	0.052
②	プール横	土	0.077	0.075	0.105	0.100	0.109	0.119
③	校舎前	土	0.076	0.061	0.073	0.072	0.138	0.073
④	グラウンド	土	0.064	0.093	0.057	0.097	0.061	0.070
⑤	グラウンド	土	0.044	0.033	0.055	0.035	0.052	0.041
⑥	グラウンド	土	0.041	0.036	0.045	0.033	0.058	0.031
⑦	校舎前	土	0.054	0.054	0.060	0.070	0.063	0.047
⑧	グラウンド	土	0.082	0.095	0.082	0.098	0.067	0.090
⑨	グラウンド	土	0.026	0.041	0.038	0.033	0.026	0.025
⑩	グラウンド	土	0.069	0.044	0.069	0.049	0.043	0.042
⑪	校舎前	アスファルト	0.080	0.089	0.065	0.070	0.069	0.081
⑫	グラウンド	土	0.094	0.070	0.134	0.085	0.085	0.092
⑬	グラウンド	土	0.063	0.054	0.064	0.056	0.046	0.078
⑭	グラウンド	土	0.057	0.061	0.067	0.066	0.078	0.061
⑮	校舎前	アスファルト	0.111	0.106	0.116	0.109	0.098	0.097
平均			0.066	0.065	0.072	0.070	0.071	0.067

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
