


放射線量マップ【風早北部小学校】

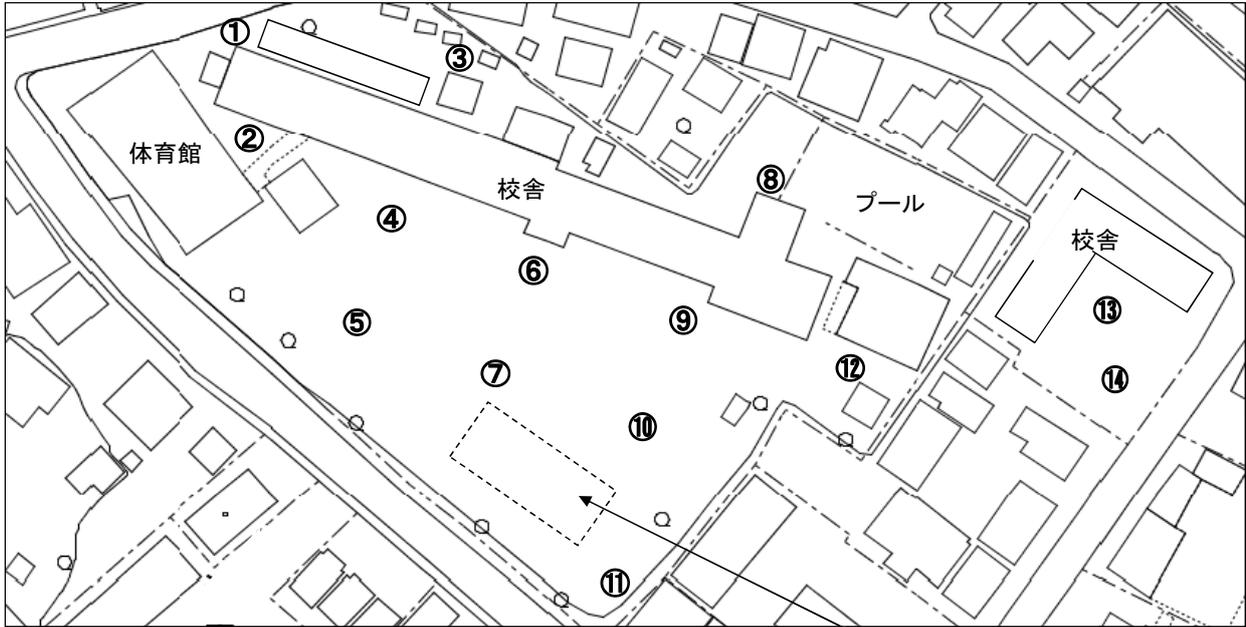

除去土壌
埋設箇所

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成27年5月15日(前回:平成26年11月4日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.048	0.047	0.050	0.059	0.050	0.058
②	校舎前	土	0.063	0.077	0.089	0.102	0.091	0.142
③	校舎裏	舗装	0.053	0.060	0.069	0.080	0.066	0.071
④	校舎前	土	0.043	0.047	0.065	0.060	0.062	0.082
⑤	グラウンド	土	0.033	0.037	0.058	0.032	0.038	0.040
⑥	校舎前	土	0.055	0.050	0.058	0.046	0.058	0.048
⑦	グラウンド	土	0.034	0.034	0.048	0.050	0.043	0.049
⑧	校舎裏	舗装	0.063	0.064	0.083	0.088	0.110	0.081
⑨	校舎前	土	0.047	0.048	0.056	0.087	0.056	0.071
⑩	グラウンド	土	0.046	0.040	0.054	0.046	0.046	0.053
⑪	グラウンド	側溝	0.058	0.063	0.085	0.063	0.040	0.053
⑫	校舎前	土	0.067	0.062	0.064	0.081	0.063	0.109
⑬	グラウンド	人工芝	0.054	0.062	0.062	0.062	0.059	0.085
⑭	グラウンド	人工芝	0.045	0.060	0.063	0.050	0.063	0.057
平均			0.051	0.054	0.065	0.065	0.060	0.071

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
