


放射線量マップ【手賀西小学校】

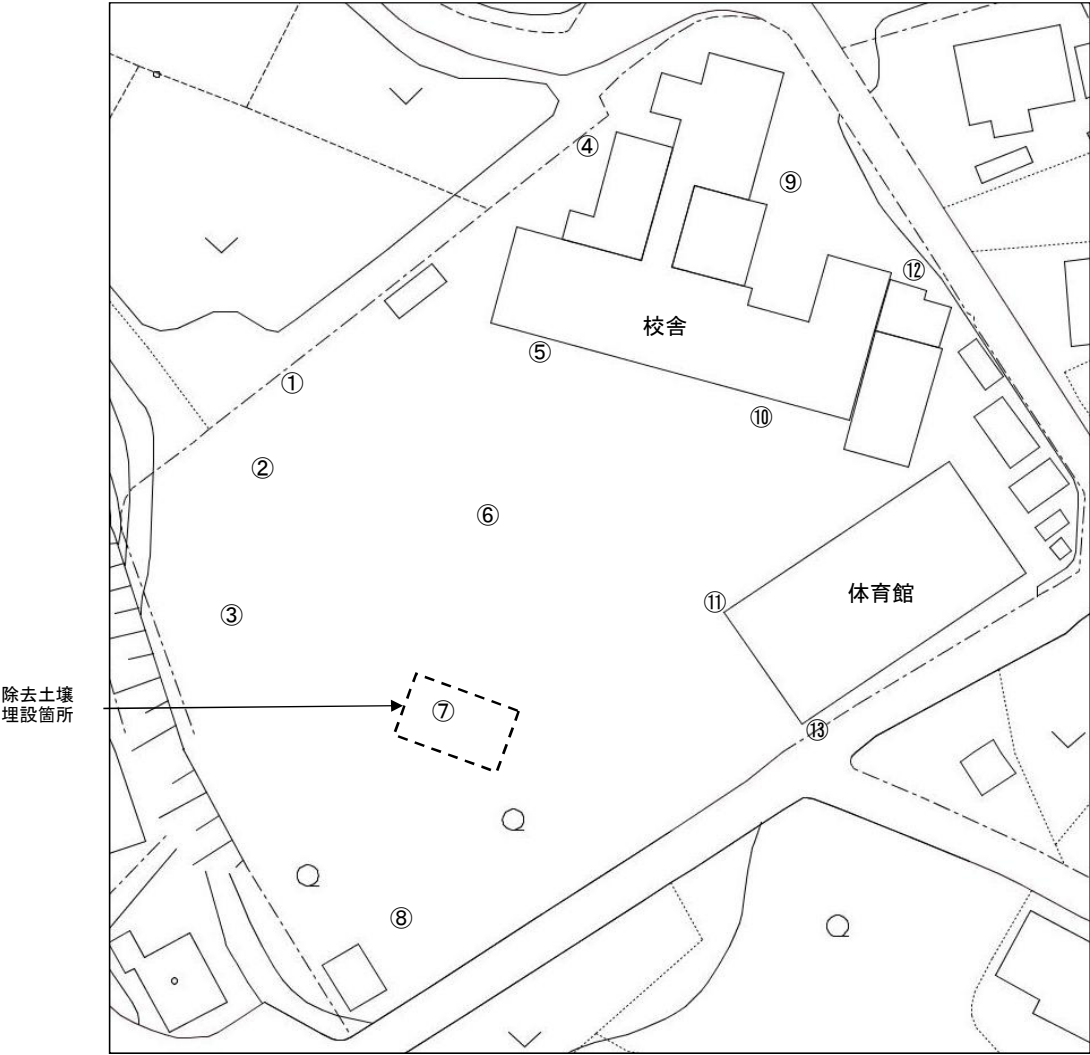

○除染完了日:平成24年6月28日
○測定日:平成27年5月7日(前回:平成26年11月4日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.039	0.050	0.051	0.056	0.044	0.042
②	グラウンド	土	0.028	0.047	0.045	0.054	0.039	0.053
③	グラウンド	土	0.033	0.038	0.045	0.047	0.047	0.050
④	校舎裏	舗装	0.072	0.063	0.069	0.085	0.066	0.072
⑤	校舎前	土	0.044	0.059	0.052	0.047	0.059	0.055
⑥	グラウンド	土	0.043	0.042	0.047	0.062	0.039	0.050
⑦	グラウンド	土	0.032	0.044	0.033	0.051	0.033	0.053
⑧	グラウンド	土	0.043	0.051	0.040	0.051	0.053	0.051
⑨	校舎裏	舗装	0.060	0.069	0.075	0.075	0.065	0.077
⑩	グラウンド	土	0.039	0.052	0.070	0.070	0.055	0.057
⑪	グラウンド	舗装	0.057	0.076	0.060	0.081	0.070	0.079
⑫	校舎裏	側溝	0.070	0.104	0.102	0.088	0.108	0.111
⑬	体育館前	側溝	0.076	0.075	0.077	0.085	0.081	0.088
平均			0.049	0.059	0.059	0.066	0.058	0.064

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
