


放射線量マップ【手賀東小学校】

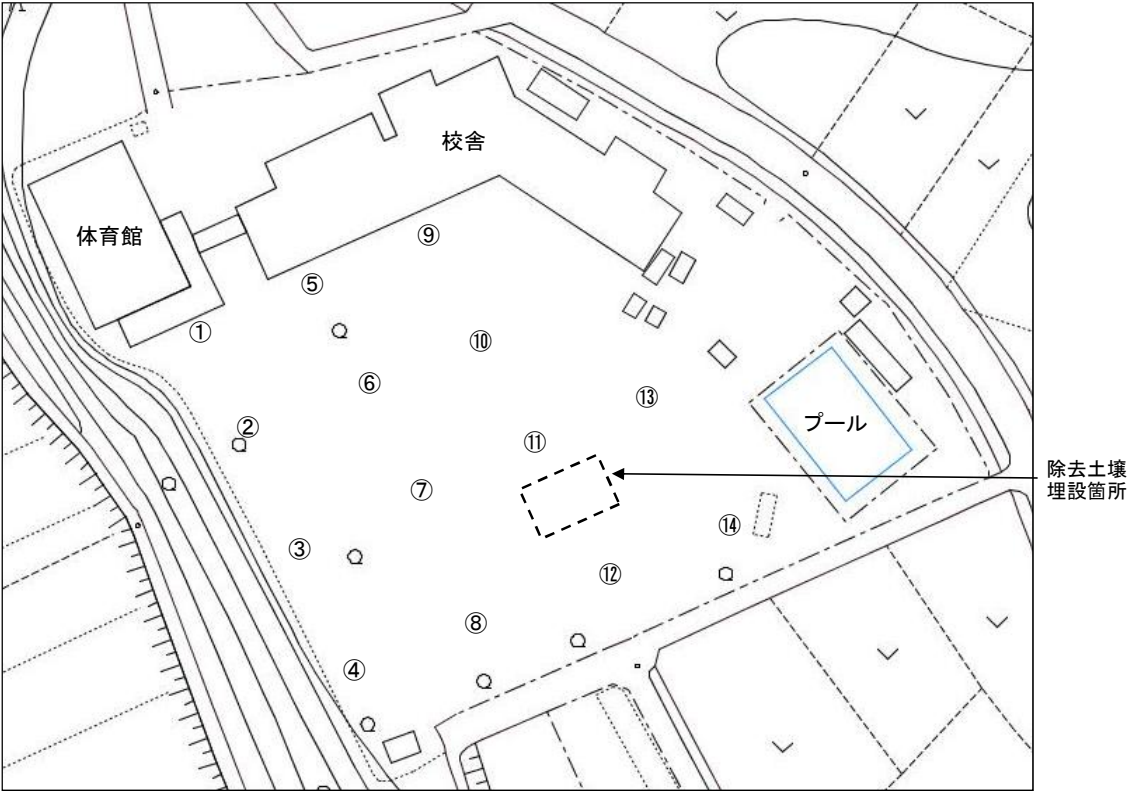

○除染完了日:平成24年6月28日
○測定日:平成27年5月7日(前回:平成26年11月4日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.065	0.075	0.084	0.070	0.071	0.079
②	グラウンド	土	0.062	0.046	0.084	0.062	0.088	0.049
③	グラウンド	土	0.055	0.079	0.085	0.095	0.102	0.102
④	グラウンド	土	0.069	0.071	0.116	0.062	0.125	0.065
⑤	グラウンド	舗装	0.065	0.051	0.067	0.061	0.071	0.065
⑥	グラウンド	土	0.045	0.045	0.058	0.049	0.041	0.031
⑦	グラウンド	土	0.028	0.042	0.041	0.039	0.030	0.048
⑧	グラウンド	土	0.049	0.046	0.042	0.060	0.058	0.059
⑨	グラウンド	舗装	0.062	0.069	0.064	0.084	0.055	0.079
⑩	グラウンド	土	0.028	0.045	0.032	0.037	0.052	0.042
⑪	グラウンド	土	0.029	0.035	0.032	0.032	0.018	0.045
⑫	グラウンド	土	0.037	0.037	0.038	0.051	0.044	0.053
⑬	グラウンド	土	0.042	0.042	0.026	0.036	0.047	0.045
⑭	グラウンド	土	0.041	0.046	0.062	0.047	0.063	0.043
平均			0.048	0.052	0.059	0.055	0.062	0.058

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
