


放射線量マップ【大津ヶ丘第二小学校】

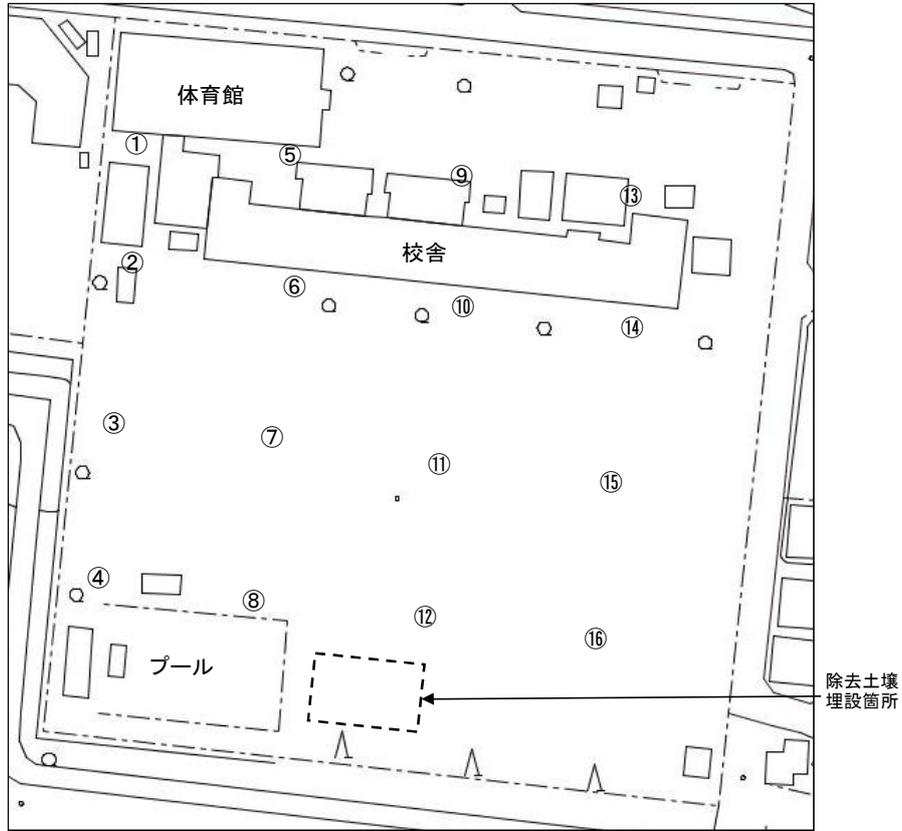

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成27年5月12日(前回:平成26年11月6日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.072	0.079	0.065	0.075	0.075	0.068
②	グラウンド	土	0.053	0.065	0.069	0.055	0.052	0.058
③	グラウンド	土	0.084	0.064	0.082	0.042	0.065	0.041
④	グラウンド	土	0.072	0.058	0.075	0.069	0.054	0.055
⑤	校舎裏	舗装	0.079	0.077	0.080	0.080	0.083	0.092
⑥	グラウンド	土	0.057	0.048	0.060	0.058	0.043	0.051
⑦	グラウンド	土	0.026	0.045	0.038	0.040	0.029	0.043
⑧	グラウンド	土	0.055	0.061	0.055	0.057	0.062	0.071
⑨	校舎裏	舗装	0.091	0.093	0.092	0.110	0.099	0.128
⑩	グラウンド	土	0.059	0.066	0.064	0.069	0.060	0.049
⑪	グラウンド	土	0.058	0.046	0.051	0.038	0.032	0.049
⑫	グラウンド	土	0.038	0.044	0.071	0.045	0.036	0.056
⑬	校舎裏	土	0.085	0.091	0.124	0.096	0.077	0.099
⑭	グラウンド	土	0.053	0.050	0.071	0.064	0.053	0.044
⑮	グラウンド	土	0.077	0.055	0.064	0.074	0.057	0.065
⑯	グラウンド	土	0.037	0.035	0.049	0.041	0.025	0.038
平均			0.062	0.061	0.069	0.063	0.056	0.063

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
