


放射線量マップ【柏第五中学校】

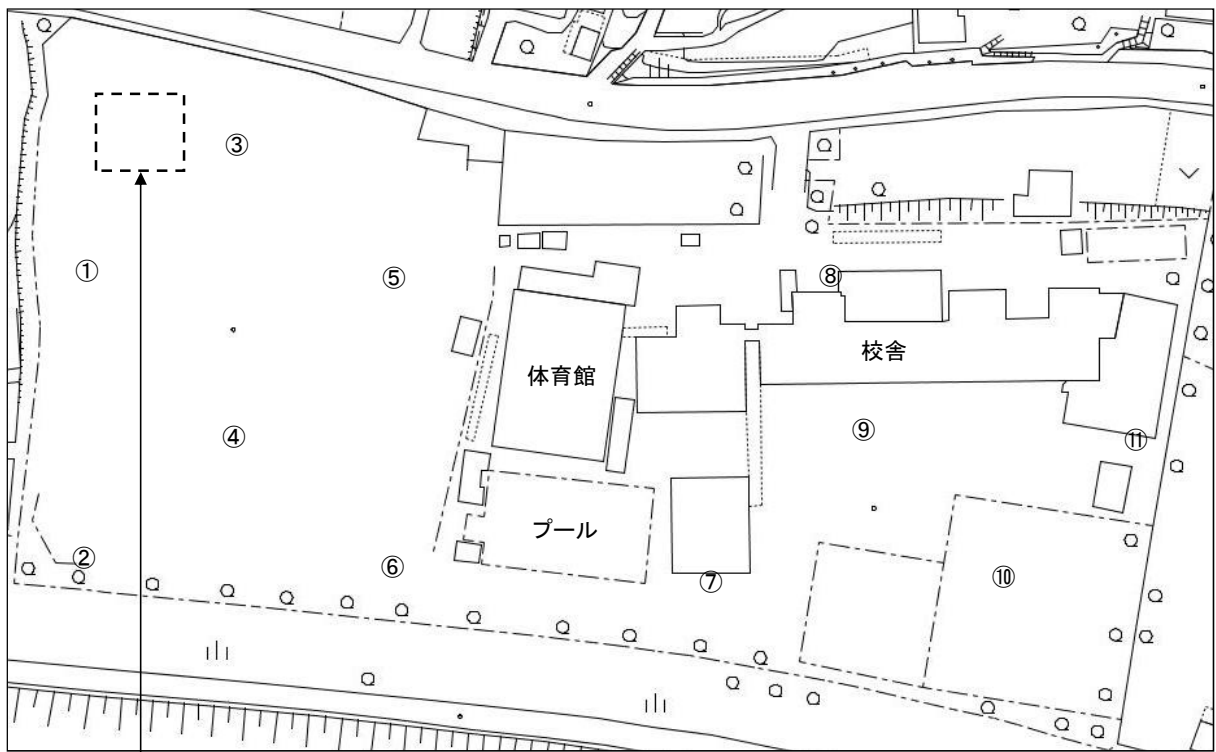

除去土壌
埋設箇所

○除染完了日:平成24年11月29日
○測定日:平成27年5月14日(前回:平成26年11月10日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.091	0.102	0.114	0.090	0.093	0.096
②	グラウンド	土	0.089	0.099	0.102	0.086	0.090	0.102
③	グラウンド	土	0.076	0.075	0.091	0.086	0.083	0.099
④	グラウンド	土	0.092	0.083	0.101	0.083	0.099	0.082
⑤	グラウンド	土	0.078	0.073	0.096	0.068	0.090	0.106
⑥	グラウンド	土	0.084	0.093	0.085	0.094	0.079	0.084
⑦	武道場前	土	0.105	0.102	0.120	0.124	0.115	0.128
⑧	校舎前	土	0.099	0.077	0.088	0.103	0.095	0.084
⑨	グラウンド	土	0.078	0.087	0.088	0.077	0.008	0.056
⑩	テニスコート	土	0.058	0.049	0.071	0.048	0.066	0.031
⑪	給食室裏	土	0.082	0.080	0.103	0.080	0.088	0.063
平均			0.085	0.084	0.096	0.085	0.082	0.085

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
※測定箇所①については、平成26年11月28日に測定
