


放射線量マップ【手賀西小学校】

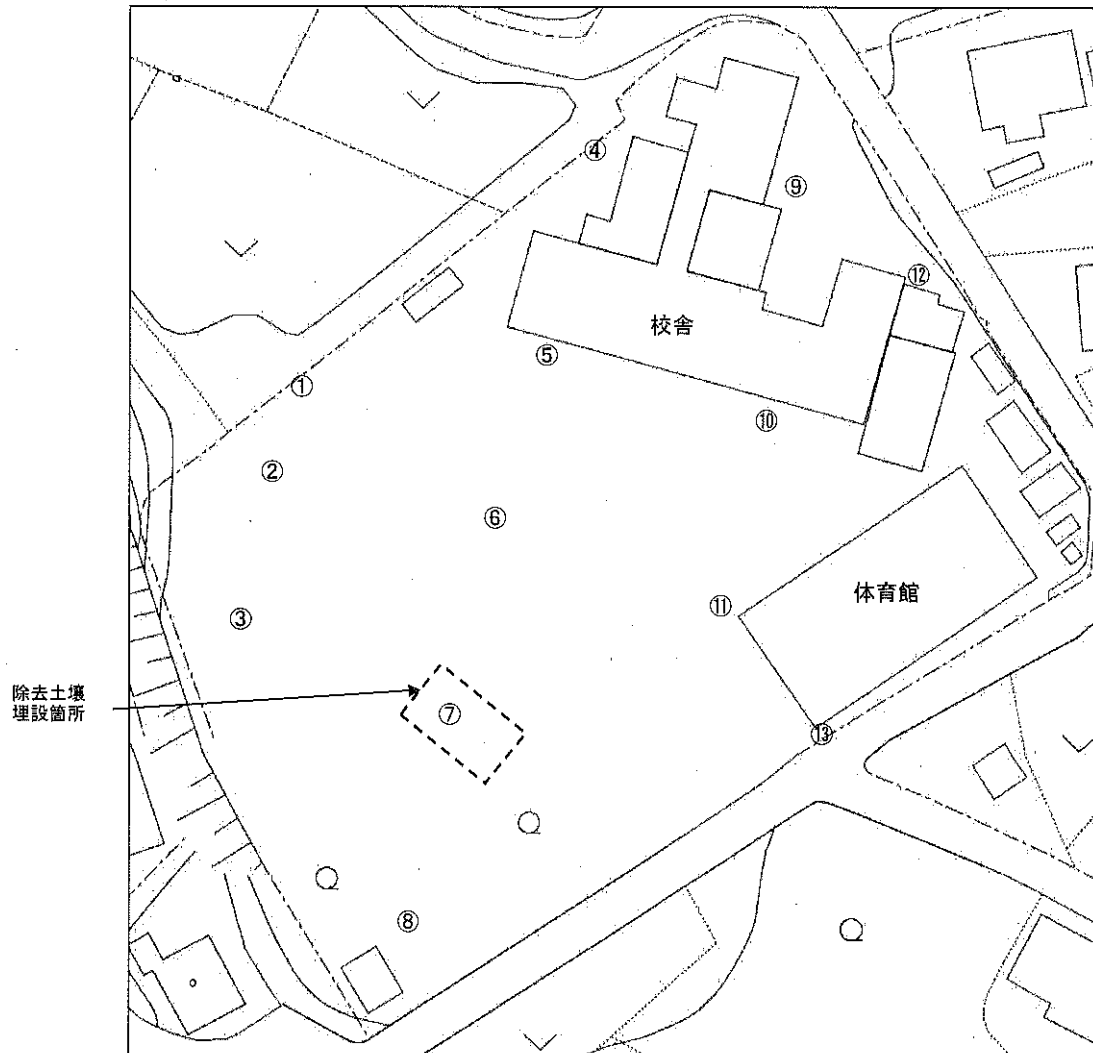

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成27年11月4日(前回:平成27年5月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.047	0.039	0.050	0.051	0.029	0.044
②	グラウンド	土	0.034	0.028	0.033	0.045	0.033	0.039
③	グラウンド	土	0.034	0.033	0.033	0.045	0.019	0.047
④	校舎裏	舗装	0.055	0.072	0.074	0.069	0.071	0.066
⑤	校舎前	土	0.057	0.044	0.070	0.052	0.060	0.059
⑥	グラウンド	土	0.049	0.043	0.050	0.047	0.032	0.039
⑦	グラウンド	土	0.037	0.032	0.036	0.033	0.032	0.033
⑧	グラウンド	土	0.055	0.043	0.050	0.040	0.024	0.053
⑨	校舎裏	舗装	0.053	0.060	0.072	0.075	0.055	0.065
⑩	グラウンド	土	0.077	0.039	0.063	0.070	0.054	0.055
⑪	グラウンド	舗装	0.076	0.057	0.060	0.060	0.051	0.070
⑫	校舎裏	側溝	0.072	0.070	0.089	0.102	0.073	0.108
⑬	体育館前	側溝	0.059	0.076	0.068	0.077	0.070	0.081
平均			0.054	0.049	0.058	0.059	0.046	0.058

※1環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
