


放射線量マップ【高柳中学校】

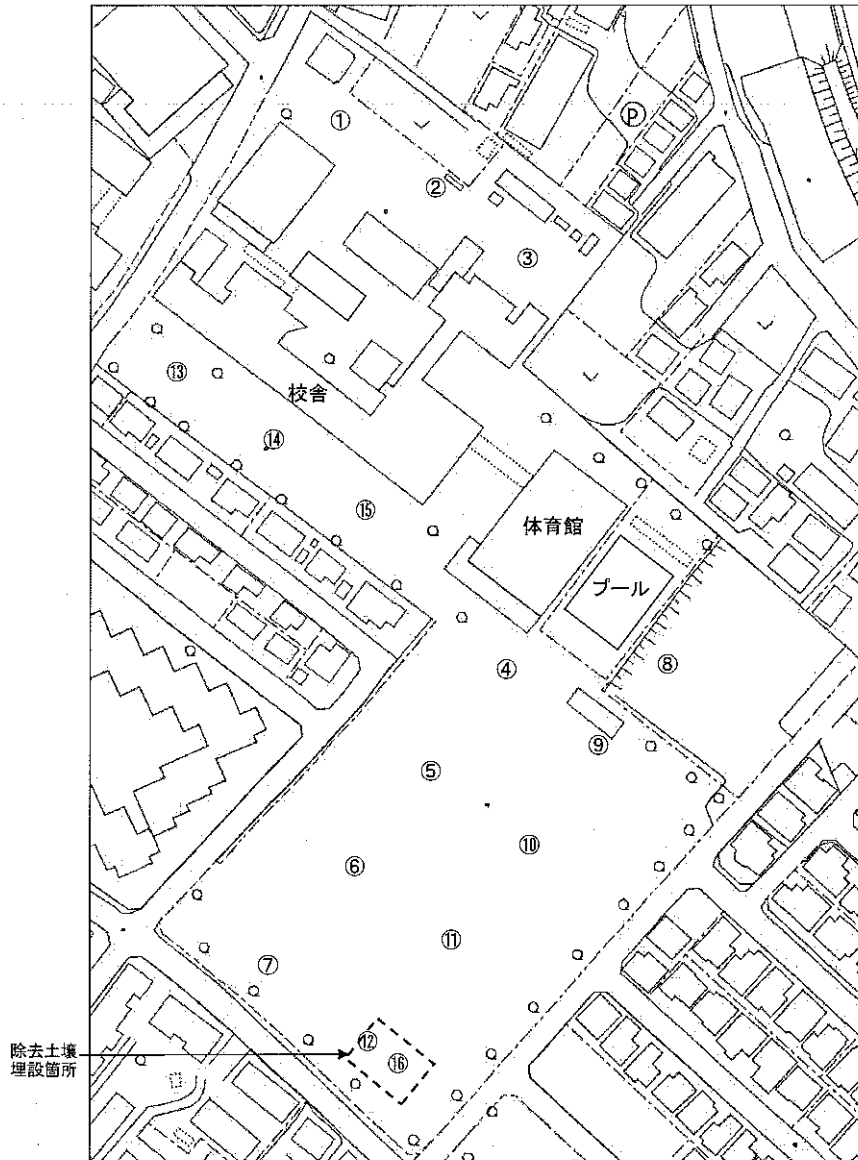

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成27年11月4日(前回:平成27年5月8日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	通路	舗装	0.051	0.060	0.049	0.069	0.049	0.043
②	通路	舗装	0.044	0.064	0.054	0.080	0.049	0.049
③	通路	舗装	0.060	0.069	0.065	0.084	0.046	0.069
④	グラウンド	土	0.049	0.051	0.042	0.044	0.038	0.043
⑤	グラウンド	土	0.064	0.052	0.049	0.072	0.057	0.048
⑥	グラウンド	土	0.066	0.065	0.061	0.073	0.054	0.061
⑦	グラウンド	土	0.050	0.056	0.045	0.062	0.037	0.046
⑧	グラウンド	土	0.074	0.072	0.072	0.078	0.073	0.067
⑨	グラウンド	土	0.067	0.056	0.056	0.059	0.037	0.060
⑩	グラウンド	土	0.081	0.065	0.073	0.080	0.054	0.051
⑪	グラウンド	土	0.056	0.067	0.055	0.078	0.042	0.061
⑫	グラウンド	土	0.058	0.054	0.061	0.061	0.042	0.056
⑬	通路	舗装	0.058	0.080	0.067	0.076	0.050	0.060
⑭	通路	舗装	0.064	0.059	0.052	0.082	0.054	0.059
⑮	通路	舗装	0.053	0.054	0.071	0.074	0.038	0.059
⑯	グラウンド	土	0.058	-	0.071	-	0.057	-
平均			0.060	0.062	0.059	0.071	0.049	0.055

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
