


除染後放射線量マップ【柏第三小学校】

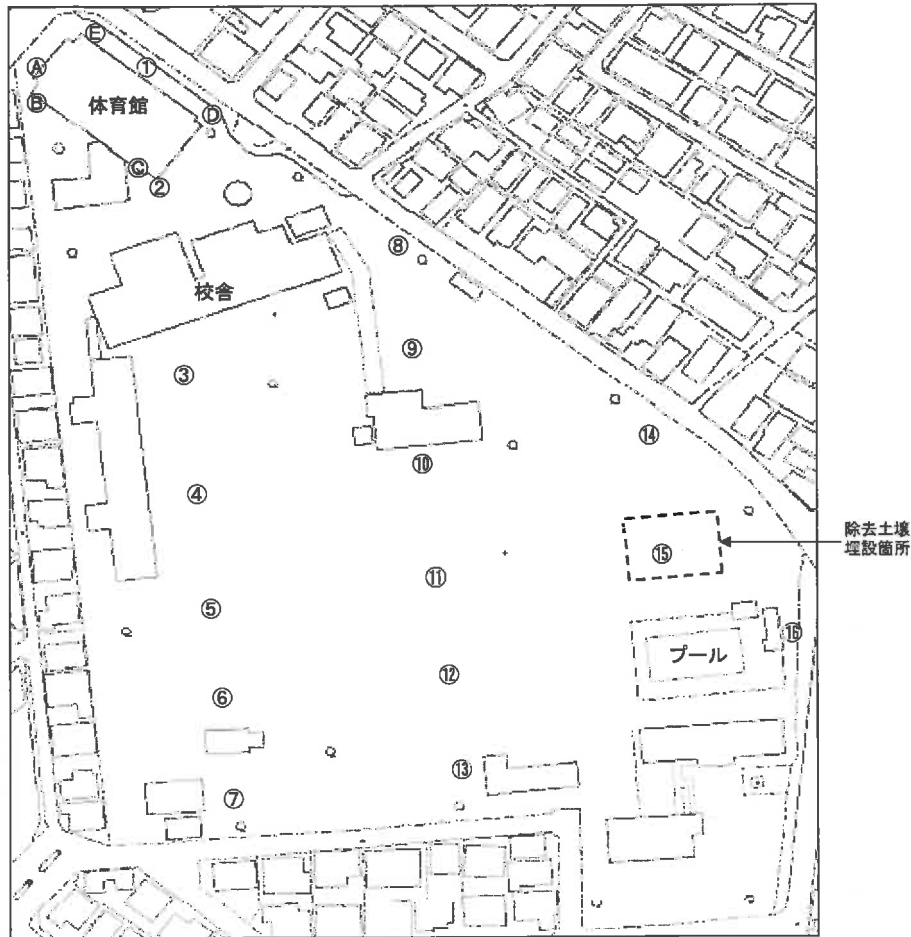

○除染前測定日:平成24年2月17日

○除染後測定日:平成24年3月28日, 4月20日, 6月11日(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	体育館周り	アスファルト	0.188	0.126	0.238	0.159	0.232	0.213
②	体育館周り	アスファルト	0.179	0.138	0.216	0.147	0.184	0.161
③	校舎前	土	0.193	0.063	0.178	0.060	0.166	0.053
④	グラウンド	土	0.225	0.055	0.215	0.070	0.212	0.048
⑤	グラウンド	土	0.252	0.049	0.264	0.067	0.305	0.051
⑥	グラウンド	土	0.308	0.126	0.329	0.161	0.351	0.209
⑦	グラウンド	土	0.304	0.126	0.393	0.114	0.424	0.118
⑧	グラウンド隅	アスファルト	0.155	0.096	0.129	0.107	0.238	0.152
⑨	グラウンド	土	0.232	0.073	0.264	0.084	0.372	0.064
⑩	校舎前	土	0.270	0.094	0.241	0.082	0.289	0.054
⑪	グラウンド	土	0.251	0.050	0.253	0.036	0.287	0.053
⑫	グラウンド	土	0.274	0.049	0.333	0.044	0.344	0.058
⑬	グラウンド	土	0.190	0.134	0.221	0.109	0.209	0.124
⑭	グラウンド隅	アスファルト	0.239	0.113	0.192	0.102	0.214	0.091
⑮	グラウンド	土	0.254	0.089	0.245	0.076	0.270	0.075
⑯	プール横	アスファルト	0.235	0.109	0.241	0.122	0.294	0.166
平均			0.234	0.093	0.247	0.096	0.274	0.106

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
(A)	体育館周り	コンクリート	0.178	0.167	0.197	0.161	0.273	0.252
(B)	体育館周り	側溝	0.322	0.184	0.404	0.227	0.734	0.250
(C)	体育館周り	側溝	0.288	0.179	0.334	0.192	0.459	0.243
(D)	体育館周り	側溝	0.237	0.175	0.297	0.196	0.400	0.237
(E)	体育館周り	側溝	0.340	0.175	0.431	0.207	0.777	0.293

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
