


除染後放射線量マップ【柏第五小学校】

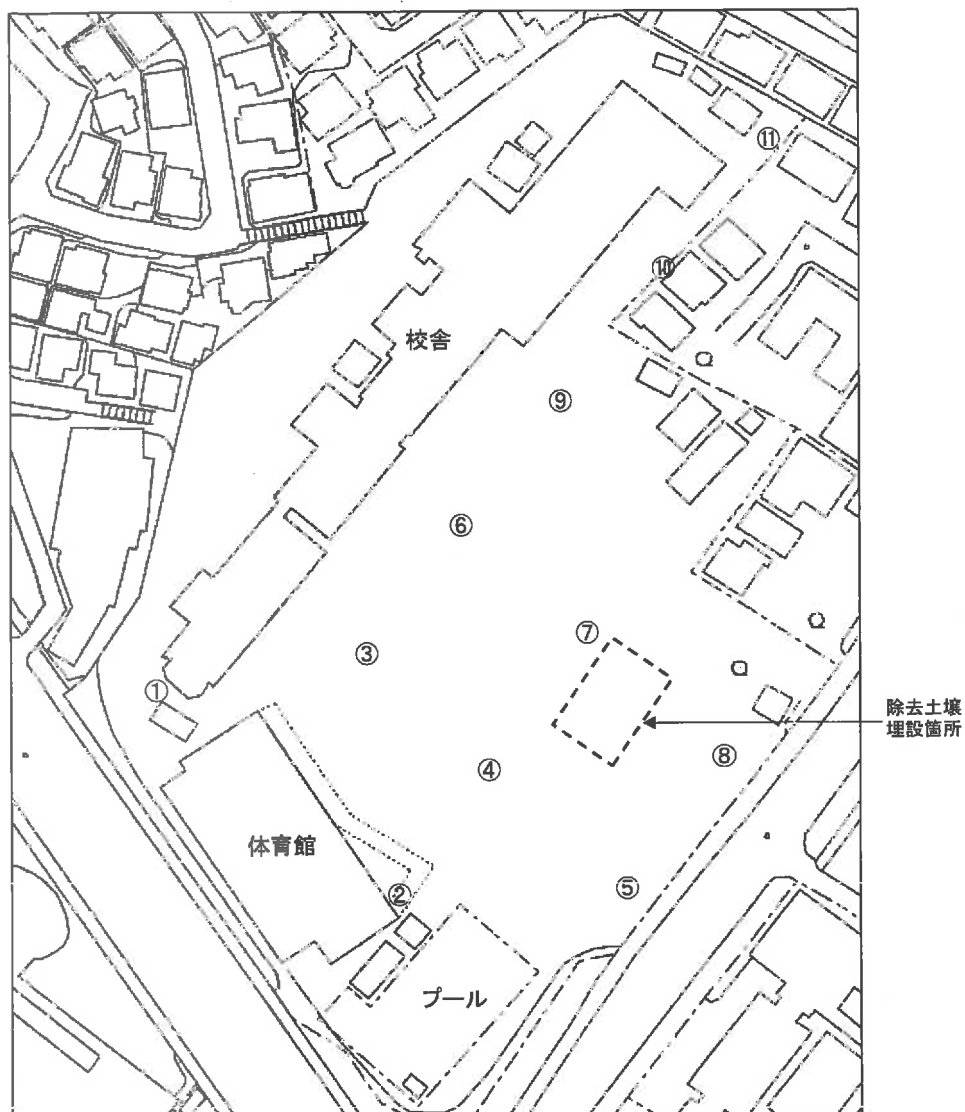

○除染前測定日:平成24年7月4日

○除染後測定日:平成24年8月29日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎横	土	0.151	0.118	0.119	0.138	0.192	0.131
②	体育館前	土	0.198	0.101	0.205	0.130	0.243	0.154
③	グラウンド	土	0.163	0.038	0.167	0.068	0.205	0.094
④	グラウンド	土	0.155	0.053	0.159	0.050	0.179	0.036
⑤	グラウンド	土	0.145	0.084	0.139	0.077	0.127	0.082
⑥	グラウンド	土	0.119	0.048	0.123	0.058	0.104	0.073
⑦	グラウンド	土	0.095	0.050	0.107	0.074	0.091	0.071
⑧	グラウンド	土	0.146	0.072	0.160	0.092	0.144	0.070
⑨	グラウンド	土	0.090	0.042	0.101	0.058	0.100	0.049
⑩	グラウンド	土	0.189	0.089	0.245	0.097	0.457	0.071
⑪	グラウンド	舗装	0.167	0.146	0.161	0.171	0.148	0.209
平均			0.147	0.076	0.153	0.092	0.181	0.095

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
