


除染後放射線量マップ【柏第六小学校】

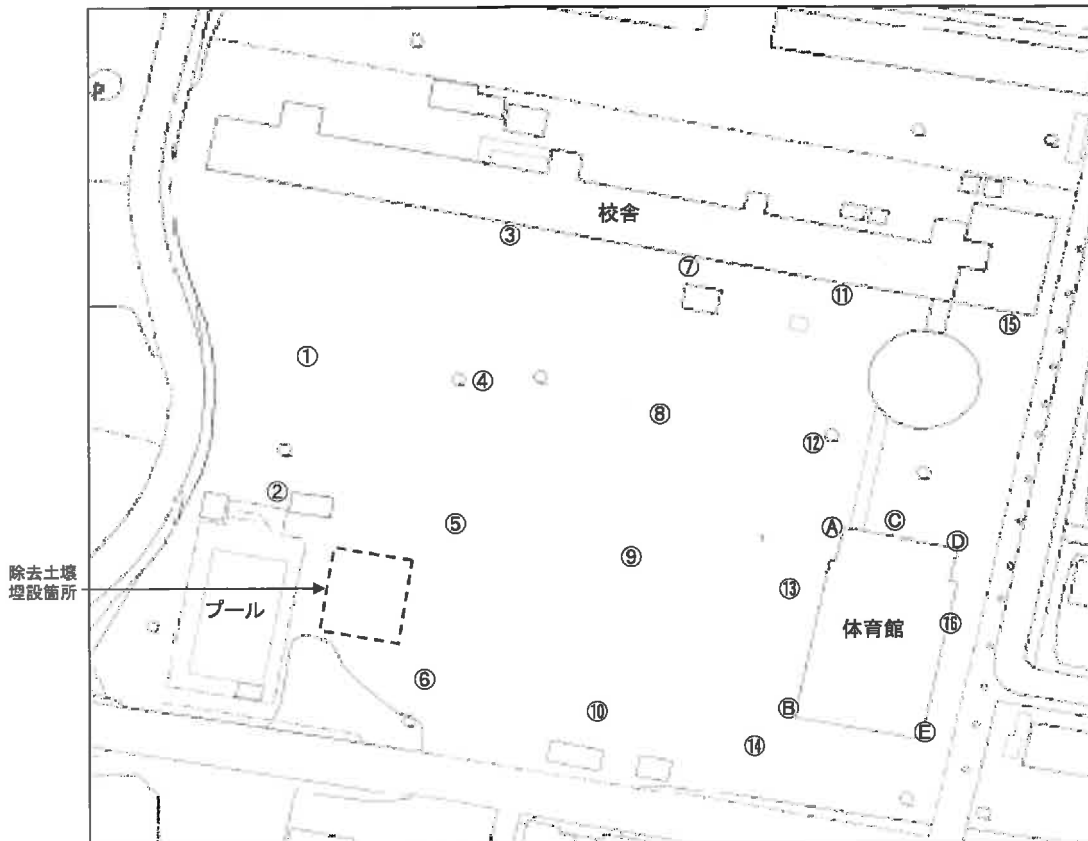

○除染前測定日:平成24年3月12日

○除染後測定日:平成24年4月26日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎前	土	0.186	0.123	0.231	0.116	0.388	0.098
②	グラウンド	土	0.232	0.076	0.258	0.066	0.347	0.065
③	校舎前	土	0.181	0.109	0.200	0.119	0.285	0.157
④	グラウンド	土	0.262	0.086	0.269	0.081	0.321	0.085
⑤	グラウンド	土	0.200	0.047	0.201	0.047	0.219	0.051
⑥	グラウンド	土	0.410	0.116	0.425	0.106	0.559	0.111
⑦	校舎前	土	0.207	0.134	0.226	0.121	0.282	0.133
⑧	グラウンド	土	0.272	0.093	0.209	0.097	0.282	0.083
⑨	グラウンド	土	0.158	0.063	0.179	0.047	0.211	0.060
⑩	グラウンド	土	0.261	0.083	0.306	0.085	0.439	0.059
⑪	校舎前	アスファルト	0.165	0.105	0.199	0.121	0.162	0.118
⑫	グラウンド	土	0.230	0.180	0.244	0.156	0.232	0.159
⑬	グラウンド	土	0.184	0.076	0.223	0.073	0.222	0.058
⑭	グラウンド	土	0.238	0.095	0.234	0.083	0.227	0.084
⑮	校舎前	アスファルト	0.199	0.166	0.231	0.176	0.221	0.187
⑯	体育館裏	土	0.242	0.164	0.235	0.152	0.335	0.163
平均			0.227	0.107	0.242	0.103	0.296	0.104

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
(A)	体育館前	側溝	0.402	0.168	0.632	0.257	1.197	0.380
(B)	体育館前	側溝	0.280	0.149	0.446	0.193	0.692	0.365
(C)	体育館横	側溝	0.198	0.174	0.279	0.213	0.434	0.287
(D)	体育館裏	側溝	0.342	0.227	0.485	0.273	0.820	0.410
(E)	体育館裏	側溝	0.320	0.172	0.361	0.194	0.683	0.260

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
