


除染後放射線量マップ【田中小学校】

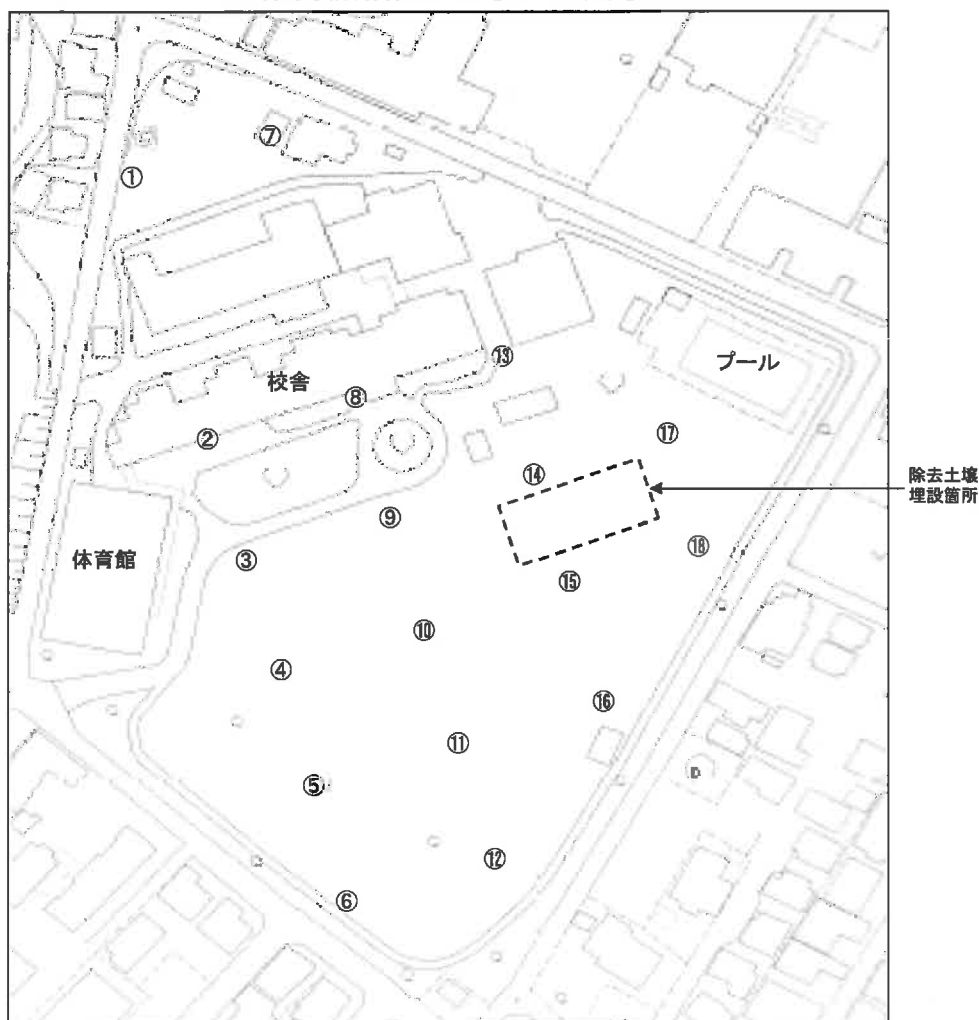

○除染前測定日:平成24年3月2日

○除染後測定日:平成24年4月9日, 6月5日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	土	0.236	0.096	0.269	0.104	0.359	0.092
②	校舎前	土	0.188	0.138	0.234	0.136	0.295	0.091
③	グラウンド	土	0.204	0.062	0.199	0.067	0.174	0.050
④	グラウンド	土	0.235	0.092	0.234	0.091	0.108	0.069
⑤	グラウンド	土	0.247	0.113	0.219	0.109	0.181	0.104
⑥	グラウンド	土	0.262	0.078	0.331	0.084	0.335	0.063
⑦	校舎裏	土	0.257	0.086	0.316	0.095	0.503	0.103
⑧	校舎前	土	0.182	0.129	0.184	0.122	0.285	0.109
⑨	グラウンド	土	0.213	0.075	0.241	0.066	0.312	0.058
⑩	グラウンド	土	0.222	0.064	0.197	0.064	0.190	0.050
⑪	グラウンド	土	0.268	0.102	0.281	0.094	0.187	0.084
⑫	グラウンド	土	0.270	0.145	0.254	0.167	0.242	0.137
⑬	校舎前	アスファルト	0.200	0.098	0.174	0.106	0.205	0.096
⑭	グラウンド	土	0.221	0.095	0.214	0.089	0.224	0.070
⑮	グラウンド	土	0.227	0.061	0.184	0.057	0.192	0.072
⑯	グラウンド	土	0.216	0.125	0.212	0.154	0.287	0.167
⑰	グラウンド	土	0.260	0.089	0.272	0.096	0.353	0.069
⑱	グラウンド	土	0.228	0.101	0.211	0.103	0.234	0.092
平均			0.230	0.097	0.235	0.100	0.259	0.088

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
