


除染後放射線量マップ【田中北小学校】

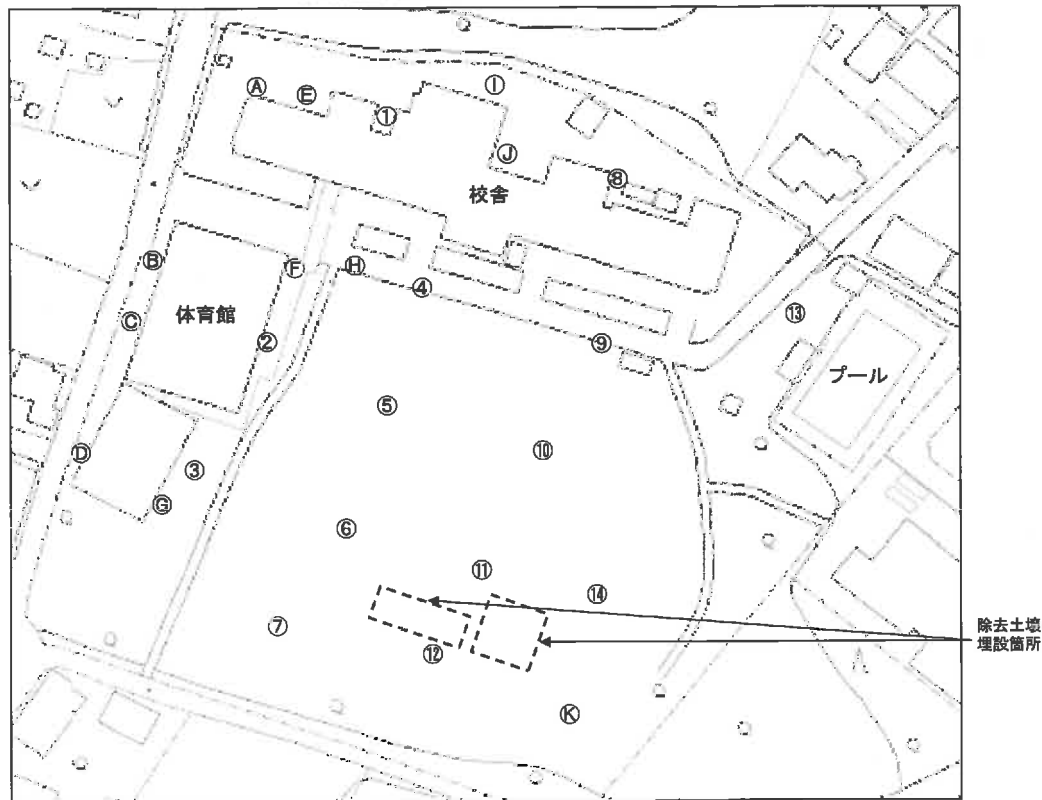

※田中北小学校の除染工事は、実証作業として行ったため、除染前の測定は5cmのみ測定しています。

○除染前測定日：平成23年10月31日

○除染後測定日：平成24年4月25日，6月11日

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	コンクリート	-	0.160	-	0.175	0.450	0.228
②	体育館前	アスファルト	-	0.115	-	0.120	0.297	0.111
③	体育館前	アスファルト	-	0.154	-	0.153	0.318	0.091
④	校舎前	アスファルト	-	0.115	-	0.113	0.249	0.124
⑤	グラウンド	土	-	0.056	-	0.040	0.373	0.061
⑥	グラウンド	土	-	0.068	-	0.057	0.295	0.061
⑦	グラウンド	土	-	0.066	-	0.083	0.361	0.078
⑧	校舎裏	土	-	0.143	-	0.128	0.409	0.118
⑨	校舎前	アスファルト	-	0.128	-	0.151	0.204	0.122
⑩	グラウンド	土	-	0.049	-	0.064	0.494	0.056
⑪	グラウンド	土	-	0.062	-	0.056	0.329	0.066
⑫	グラウンド	土	-	0.054	-	0.066	0.476	0.050
⑬	プール横	土	-	0.099	-	0.124	0.334	0.127
⑭	グラウンド	土	-	0.070	-	0.063	0.268	0.063
平均			-	0.096	-	0.100	0.347	0.097

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
(A)	校舎裏	側溝	-	0.131	-	0.145	-	0.233
(B)	体育館裏	雨樋下	-	0.184	-	0.198	-	0.295
(C)	体育館裏	側溝	-	0.168	-	0.195	-	0.276
(D)	体育館裏	雨樋下	-	0.181	-	0.215	-	0.551
(E)	校舎裏	側溝	-	0.159	-	0.206	-	0.377
(F)	体育館前	側溝	-	0.149	-	0.160	-	0.209
(G)	体育館前	雨樋下	-	0.318	-	0.406	-	0.742
(H)	校舎前	側溝	-	0.163	-	0.185	-	0.226
(I)	校舎裏	アスファルト	-	0.150	-	0.177	-	0.210
(J)	校舎裏	雨樋下	-	0.171	-	0.223	-	0.319
(K)	倉庫前	雨樋下	-	0.149	-	0.183	-	0.401

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
