


除染後放射線量マップ【土南部小学校】

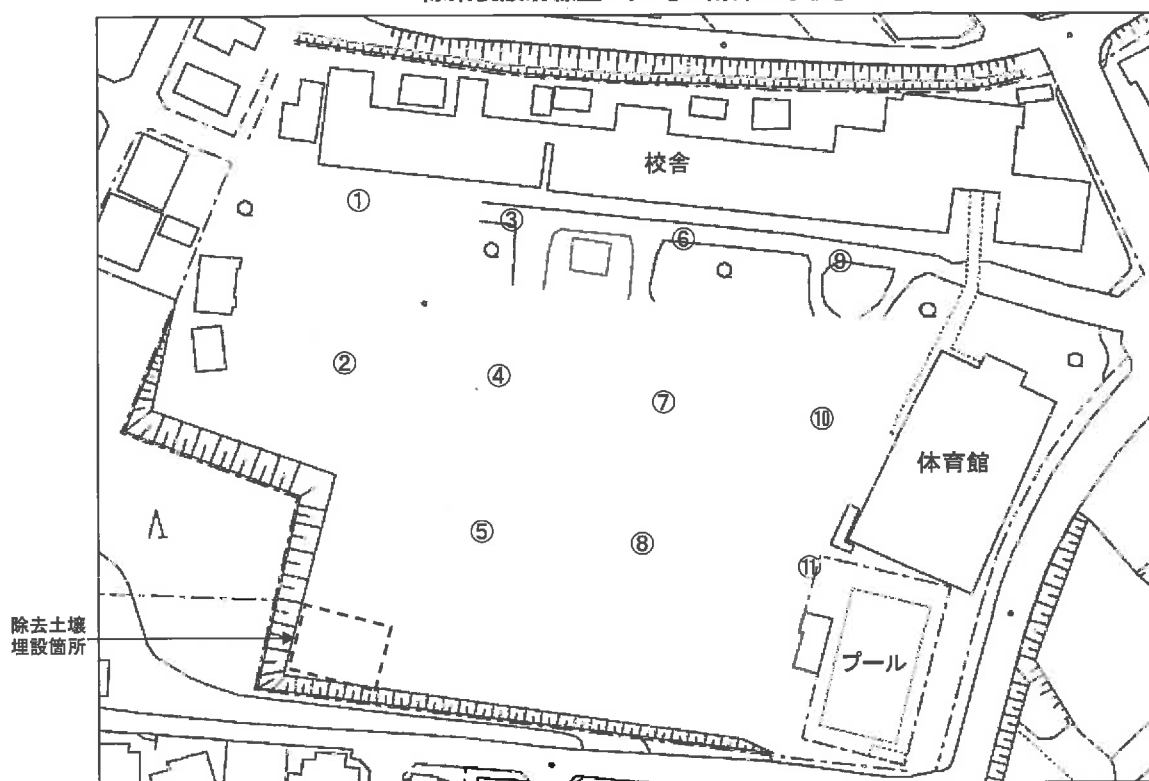

○除染前測定日:平成24年7月3日

○除染後測定日:平成24年8月30日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	舗装	0.083	0.062	0.073	0.058	0.077	0.058
②	グラウンド	土	0.150	0.051	0.130	0.059	0.158	0.054
③	グラウンド	舗装	0.101	0.080	0.103	0.056	0.081	0.075
④	グラウンド	土	0.149	0.047	0.141	0.044	0.142	0.052
⑤	グラウンド	土	0.138	0.061	0.151	0.049	0.143	0.054
⑥	グラウンド	舗装	0.103	0.083	0.120	0.094	0.146	0.100
⑦	グラウンド	土	0.126	0.041	0.161	0.050	0.157	0.053
⑧	グラウンド	土	0.116	0.037	0.123	0.056	0.133	0.057
⑨	グラウンド	舗装	0.097	0.081	0.125	0.082	0.128	0.096
⑩	グラウンド	土	0.115	0.041	0.120	0.050	0.139	0.052
⑪	グラウンド	土	0.130	0.066	0.131	0.062	0.111	0.088
平均			0.119	0.059	0.125	0.060	0.129	0.067

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
