


除染後放射線量マップ【中原小学校】

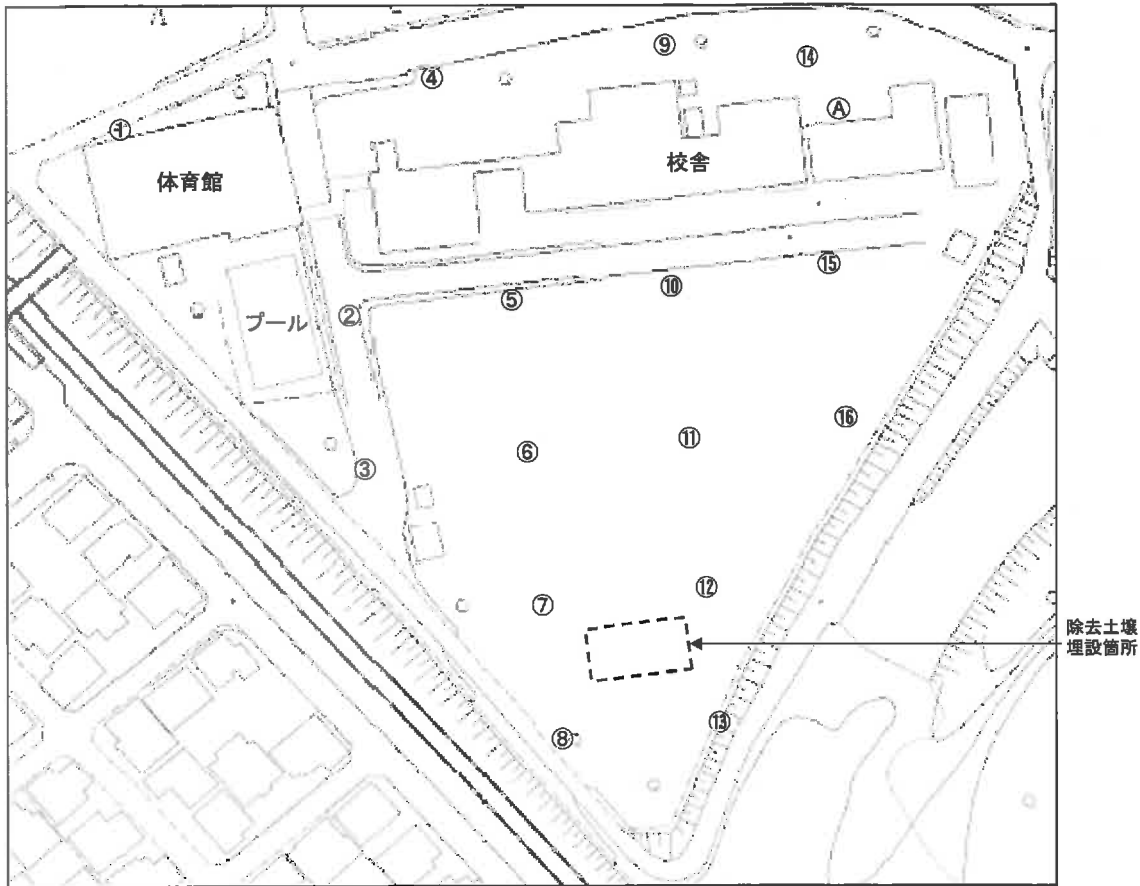

○除染前測定日：平成24年3月23日

○除染後測定日：平成24年5月9日

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	プール前	土	0.245	0.127	0.258	0.111	0.290	0.091
②	グラウンド	土	0.212	0.107	0.224	0.100	0.255	0.078
③	グラウンド	土	0.162	0.066	0.184	0.068	0.217	0.089
④	校舎裏	土	0.609	0.090	0.895	0.087	1.320	0.089
⑤	校舎前	土	0.178	0.067	0.201	0.077	0.199	0.077
⑥	グラウンド	土	0.164	0.049	0.174	0.063	0.190	0.050
⑦	グラウンド	土	0.186	0.057	0.200	0.054	0.191	0.086
⑧	校舎裏	土	0.185	0.073	0.201	0.082	0.214	0.067
⑨	校舎前	土	0.221	0.097	0.243	0.098	0.210	0.078
⑩	グラウンド	土	0.178	0.082	0.186	0.070	0.199	0.080
⑪	グラウンド	土	0.149	0.039	0.160	0.049	0.159	0.045
⑫	校舎裏	土	0.183	0.062	0.210	0.048	0.223	0.062
⑬	校舎前	土	0.221	0.152	0.227	0.145	0.210	0.086
⑭	グラウンド	土	0.184	0.104	0.200	0.100	0.163	0.107
⑮	校舎裏	土	0.192	0.081	0.231	0.073	0.305	0.068
⑯	校舎裏	土	0.192	0.055	0.196	0.049	0.204	0.069
平均			0.216	0.082	0.249	0.080	0.284	0.076

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	雨樋下	0.255	0.171	0.416	0.231	0.716	0.352

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
